

平成26年度 第1回 赤浜地域復興協議会

資料2 復興まちづくり事業の進捗状況

1. 復興事業の進捗状況
2. デザイン会議の概要
3. 地域主体の活動の必要性
4. 既出の意見に対する回答

1. 復興事業の進捗状況

○土地区画整理事業

事業面積：77,000㎡
進捗状況：換地設計・用地買収
公共施設の土地買収：約7割
工事期間：H26～28年度

○防集団地② 岩手県交通裏

事業規模：防集団地8戸
災害公営4戸
進捗状況：土地の買収調整
土地の買収：1割
建築開始予定：H28年度

○防集団地① 北側斜面

事業規模：防集団地12戸
災害公営6戸
進捗状況：土地の買収調整
土地の買収：6割
建築開始予定：H27年度


○公民館

進捗状況：設計・用地買収
工事期間
仮公民館工事：H27.1～H27.3
公民館解体工事：H27.4～
公民館避難ホール工事
：H27.1～H28.3
開業予定：H28年4月

○東大

進捗状況：
工事期間：H27～H30年度
開業予定：H30年

注：現時点での案であり、
今後の検討で変わる
可能性があります。

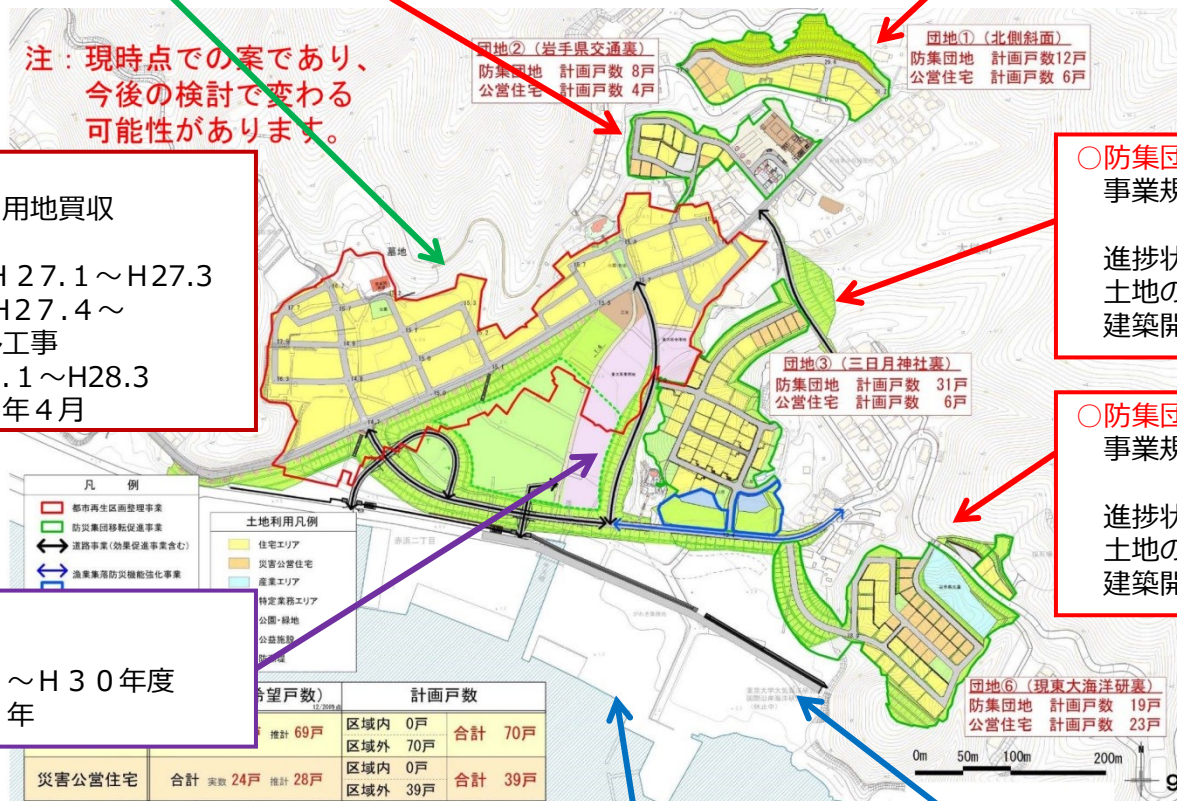


○漁港 (県)

事業内容：護岸の復旧ほか
事業期間：H27～H28年度

○防潮堤 (県)



高さ：6.4m 長さ：約650m
事業期間：H27～H28年度

今後のスケジュール ①区画整理

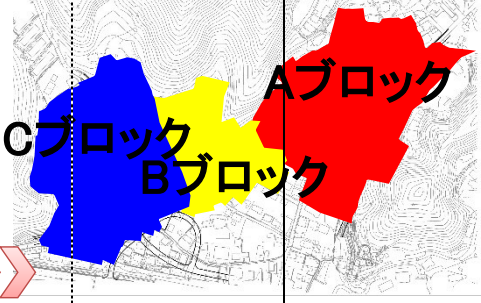項 目	平成25年度 下半期	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度 上半期
		上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	
都市計画 手続き等	●都市計画、事業計画変更	●仮換地指定	●事業計画変更					
関連工事				公民館・避難ホール建設工事		●公民館使用開始予定		
赤 浜 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	Aブロック	換地設計	詳細設計 地盤改良工事 県道切廻し工事	造成・インフラ工事		住宅着工 >>>		
	Bブロック	換地設計	詳細設計	造成・インフラ工事		住宅着工 >>>		
	Cブロック	換地設計	埋蔵文化財調査	造成・インフラ工事		住宅着工 >>>		

※インフラ工事とは、道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。

今後のスケジュール ②防集団地

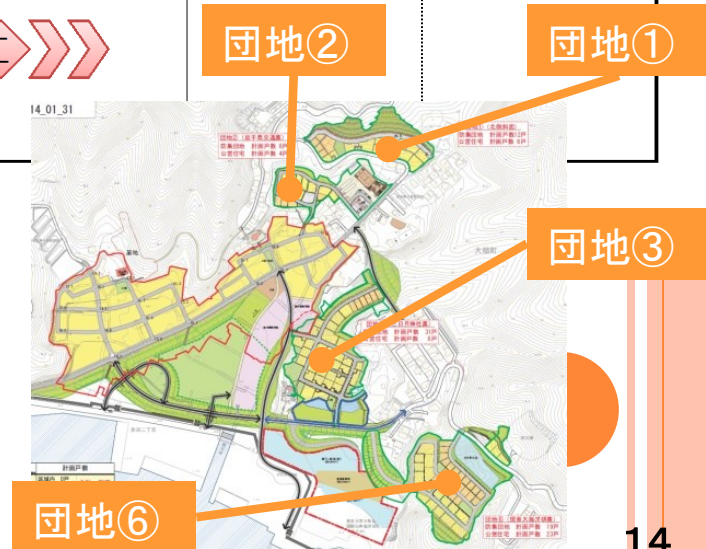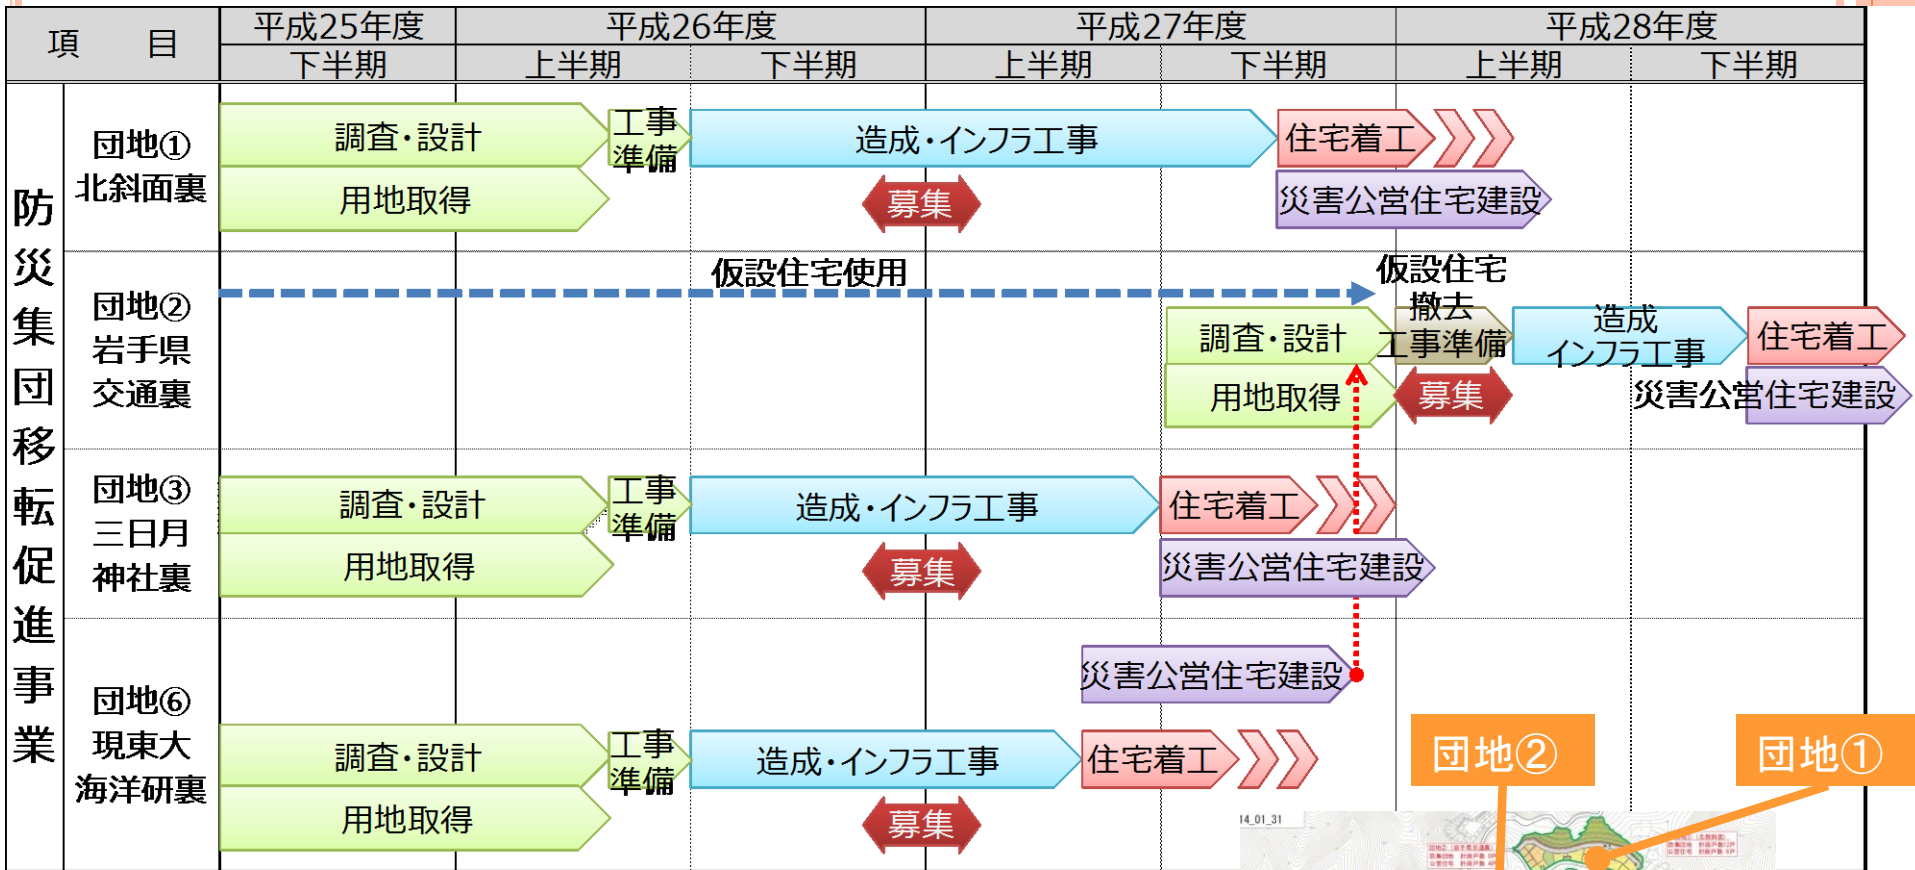

2. デザイン会議の概要

- 平成24～25年度にかけて、役員の方を中心メンバーとしたデザイン会議、一般住民を対象としたワークショップを開催し、ハードのデザインについて協議を進めてきました。
- その成果が、赤浜地域のデザインノートとしてまとまりました。
- 後半のワークショップのとき詳しく説明します。

3. 既出の意見に対する回答

《バス停》

Q1. バス停やスクールバスの乗降場は旧赤浜小南側付近と新しい公民館前で良い。

Q2. 役場前のバス停のように、屋根と壁がついている待合所があった方が良い。

《街灯》

Q3. 今は夜が暗いので街灯があった方が良い。特に県道。

3. 既出の意見に対する回答

《赤浜小の門柱(記憶の継承)》

Q4. 小学校の門柱を現在の小学校の門あたりに残せないか。
主要な道路の近所の人の目につきやすいところが良い。

《地形変更への配慮》

Q5. 山際の緑は防風林の機能があるので保全してほしい。
特に三日月山を削れば、冬場の西風が強くなるため防風林が必要。

4. 地域主体の活動の必要性

- ・復興事業は重要ですが、復興後には、公民館事業などの地域が主体となった活動も重要です。
- ・復興事業と並行して、地域が取り組むべき活動についても検討を進めます。

例えば、以下のことについては、地域が意見を出して進めることが有効

- ①地域イベントや活動 ②高齢者の見守り ③子育て環境づくり
- ④みんなが集まる場・コミュニティスペース ⑤移動手段の確保
- ⑥買い物などの生活サービス ⑦働く場づくり など
