


1. 復興事業の進捗状況

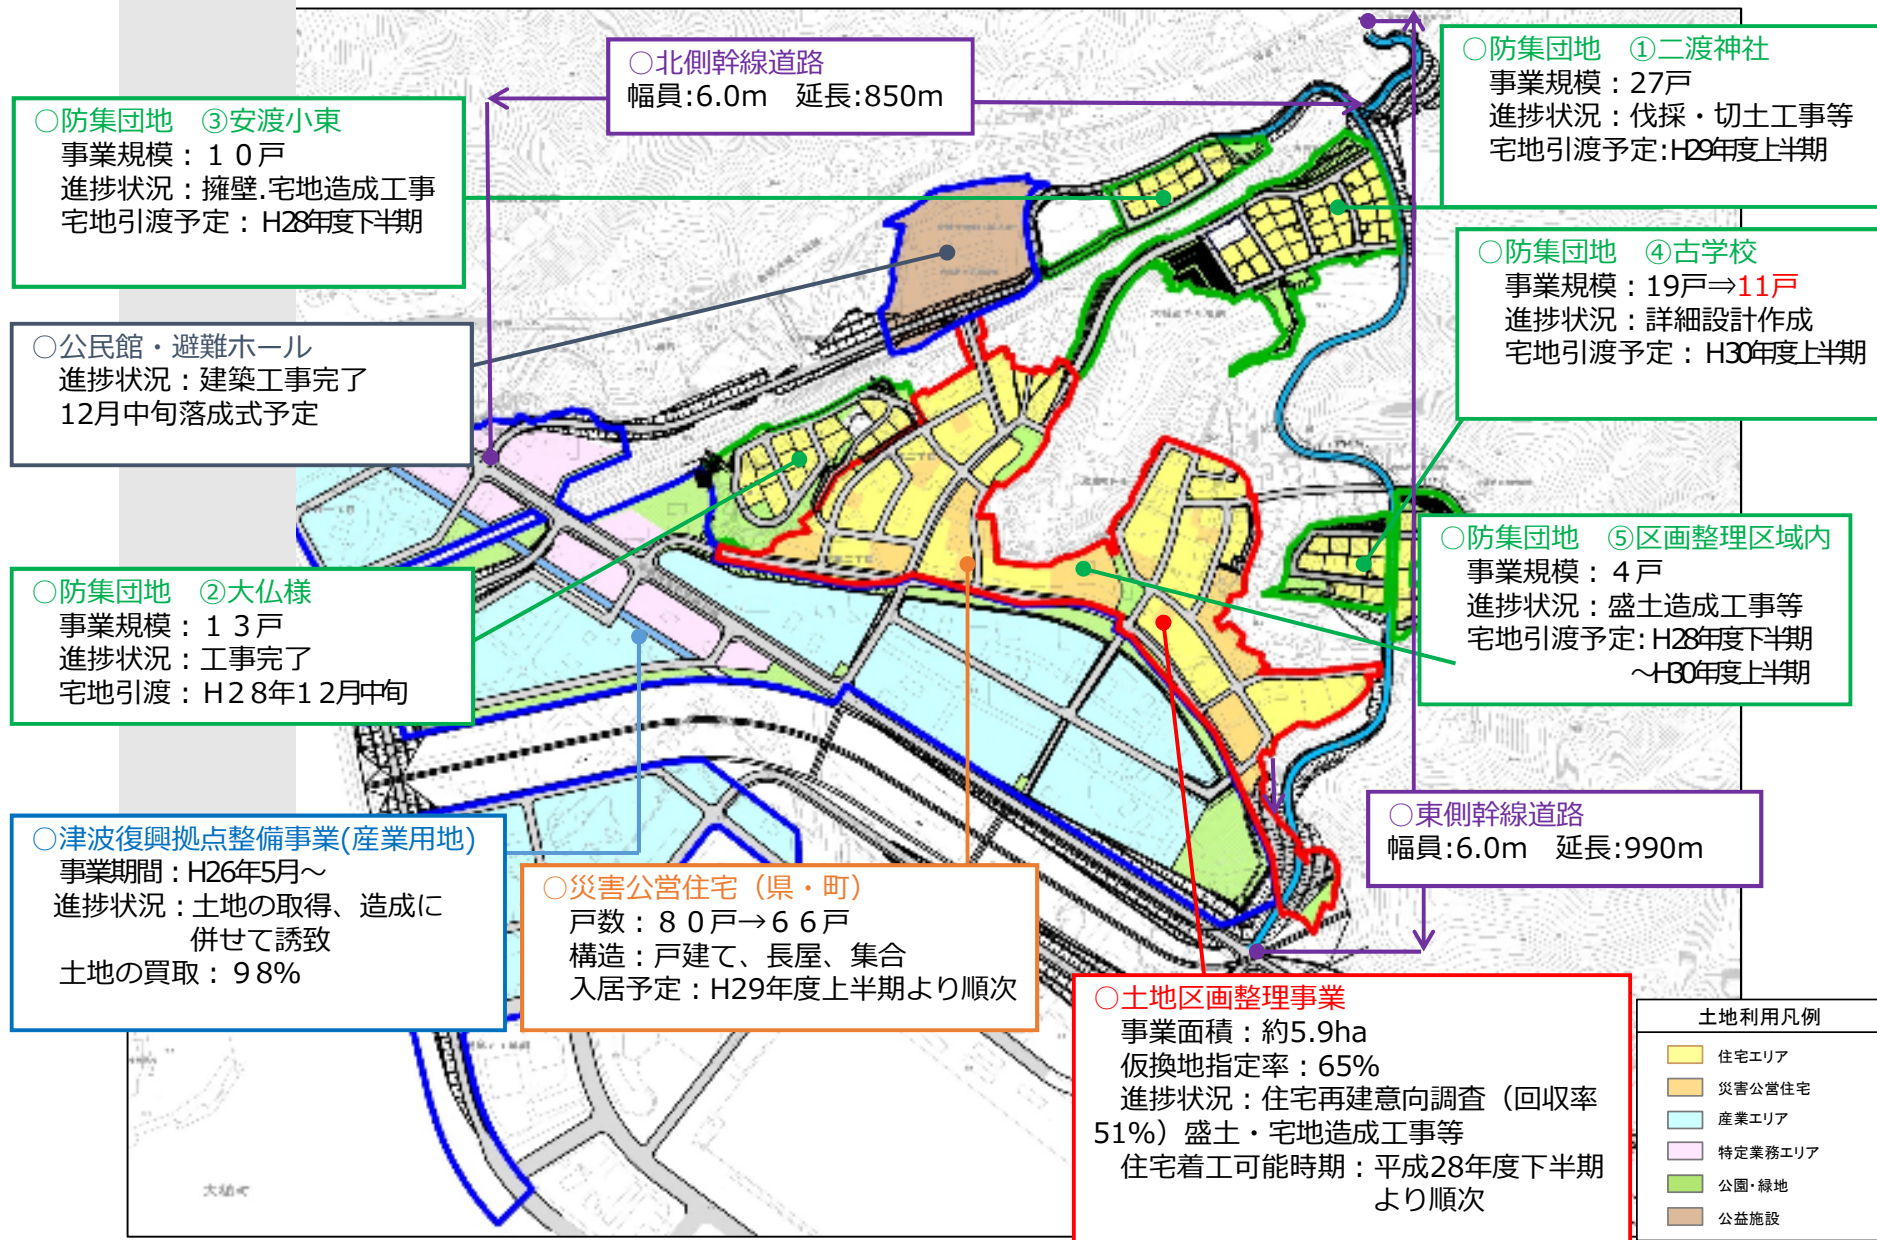

今後のスケジュール【防集移転先団地】


スケジュール

安渡地区防災集団移転促進事業

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期		
防災集団移転促進事業	二渡神社団地	調査・設計						造成・インフラ工事※		住宅着工			
		用地取得 (造成部分完了)			伐採								
	大仏様団地	調査・設計						造成・インフラ工事※		住宅着工			
		用地取得 (完了)			伐採								
	安渡小東団地	調査・設計						造成・インフラ工事※		住宅着工			
用地取得 (完了)			伐採										
古学校団地	調査・設計						造成・インフラ工事※		住宅着工				
	用地取得 (完了)					伐採							
土地区画整理地内							造成・インフラ工事※		住宅着工				

※インフラ工事とは、道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。

今後のスケジュール【土地区画整理事業】

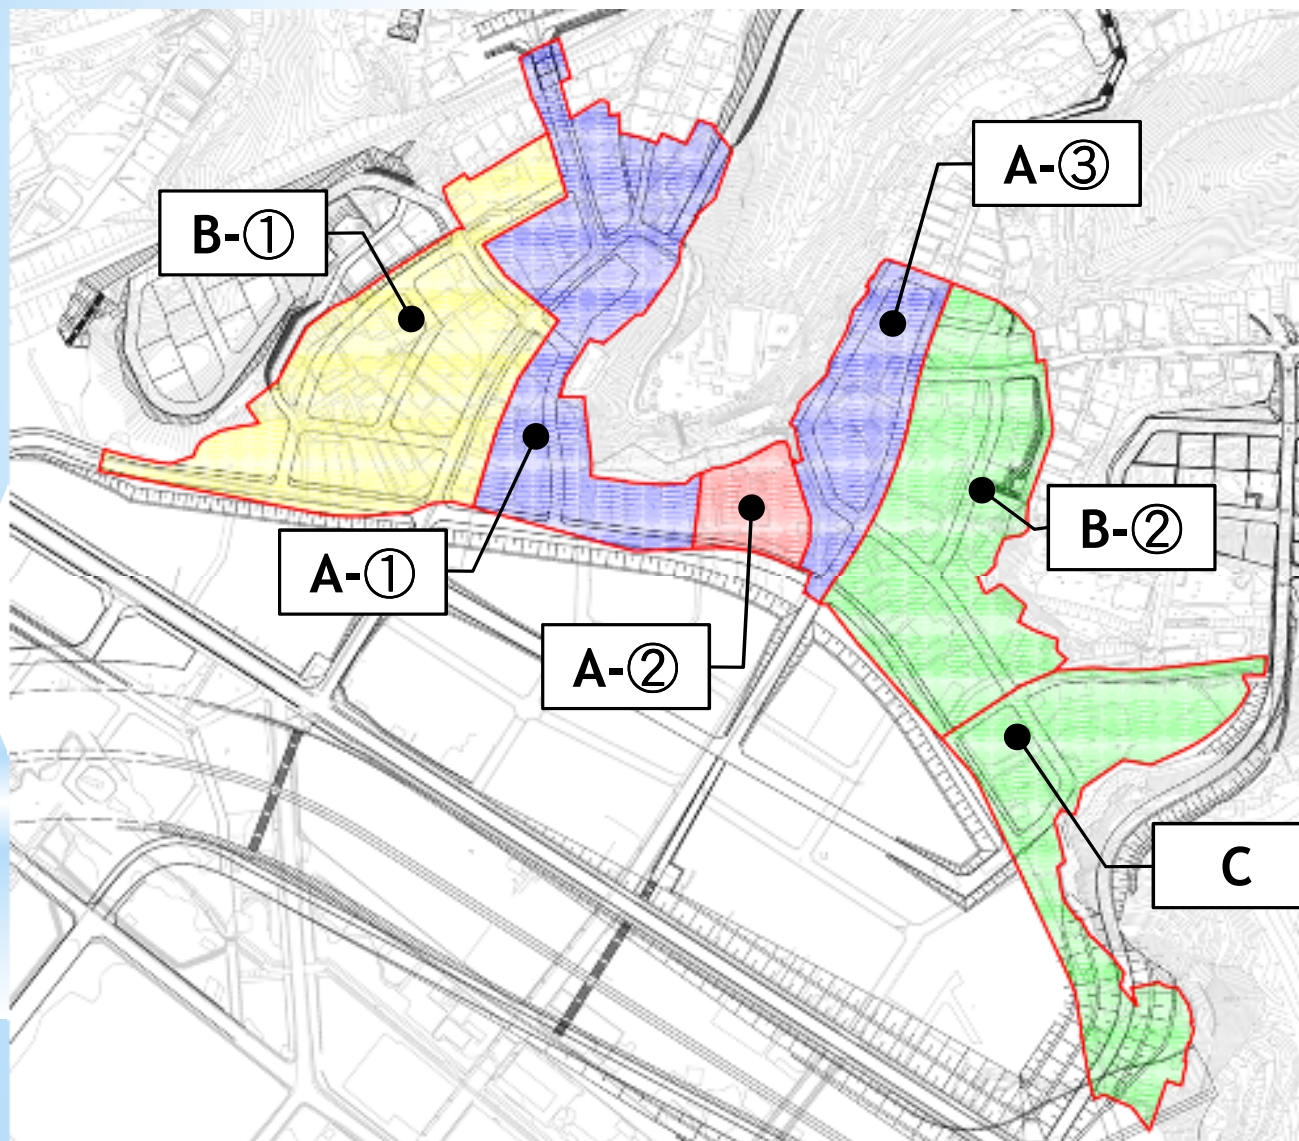

B-①	
変更前	平成28年度上半期
変更後	平成28年度下半期

A-①、③	
変更前	平成28年度下半期
変更後	平成29年度上半期

A-②	
災害公営住宅	

B-②、C	
変更前	平成29年度上半期
変更後	平成30年度上半期

今後のスケジュール【災害公営住宅（配置図・計画戸数）】

ブロック別戸数

B-①	
戸建	7戸
長屋	6戸
入居開始予定 平成29年度上半期	

A-③	
長屋	2戸
入居開始予定 平成29年度下半期	

B-②	
戸建	1戸
長屋	7戸
入居開始予定 平成30年度下半期	

A-①	
長屋	10戸
入居開始予定 平成29年下半期	

A-②	
戸建	10戸
入居開始予定 平成30年度上半期	


C	
集合	23戸
入居開始予定 平成30年度中期	

※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

今後のスケジュール【土地区画整理事業、災害公営住宅】

スケジュール詳細

安海地区区画整理事業

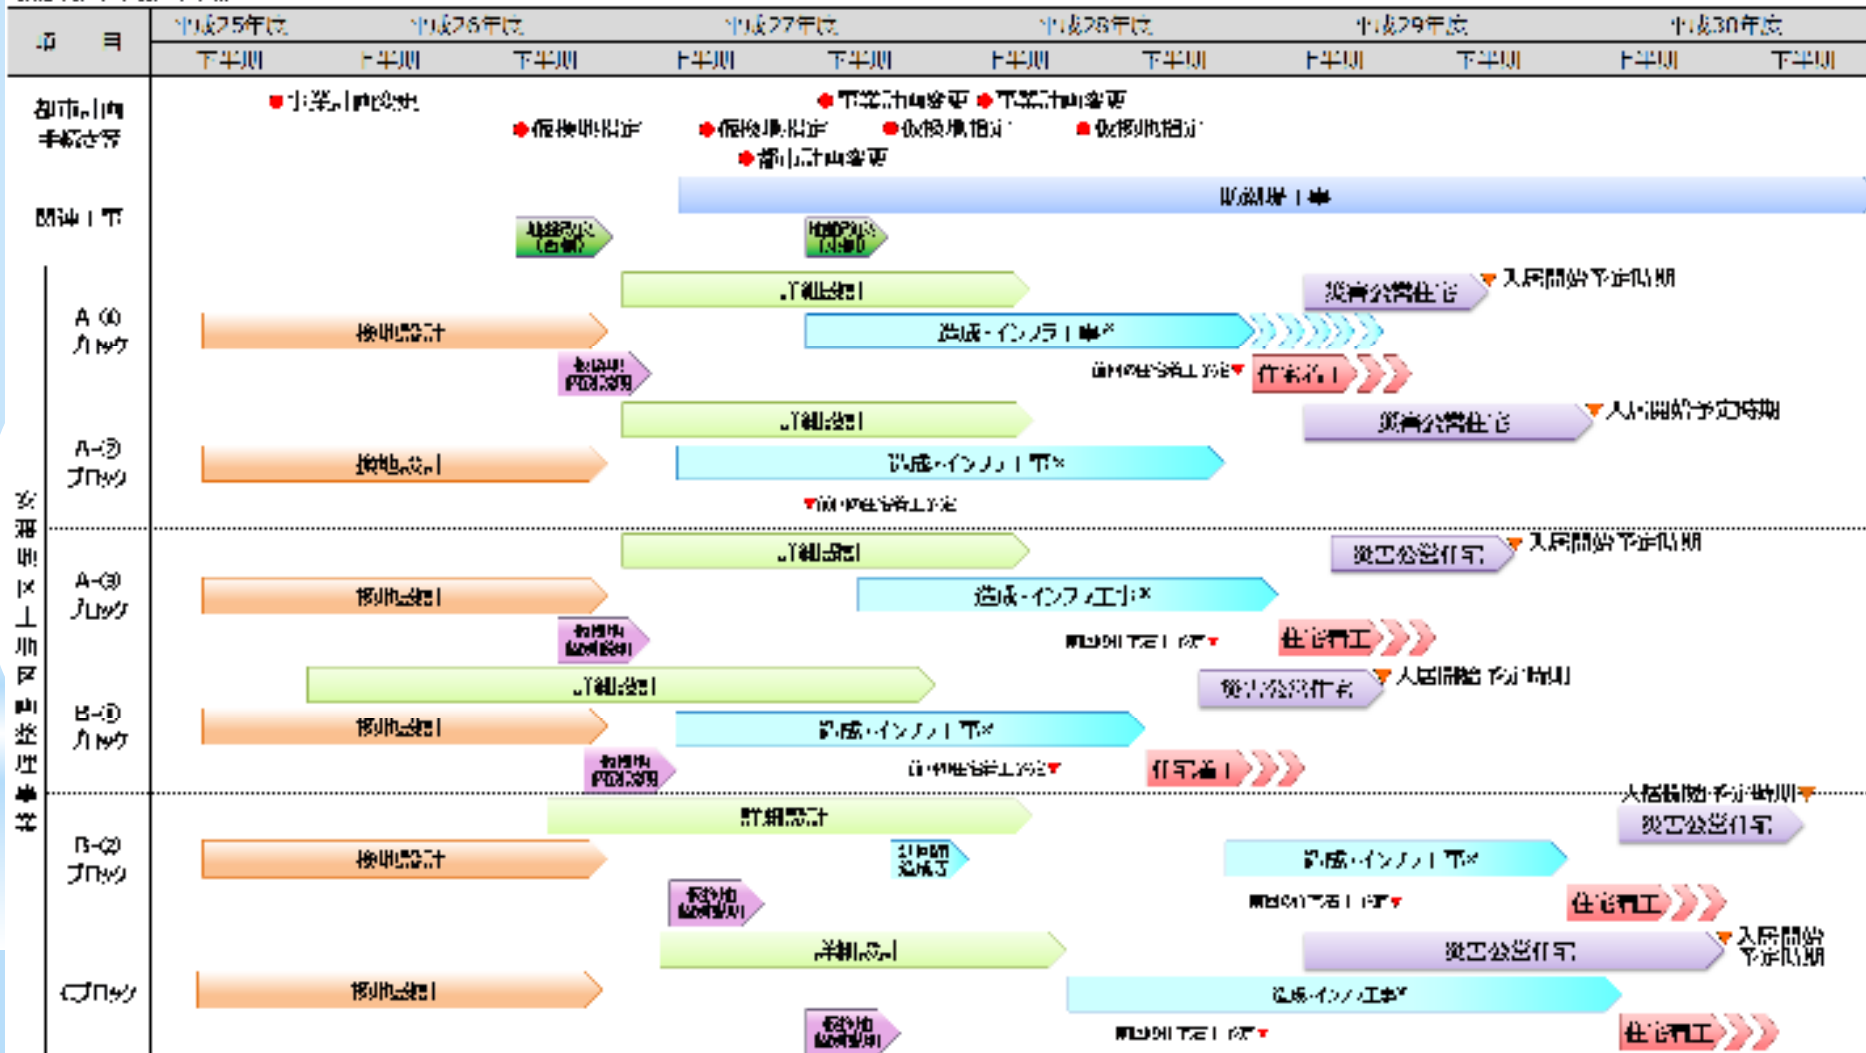

*インフラ工事は、道路、上下水道、電気、通信等の工事の予定。

道路事業の今後のスケジュール について

大仏様団地引渡し時(平成28年度下半期)

安渡第二仮設住宅
H29.3 一部集約、その他は当面残置予定

JR ボックスカルパート工事施工中

安渡仮設住宅
当面残置(H31年度以降撤去予定)

施工ヤード

県道吉里吉里釜石線

国道45号

大仏第11仮設住宅
H30.9以降撤去予定


【凡例】

- : 通行可能な道路
- : 通行不可能な道路(工事中)

土地利用凡例

- 住宅エリア
- 災害公営住宅
- 産業エリア
- 特定業務エリア
- 公園・緑地
- 公益施設

安渡小東団地引渡し時(平成28年度下半期)

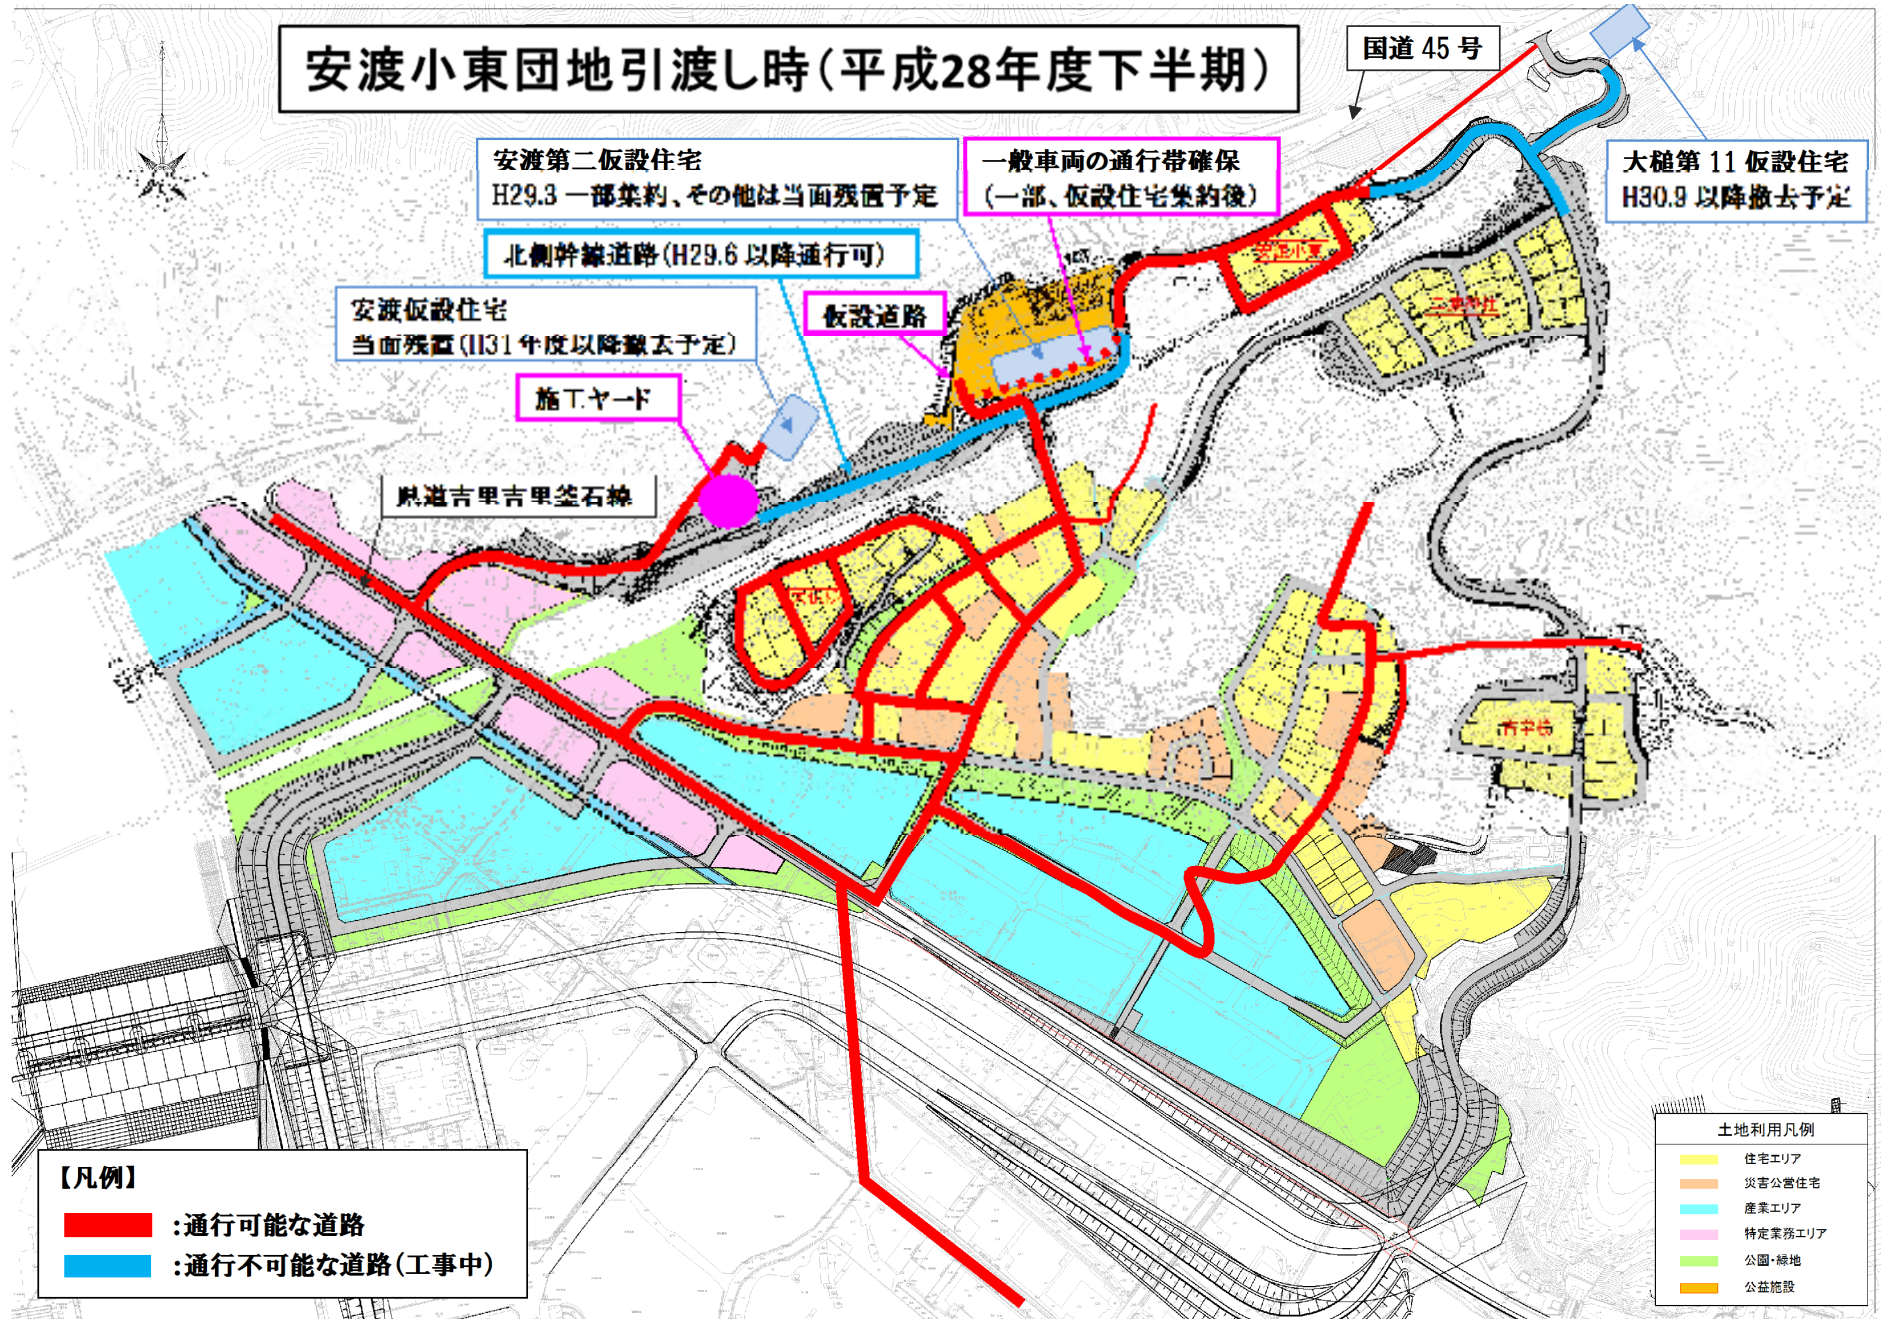


【凡例】
■ :通行可能な道路
■ :通行不可能な道路(工事中)

土地利用凡例

- 住宅エリア
- 災害公営住宅
- 産業エリア
- 特定業務エリア
- 公園・緑地
- 公益施設

二渡神社団地引渡し時(平成29年度上半期)

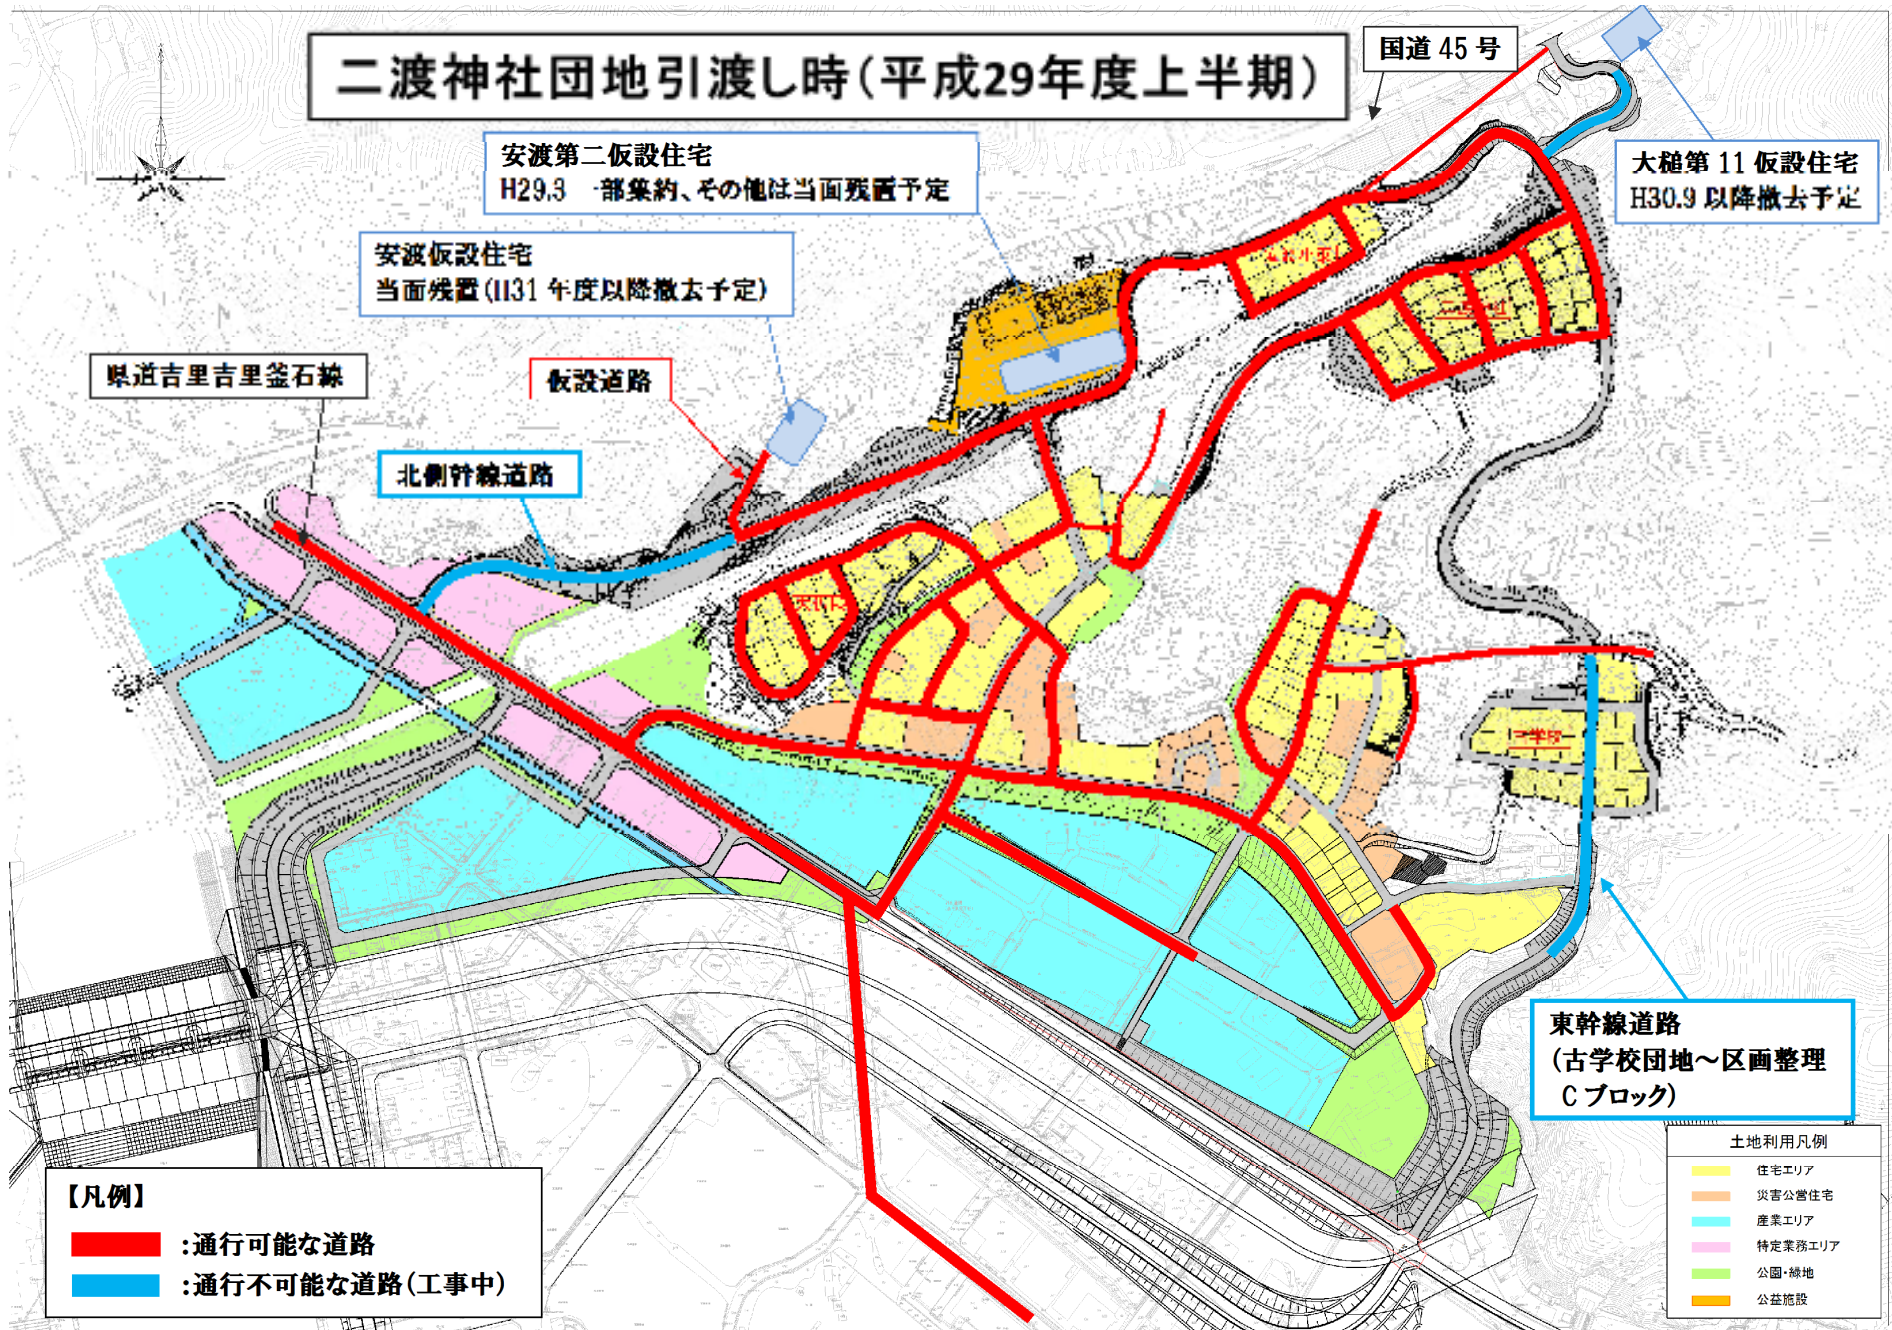

県道吉里吉里釜石線

安渡第二仮設住宅
H29.3 一部集約、その他は当面残置予定

安渡仮設住宅
当面残置 (H31年度以降撤去予定)

大槌第11仮設住宅
H30.9以降撤去予定

仮設道路

北側幹線道路

国道45号

東幹線道路
(古学校団地～区画整理
Cブロック)

【凡例】
■ : 通行可能な道路
■ : 通行不可能な道路(工事中)

土地利用凡例

■	住宅エリア
■	災害公営住宅
■	産業エリア
■	特定業務エリア
■	公園・緑地
■	公益施設

古学校団地引渡し時(平成30年度上半期)

安渡第二仮設住宅
H29.3 一部集約、その他は当面残置予定

安渡仮設住宅
当面残置(H31年度以降撤去予定)

仮設住宅撤去後、機能復旧
道路施工予定(H31年度以降)

県道吉里吉里釜石線

国道 45 号

大鶴第 11 仮設住宅
H30.9 以降撤去予定

国道 45 号アクセス
道路国道接続部
(仮設住宅撤去後
施工予定)

東側幹線道路
(施工時期未定)

東幹線道路
(防潮堤及び県道接続部は
H30.1 以降工事着手予定)

【凡例】

- : 通行可能な道路
- : 通行不可能な道路(工事中)

土地利用凡例

- 住宅エリア
- 災害公営住宅
- 産業エリア
- 特定業務エリア
- 公園・緑地
- 公益施設
