

大槌町復興レポート

平成30年4月1日現在

(平成30年7月発行)

岩手県大槌町



目次

スライド番号

スライド番号

I 東日本大震災津波の概要

1 地震及び津波の概要	1
2 被害の状況等	3
3 町方地区の状況	3

II 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要

5

III 復旧・復興の進捗状況

7

町方地区を中心とした航空写真

8

1 町民生活の状況

9

(1) 人口及び世帯数の推移

9

(2) 応急仮設住宅の設置状況

10

(3) 町外避難者数等

12

2 町の復旧・復興の状況

13

(1) 予算の状況

13

(2) 復興事業の進捗状況 ～職員数～

14

(3) 復旧事業の進捗状況

15

(4) 復興事業の進捗状況

16

(5) 復興事業の進捗状況 ～災害公営住宅～

19

3 産業の状況

20

(1) 生業の状況

20

(2) 水産業の状況

21

4 公共施設の再建状況

23

(1) 消防署

23

(2) 県立大槌病院

23

(3) 大槌学園

24

(4) 放課後子ども教育センター

24

(5) 公民館

25

(6) 集会所

25

(7) 避難路

26

(8) 御社地エリア復興拠点施設

27

(9) 大槌駅観光交流施設

28

5 震災津波伝承

(1) 納骨堂

29

(2) デジタルアーカイブ

30

(3) 生きた証

31

6 生活再建と支援

32

(1) 地域復興協議会とコミュニティ協議会

32

(2) 自治会の設立状況と活動例

33

(3) ボランティア数の推移

34

7 スケジュール

35

(1) 面整備

35～38

(2) 災害公営住宅

39～41

IV 各地区の土地利用の状況

1 町方地域、小枕・伸松地域

42～47

2 安渡地域

48～52

3 赤浜地域

53～55

4 吉里吉里地域

56～59

5 沢山地域

60

6 浪板地域

61

V 各事業の問い合わせ先

62

I 東日本大震災津波の概要

1. 地震及び津波の概要

項 目	東日本大震災津波
発生日時	平成23年3月11日(金) 14時46分頃
震央地名	三陸沖(北緯38.06.2度 東経142.51.6度)
震源の深さ	24km
規 模	マグニチュード9.0(モーメントマグニチュード)
周辺の震度	震度6弱(釜石市)
津 波	3月11日 14時49分 大津波警報発表 3月12日 20時20分 津波警報 3月13日 7時30分 津波注意報に切替 3月13日 17時58分 津波注意報解除 ※津波の最大波 表1-1
津波浸水高	表1-2
津波痕跡高	痕跡高最大13.7m(安渡)
浸水面積	4平方キロメートル(住宅・市街地面積の52%)


表1-1

調査地域	最大波
釜 石	15時21分 4.2m以上
宮 古	15時26分 8.5m以上
大船渡	15時18分 8.0m以上
久慈港	15時21分 8.6m以上

表1-2

調査地域	津波浸水高
吉里吉里	16.1m
吉里吉里漁港東側	22.2m
赤浜	12.9m
新港町	12.7m
町役場付近	10.7m
浪板 (※津波遡上高)	19.1m

1. 地震及び津波の概要

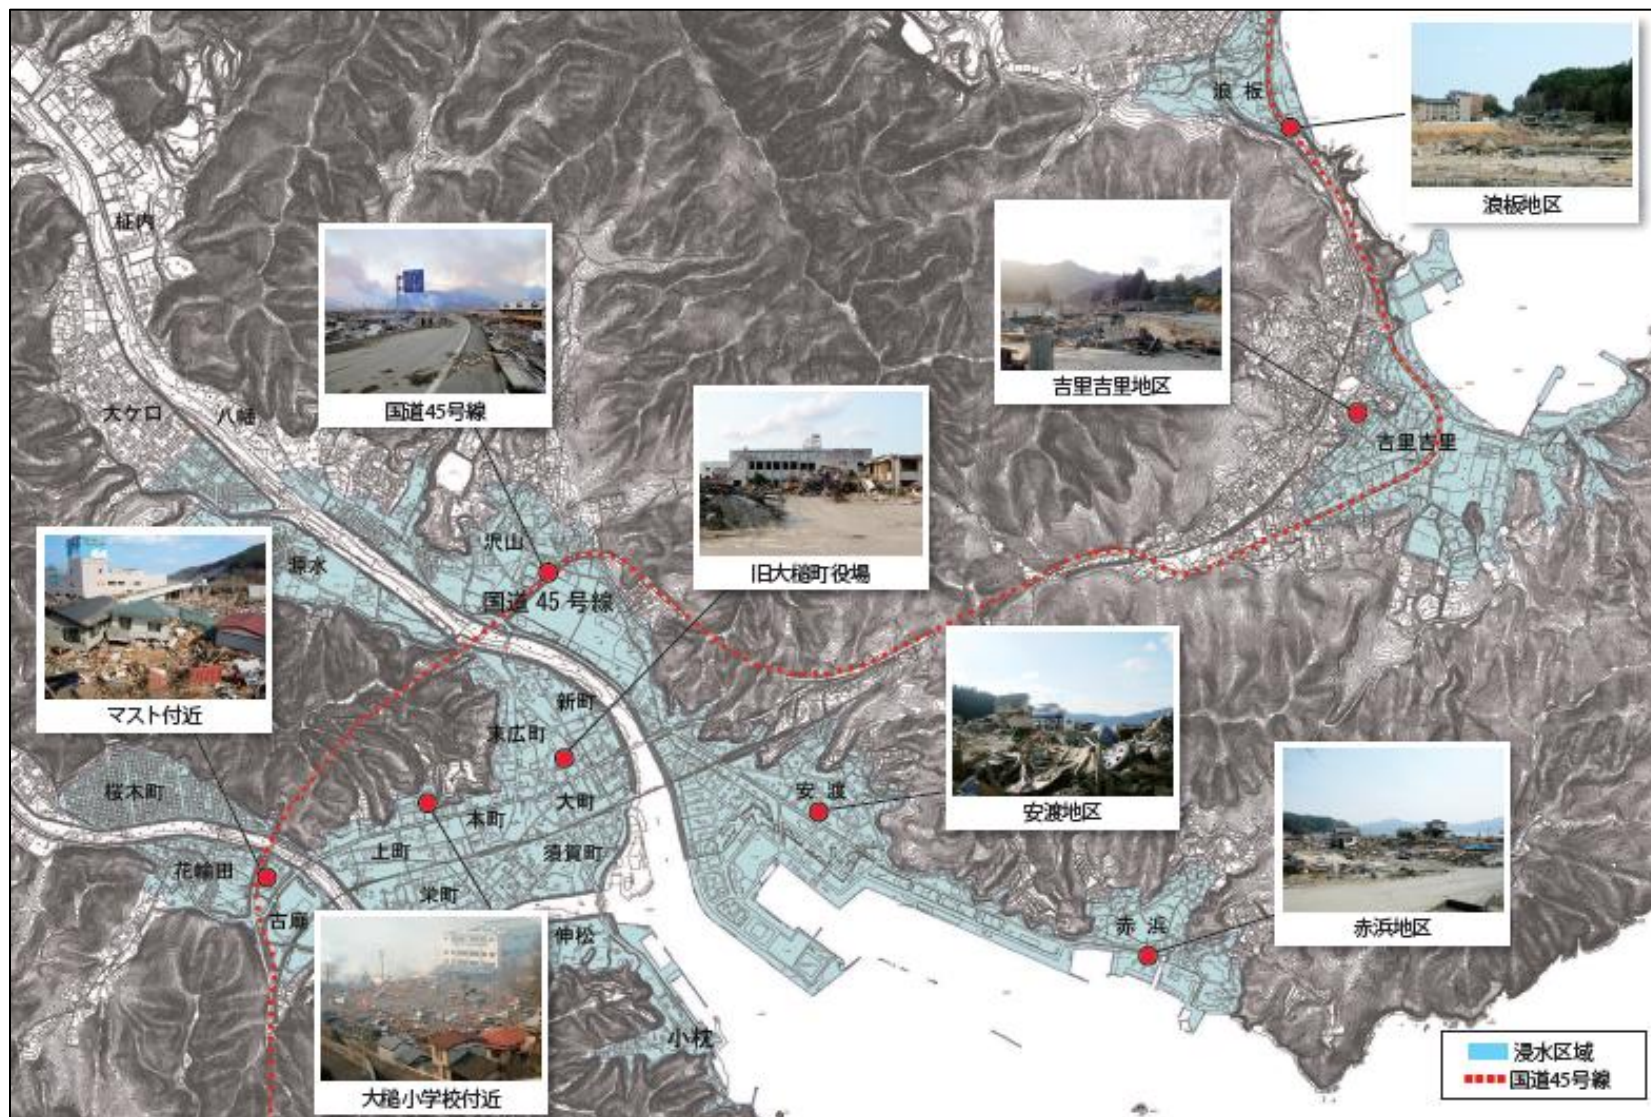

津波浸水区域

2. 被害の状況等

被害の区分		被 害	備 考
人的被害	死者	817人	身元判明者数
	行方不明者	417人	うち死亡届出数 416人
	震災関連死	52人	
	計	1,286人	
家屋被害 (H27.4確定)	全壊・半壊	4,167棟	
	一部損壊	208棟	
	計	4,375棟	
産業被害	水産業	5,127,926千円	水産施設、漁船、養殖施設等
	農業	610,000千円	水田、畑、用水路、農道
	林業	271,741千円	林野、林道
	商工業	14,039,490千円	建物、機械設備、商品等
	観光業	1,684,607千円	観光施設、自然公園
	計	21,733,764千円	
公共施設 被害	役場庁舎等	9,555,102千円	建物、公用車等
	消防施設等	427,364千円	庁舎、機械、装備、消火栓等
	道路・海岸等	41,181,244千円	公共下水道等
	上水道施設	2,213,311千円	ポンプ場等
	学校	3,044,796千円	建物、設備等
	社会教育施設	1,305,284千円	公民館、図書館、運動場等
	社会福祉施設	136,660千円	児童・障がい・高齢者・福祉施設等
	計	57,863,761千円	
産業・公共施設被害(合計)		79,597,525千円	

3. 町方地区の状況

震災前



震災直後



現在 (H30年6月22日撮影)




城山から見た中心市街地の様子

Ⅱ 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要

○計画の目的及び構成


- 町は、東日本大震災津波が与えた被害の状況や影響、復興に向けた課題を把握し、1日も早く復興を成し遂げるための未来の設計図として「大槌町東日本大震災復興計画」を策定。
- 本計画は震災復興に向けた基本的な施策の方向を示す「基本計画」と、その内容に沿って各施策に対応した事業のあり方を示す「実施計画」の2つの計画で構成。

○計画の期間

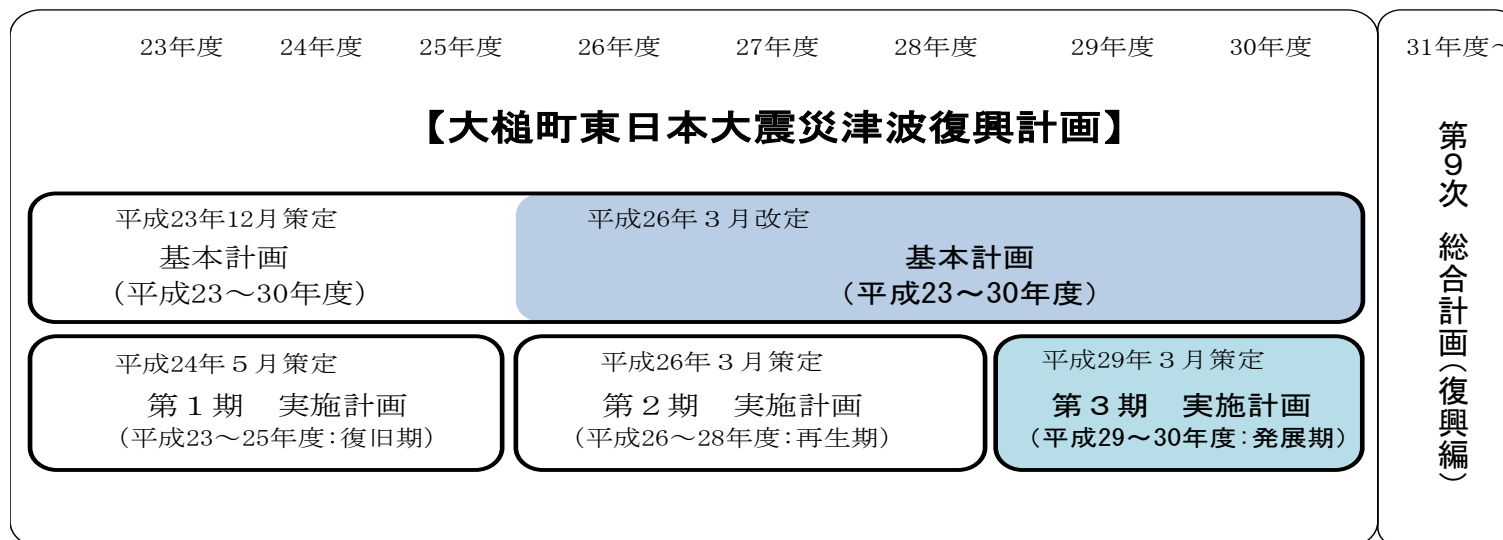

Ⅱ 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要

○復興まちづくりの体系



「希望の大槌への挑戦」という基本理念のもと、「空間環境基盤」の上に「社会生活基盤」、「経済産業基盤」、「教育文化基盤」の3つの基盤が三位一体となったまちづくりを進めることで、町の魅力向上による定住促進につなげ、「美しいまち」を実現します。

Ⅲ 復旧・復興の進捗状況

町方地区を中心とした航空写真（H29.12.20撮影）



- 1 大槌学園・大槌高校
- 2 大槌郵便局
- 3 復興きらり商店街
- 4 大槌消防署
- 5 大槌町交流文化センター
- 6 中央公民館
- 7 大槌町役場
- 8 桜木町地区避難路
- 9 県立大槌病院
- 10 大槌駅（予定）

Ⅲ 復旧・復興の進捗状況

H29.12寺野↓



H29.3大ケ口↓



H29.3浪板↓



H29.3吉里吉里↓




H29.3赤浜↓




H29.3安渡→



←H29.3
小枕・仲松

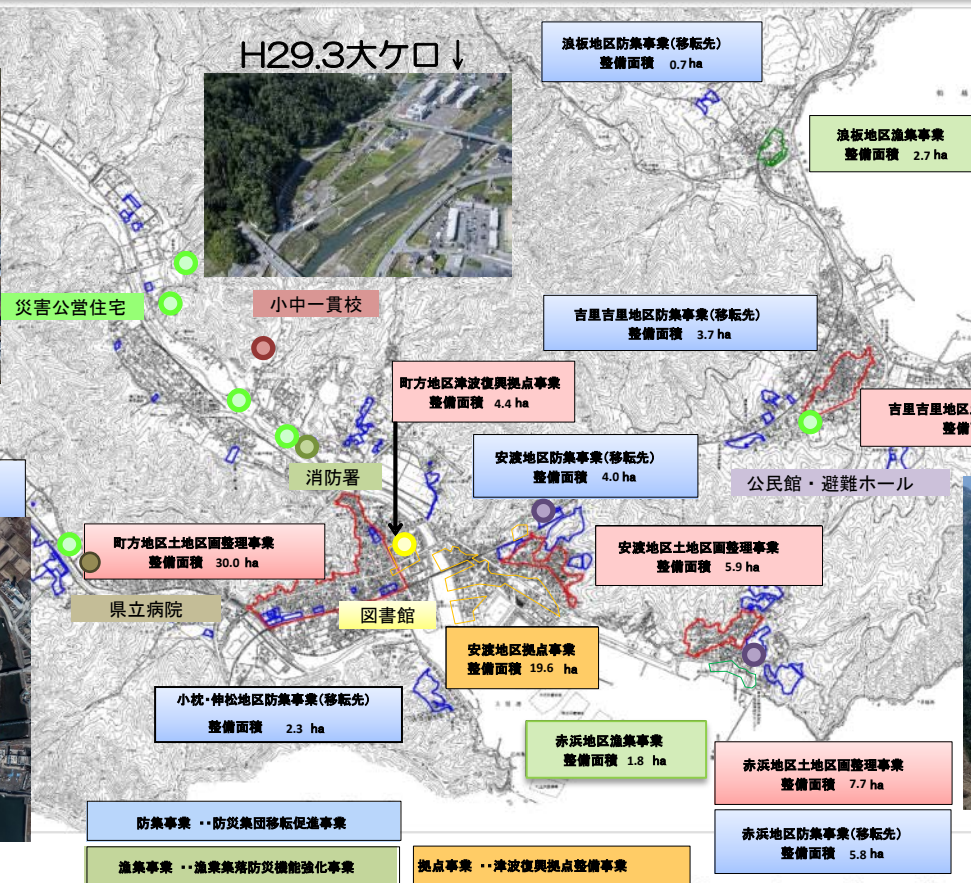


1. 町民生活の状況 (1)人口及び世帯数の推移

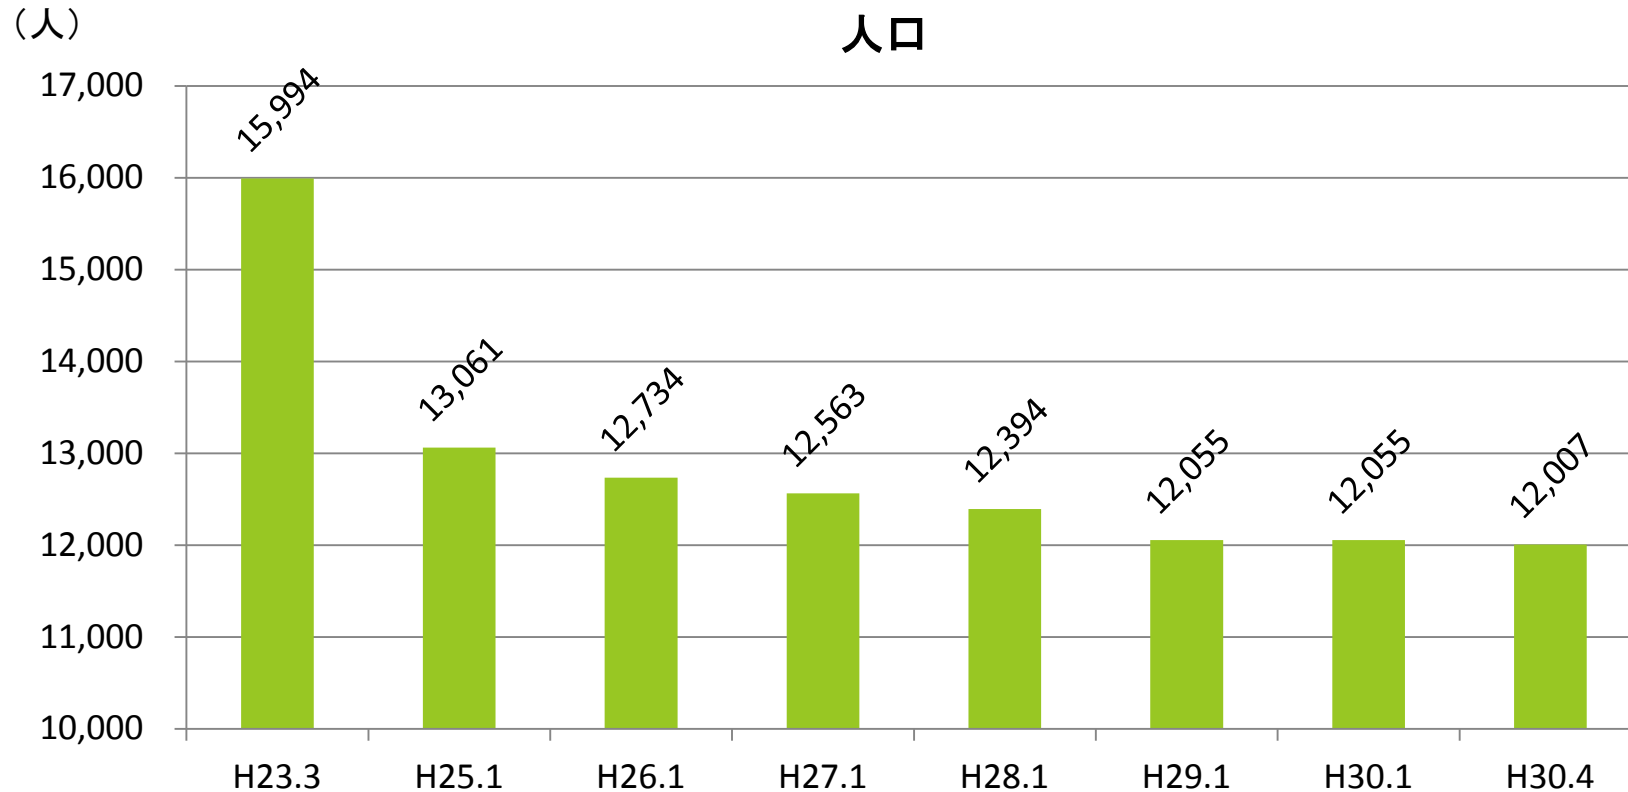


震災前 (H23.3.1)	現在 (H30.4.1)	増 減
15,994 人	12,007 人	▲ 3,987 人
6,348世帯	5,410世帯	▲ 938 世帯

(2) 応急仮設住宅の設置状況

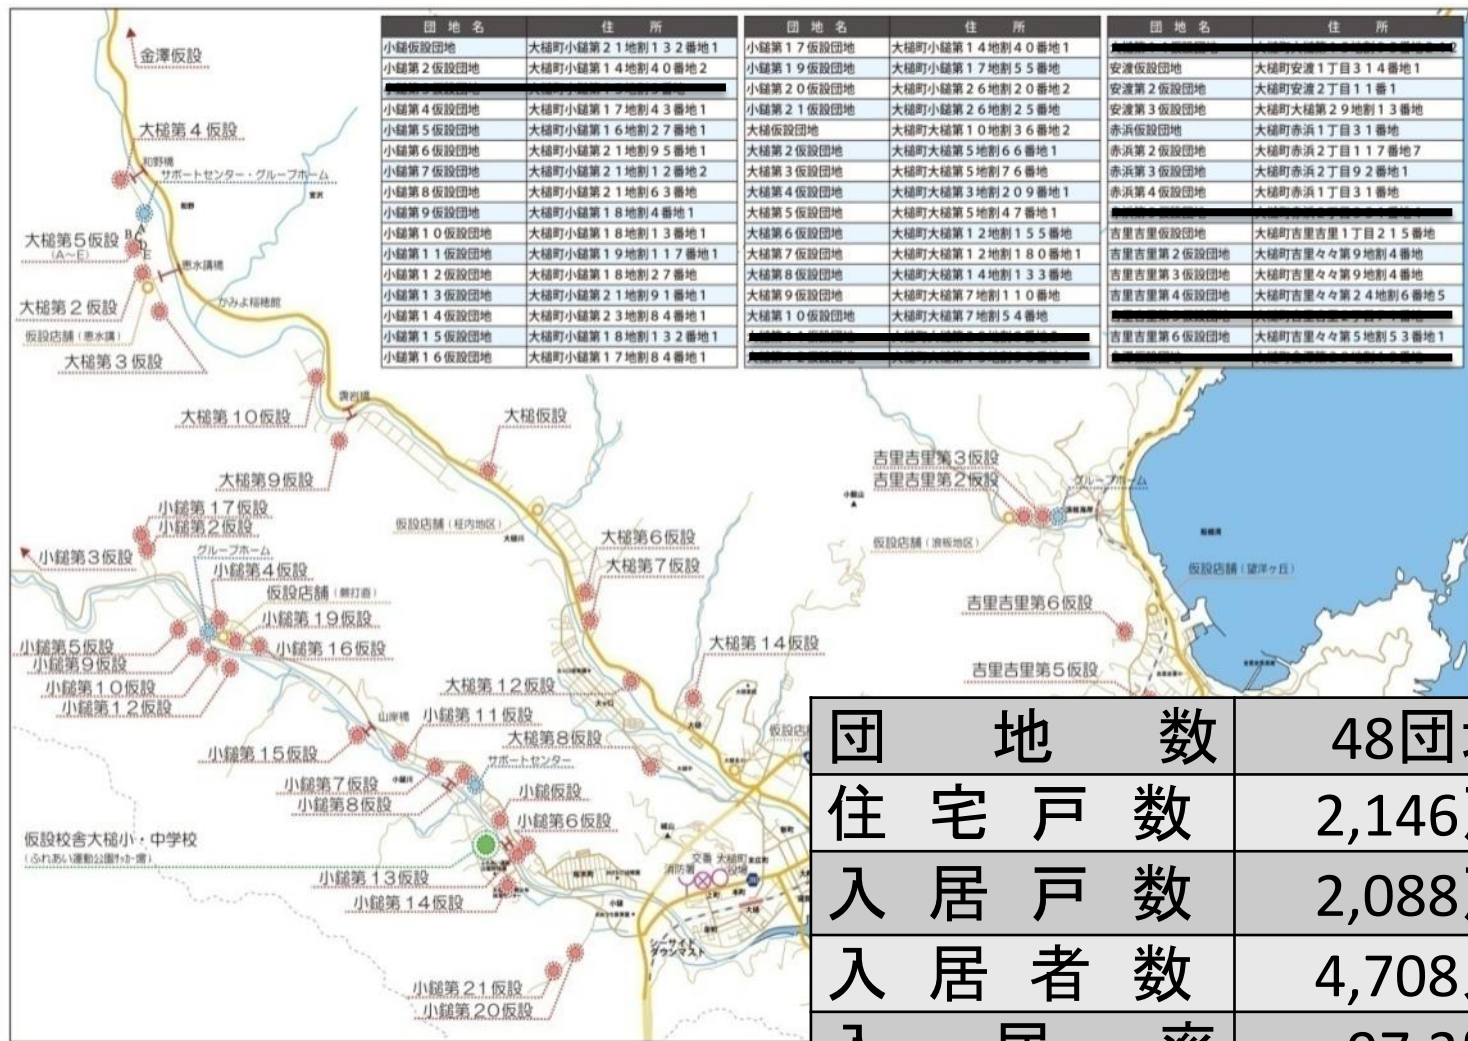


団 地 数	48団地	41団地
住 宅 戸 数	2,146戸	1,934戸
入 居 戸 数	2,088戸	627戸
入 居 者 数	4,708人	1,223人
入 居 率	97.3%	32.4%
空 き 部 屋 数	58戸	1,307戸

(2) 応急仮設住宅の状況 ～入居見込戸数～

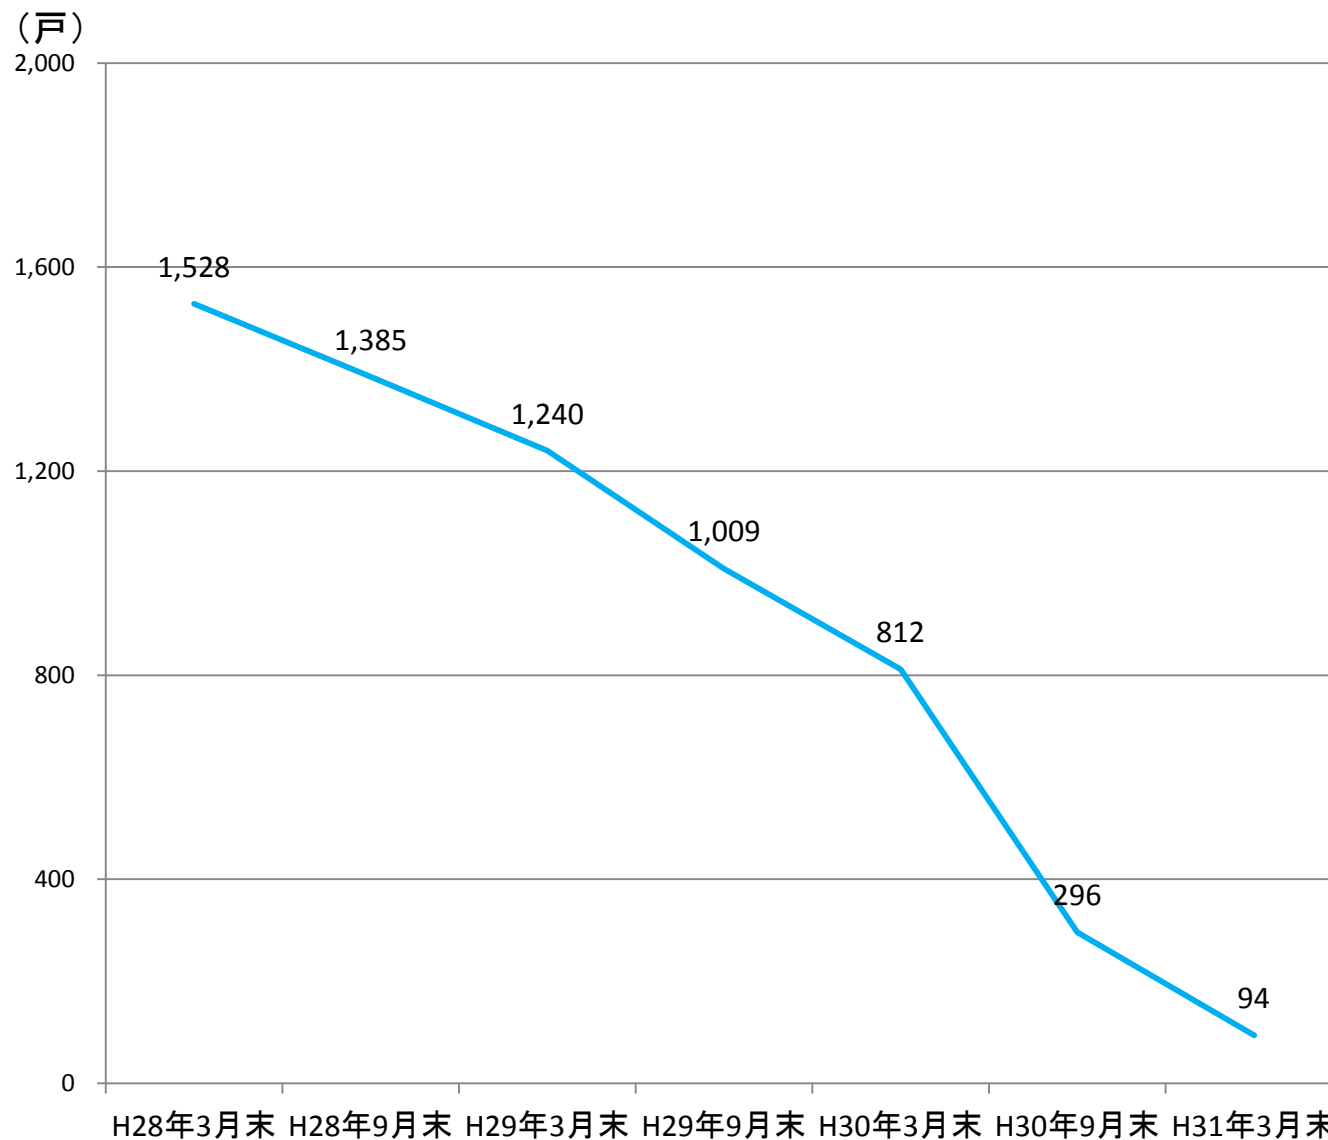


(3) 町外避難者数等

○町外避難者数

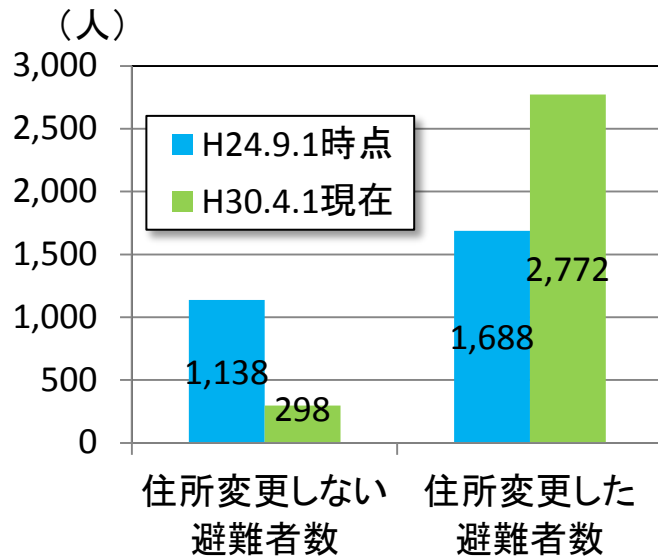



区 分	H24.9.1時点	H30.4.1現在	増 減
住所変更しない避難者数	1,138人	298人	-840人
住所変更した避難者数	1,688人	2,772人	1,084人
計	2,826人	3,070人	244人

○児童生徒数・生活保護受給者数




区 分	震災前 (H23.3.1)	震災後 (H30.4.1)	増 減
児 童 生 徒 数	1,224人	723人	▲501人
生活保護受給者数	286人	102人	▲184人

2. 町の復旧・復興の状況 (1) 予算の状況

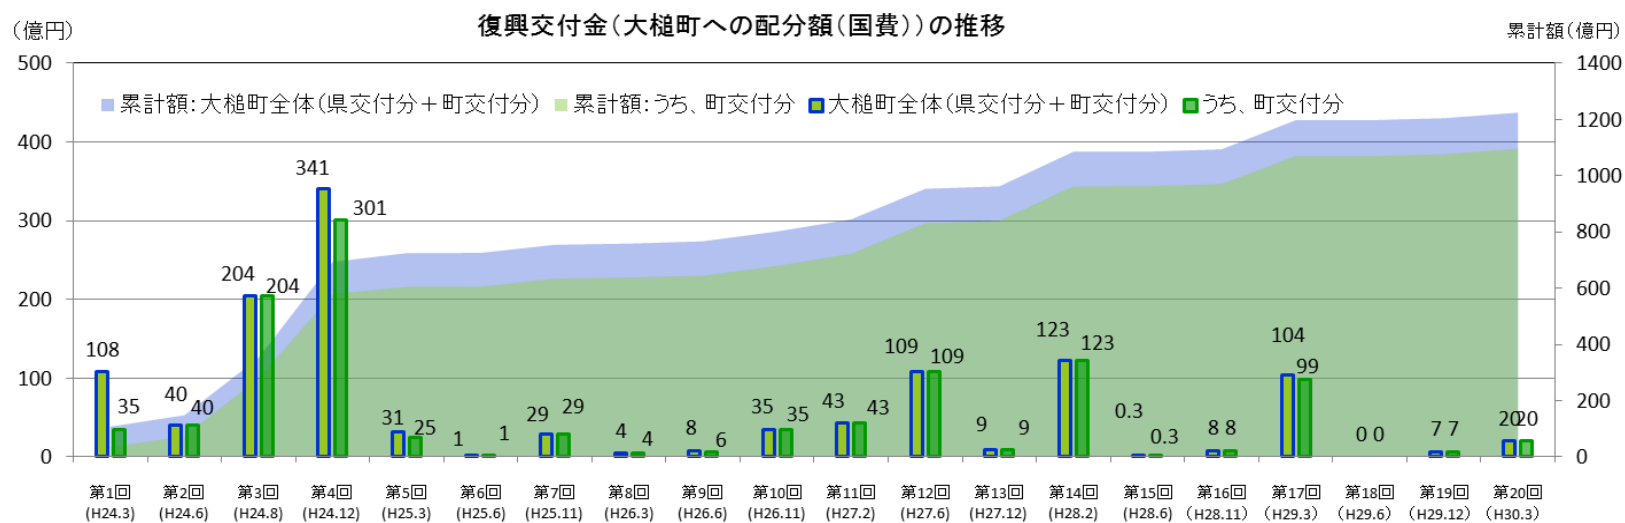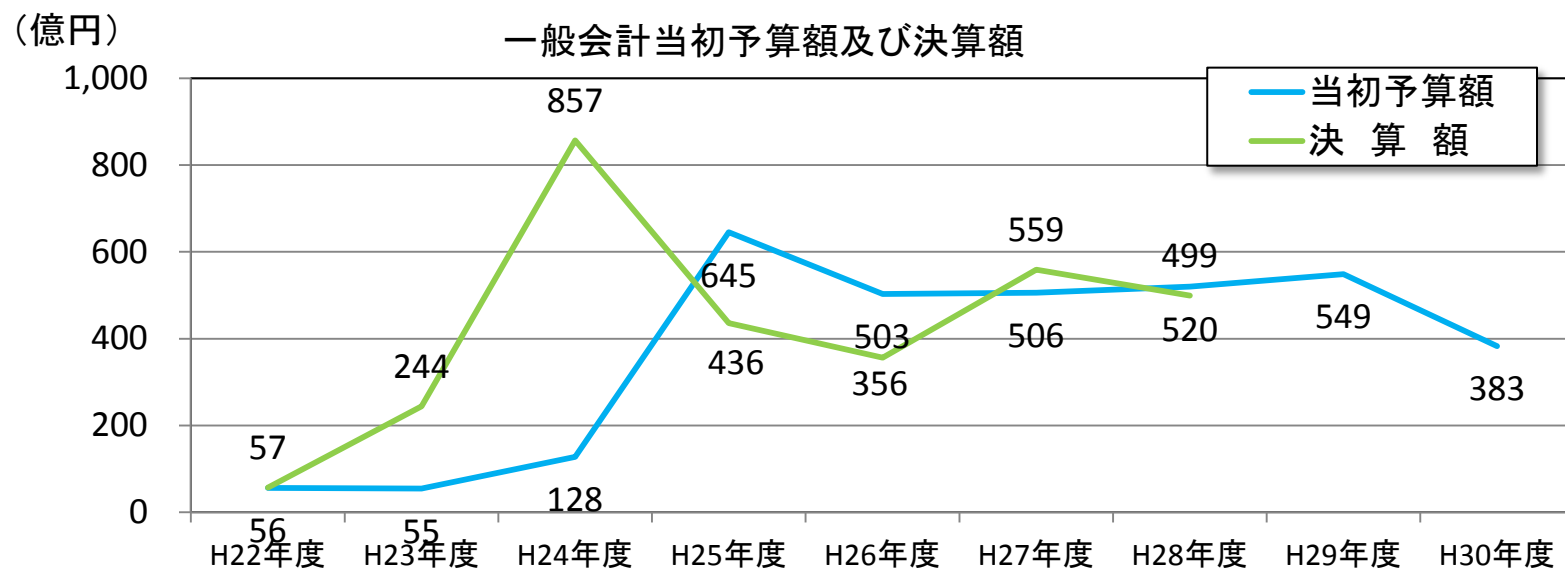


(2) 復興事業の進捗状況 ～職員数～

○職員数の推移

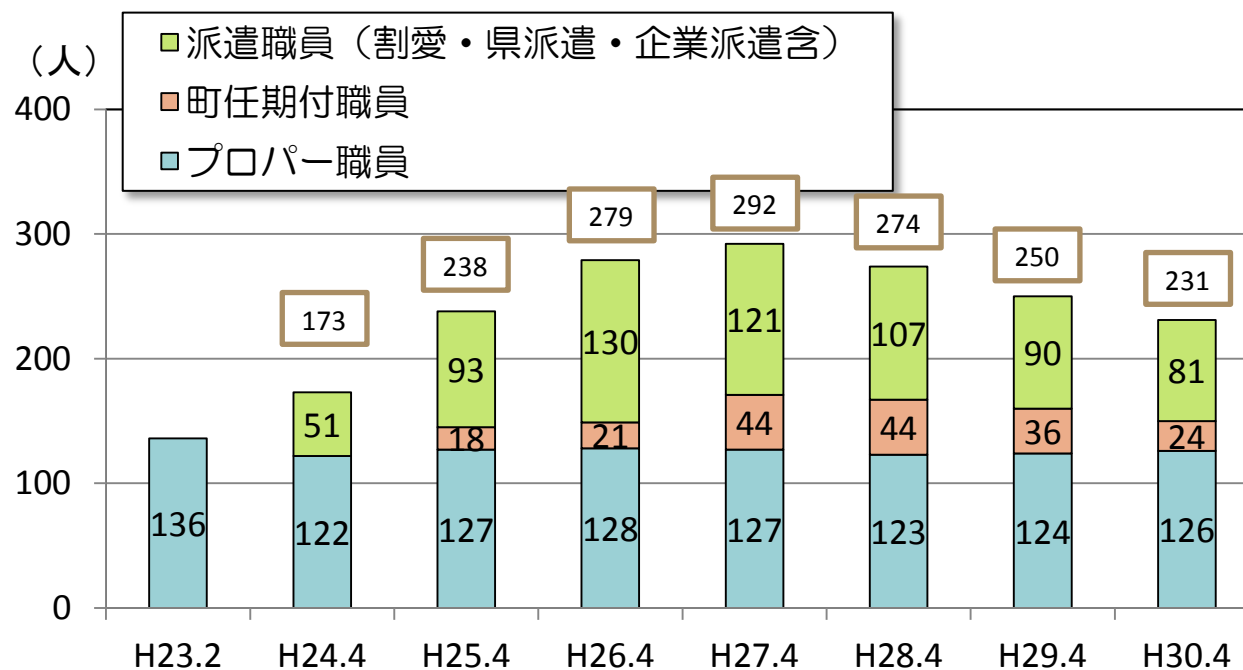

※H30.4.1現在


(3) 復旧事業の進捗状況

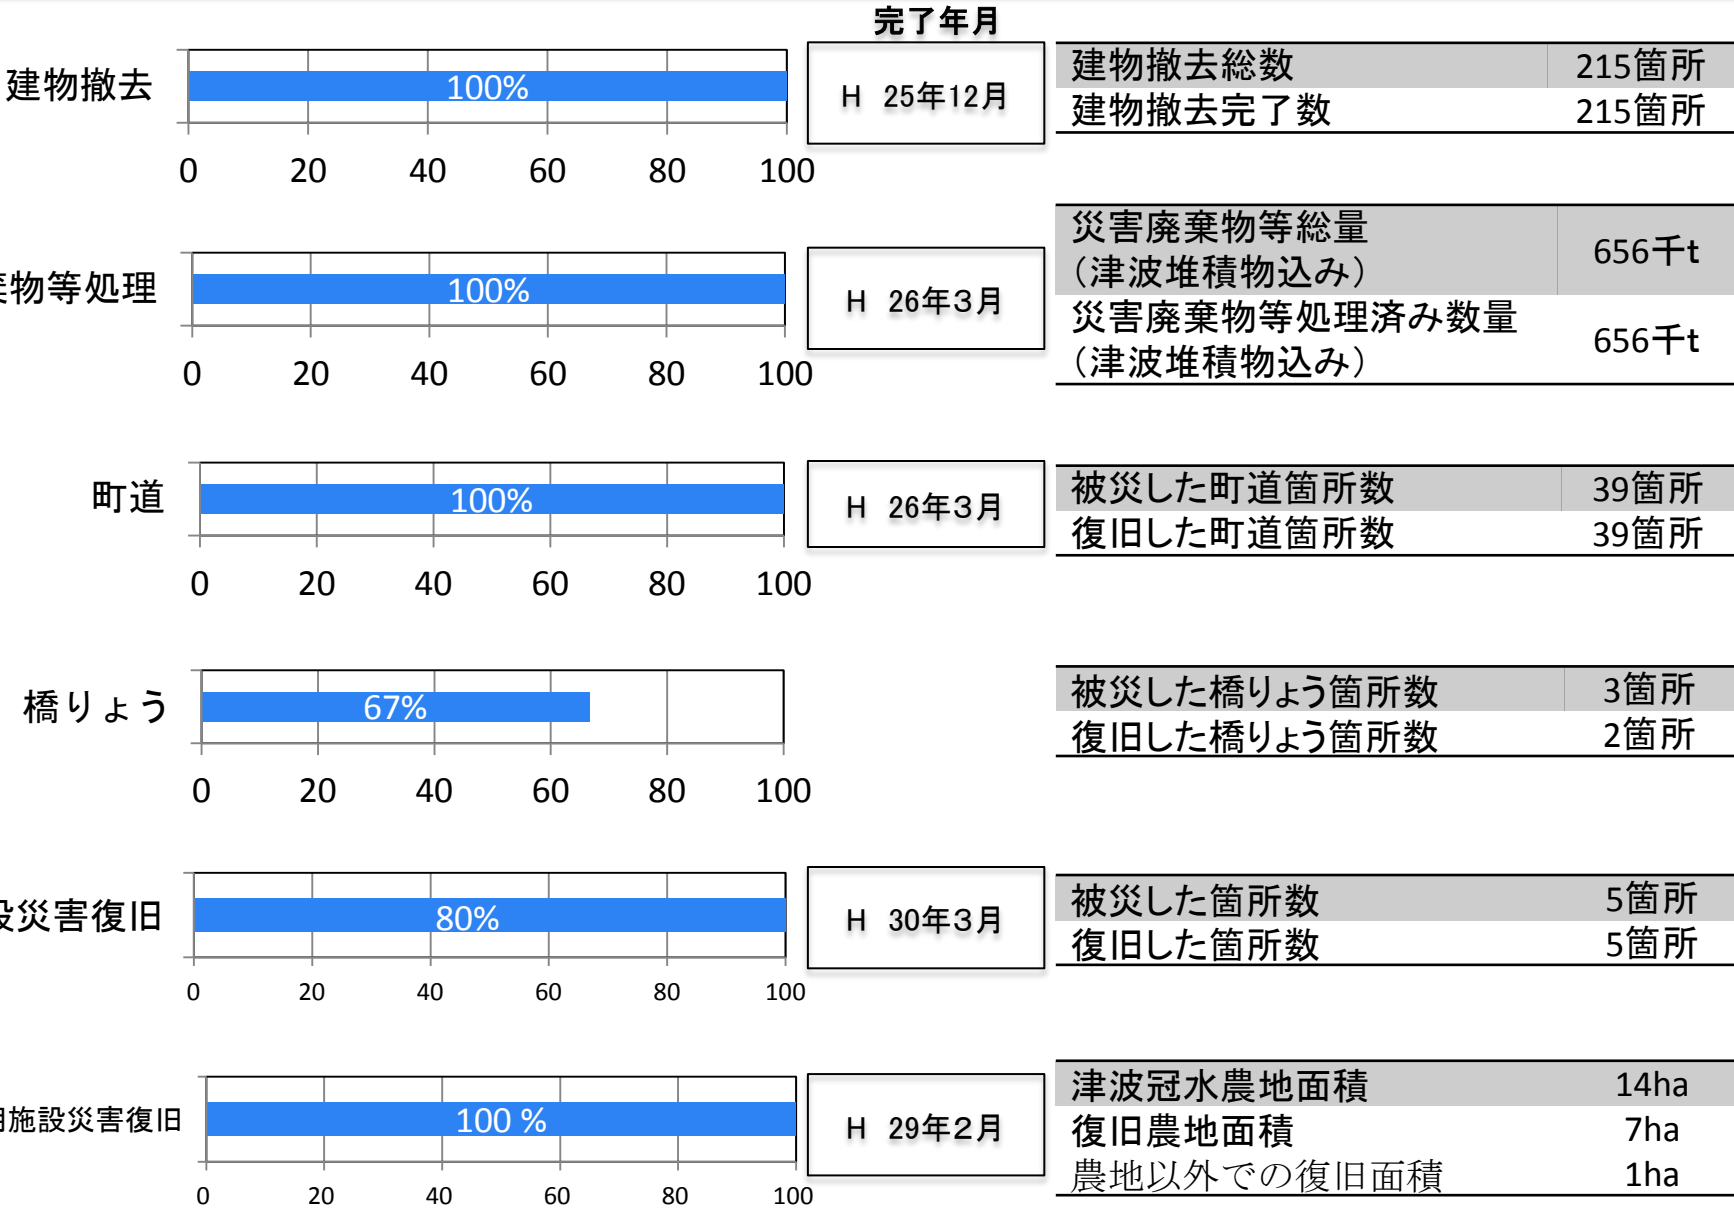


※H30.4.1現在

(4) 復興事業の進捗状況

① 土地区画整理事業




換地計画面積	346,831.5m ²
仮換地済面積	340,835.9m ²




換地計画面積	346,831.5m ²
使用収益済面積	314,160.7m ²

② 防災集団移転事業




計画宅地数	422戸
整備済宅地戸数	395戸

③ 災害公営住宅



計画戸数	878戸
完成済戸数	716戸

④ 漁業集落防災機能強化事業



完了年月
H29年7月

計画戸数	12戸
整備済宅地戸数	12戸

(4) 復興事業の進捗状況

① 土地区画整理事業

地 区			町 方	安 渡	赤 浜	吉里吉里	計
面積 (ha)		※1	30.0	5.9	7.7	9.1	52.7
計画人口 (人)		※1	2100	400	360	550	3,410
都市計画決定	当初	※1	H24.9.28	H24.9.28	H24.9.28	H24.9.28	
	最新	※1	H27.10.26	H27.8.19	H26.12.8	H27.8.19	
事業計画認可	当初	※1	H25.3.7	H25.3.7	H25.3.7	H25.3.7	
	最新	※1	H29.10.19	H29.3.29	H30.2.26	H29.9.29	
宅地完成年月		※2	H30.1	H30.12	H30.3	H29.10	
換地処分予定年月			H30.1	H32.2	H30.6	H30.3完了	


② 防災集団移転促進事業

地 区			町方・小枕・伸松	安 渡	赤 浜	吉里吉里	浪 板	計
移転促進区域 面積 (ha)	地区面積	※1	28.5	13.6	6.7	8.3	3.3	60.4
	住宅団地面積	※1	20.3	11.2	6.5	5.9	2.3	46.2
被災前戸数 (戸)		※1	918	482	140	177	47	1764
移転先住宅団地 (戸)								
() 内は団地内の災害公営 住宅戸数		※2	270 (38)	65 (0)	84 (36)	66 (0)	11 (0)	496 (74)
移転先団地面積 (ha)		※1	11.5	4.0	6.5	3.7	0.7	26.4
国土交通大臣 同意・変更同 意	当初	※1	H24.9.24	H24.9.24	H24.9.4	H24.9.24	H24.9.24	
	最新	※1	H29.3.31※大槌町全地区を統合					
宅地完成年月		※2	H29.12	H30.6	H31.2	H28.9	H27.6	

H30.4.1現在 ※1:最新の事業計画、※2:最新のロードマップ(基準日:平成30年3月31日)の数値

(4) 復興事業の進捗状況 ～区画整理等～

①復興まちづくり(区画数)

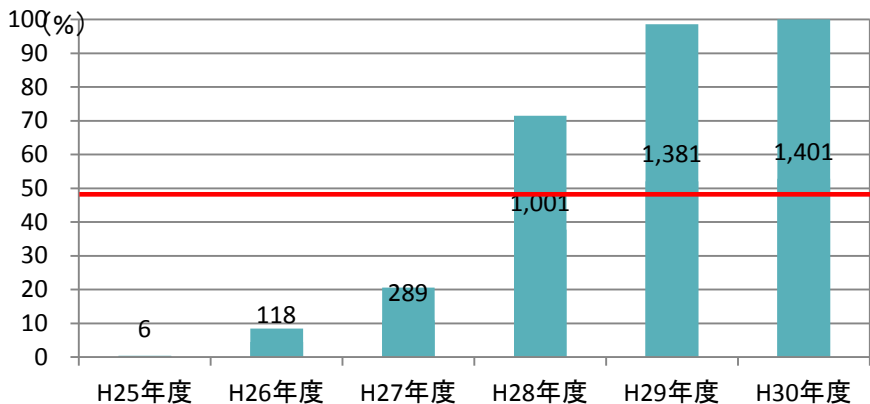


	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計
土地区画整理	0	23	100	558	277	9	967
防災集団移転	6	89	71	142	103	11	422
漁業集落防災機能強化	0	0	0	12	0	0	12
区画合計	6	112	171	712	380	20	1,401
割合(%)	0	8	21	71	99	100.0	
累計	6	118	289	1,001	1,381	1,401	

撮影場所: 町方地区



(5)復興事業の進捗状況 ～災害公営住宅～

災害公営住宅戸数

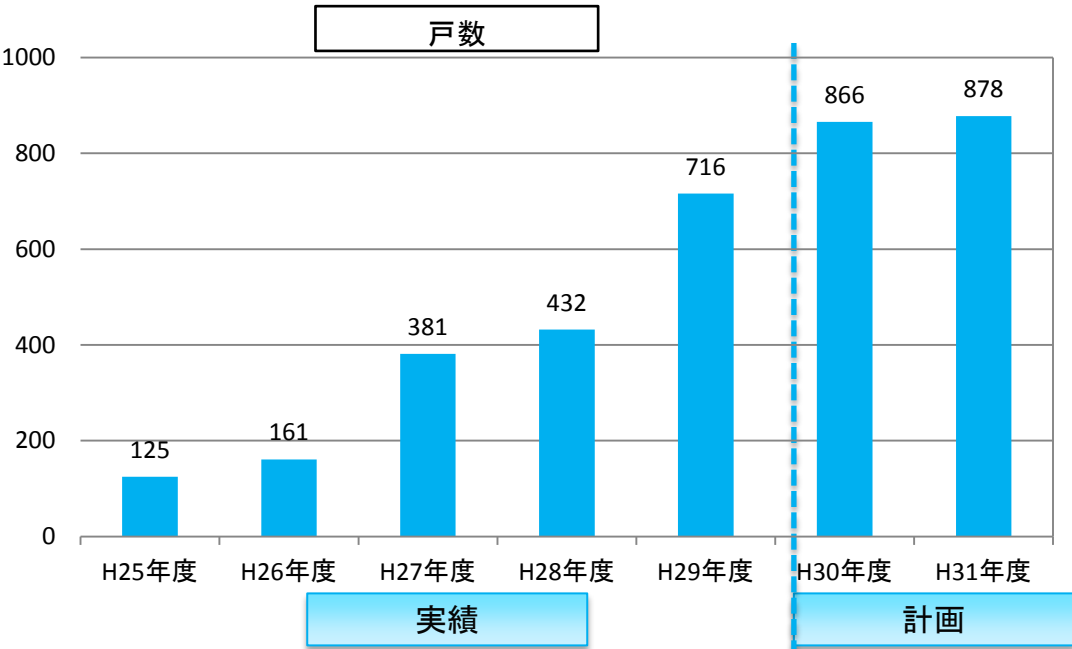

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
単年度	125	36	220	51	284	150	12
累計	125	161	381	432	716	866	878


御社地町営住宅 H29.12 完成




赤浜町営住宅 H29.12 完成



3. 産業の状況 (1) 生業の状況

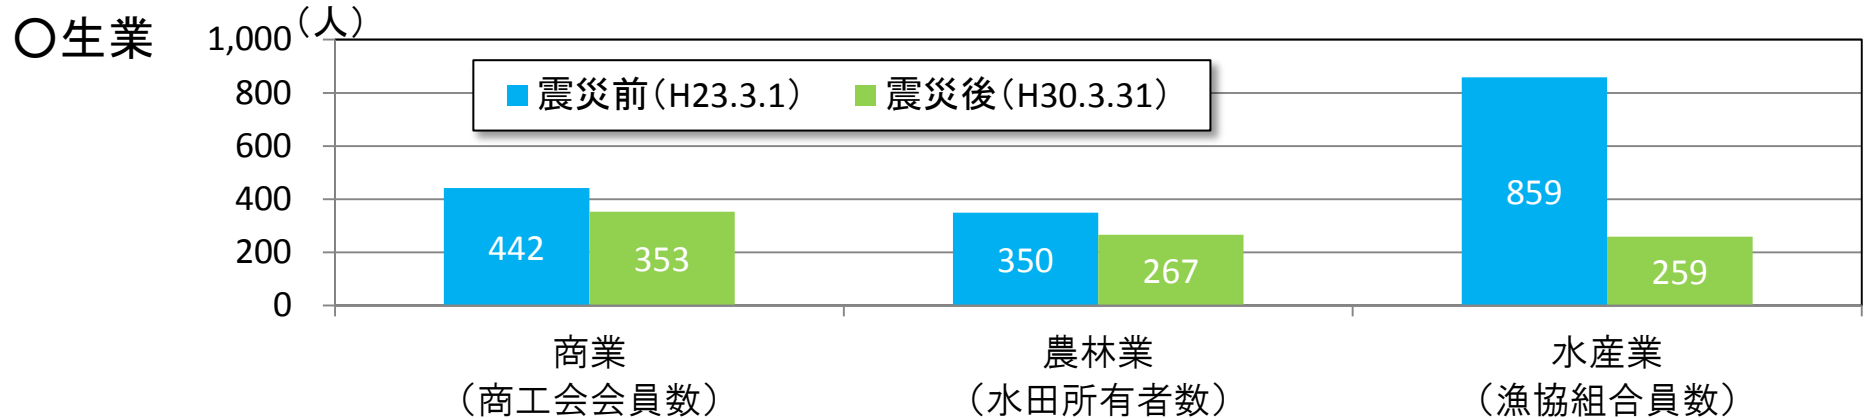

○新規求職者数・求人数




新規求職者数は、震災直後の平成23年5月以降、新規求人数を下回る傾向が続いている。

※H30.4.1現在

(2) 水産業の状況


○施設等整備

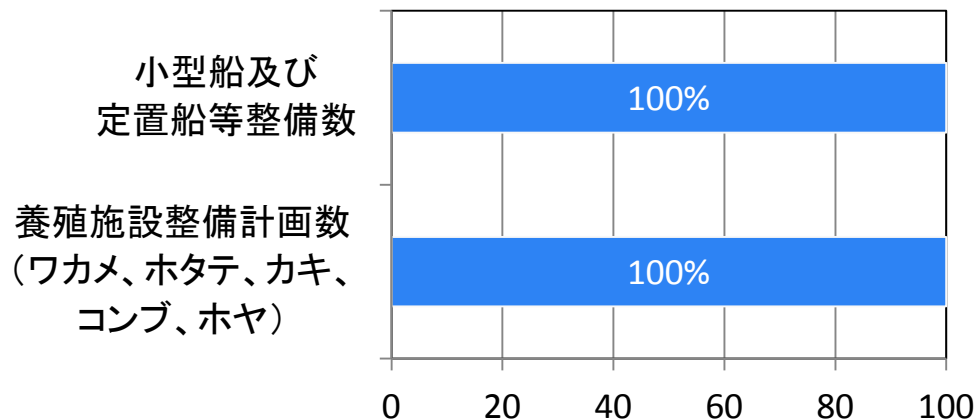

小型船及び定置船等整備計画数	237隻
小型船及び定置船等整備数	237隻

養殖施設整備計画数 (ワカメ、ホタテ、カキ、コンブ、ホヤ)	580台
養殖施設整備数 (ワカメ、ホタテ、カキ、コンブ、ホヤ)	580台

○水産加工業者数

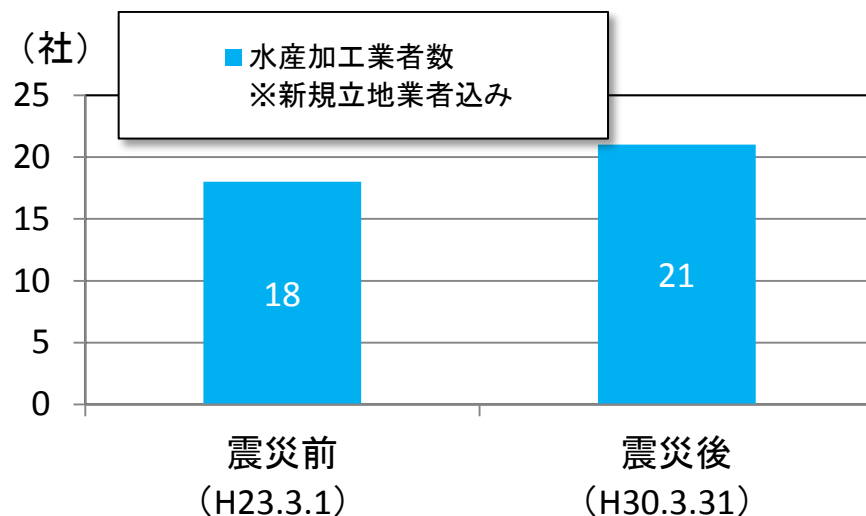


※ナカショク、伊藤商店、浦田商店、ゼネラルオ
イスター、平庄、小豆嶋漁業、及順商店、たか
のり海産、六串商店、あさひ堂、石山水産、小
野食品、壮関、中里商店、越田鮮魚店、芳賀鮮
魚店、デジタルブックプリント、魚よし、タイ
ヨー、ひょうたん島苔屋、河合商店

(2)水産業の状況

○主要水産物水揚げ高

(サケ、ワカメ、コンブ、ホタテ、カキ)

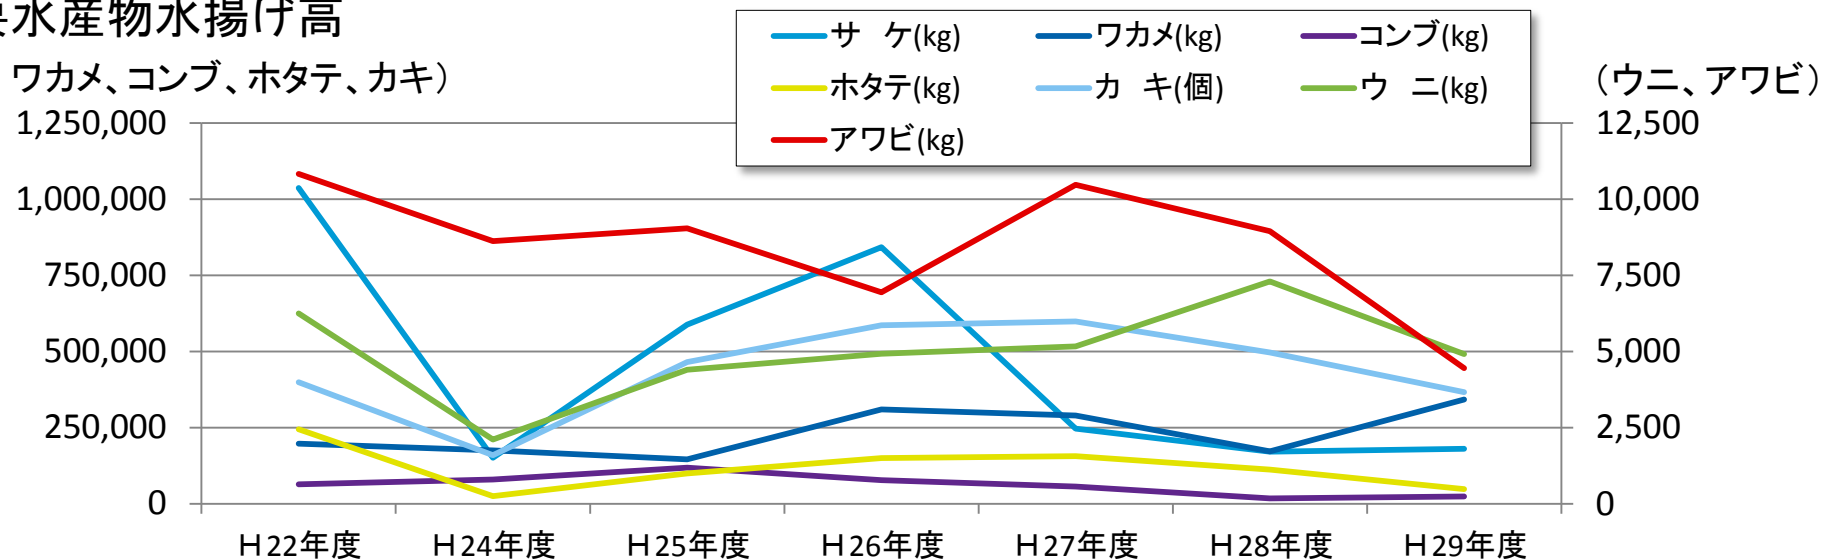

主要水産物水揚げ量表

区 分	H22年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
サ ケ(kg)	1,037,194	150,386	588,321	842,084	246,845	170,369	180,570
ウ ニ(kg)	6,249	2,111	4,396	4,924	5,171	7,296	4,914
アワビ(kg)	10,837	8,625	9,045	6,941	10,477	8,948	4,447
ワカメ(kg)	197,023	175,025	145,233	309,739	289,151	171,460	342,220
コンブ(kg)	63,690	79,789	117,764	77,730	55,770	16,935	23,535
ホタテ(kg)	244,404	25,059	99,253	149,420	156,600	111,467	47,714
カ キ(個)	399,290	159,253	464,798	586,359	598,390	497,076	366,250

4. 公共施設の再建状況 (1)消防署 (2)県立大槌病院

(1) 消防署



- 平成28年3月19日落成式・運用開始
- 所在地：大槌町大槌1 4地割1 4 2 番地1 大槌中学校跡（源水地区）
- 再建施設はH26年に建築工事着手

(2) 県立大槌病院




- 平成28年5月9日開院
- 所在地：上閉伊郡大槌町小槌22-31-2
- 病院の機能
 - (1) 圏域の地域病院として、広域基幹病院である県立釜石病院等と連携しながら高齢者を中心とした入院機能を担う。
 - (2) 診療時間内の一次診療を基本とし、診療時間外の救急は県立釜石病院で対応する。
 - (3) 入院患者を中心とした維持期のリハビリテーション機能を提供する。
- 診療科及び病床規模
 - (1) 診療科 内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科
 - (2) 病床数 1病棟 一般病床50床

(3) 大槌学園

(4) こども教育センター

(3) 大槌学園



- H28年9月26日開校
- 所在地：大槌町大槌第15地割71番地9
- 大槌小、大槌北小、赤浜小、大槌中学校が被災。
- 安渡小を含め4小学校・1中学校を合わせて寺野地区に仮設校舎設置後、「大槌学園小中一貫教育校」として再建。
- 仮設校舎期間：H23年9月22日～H28年9月25日
- H27年4月から大槌町独自の事業として、小中一貫教育「ふるさと科」が本格実施。
- H28年4月から義務教育学校となる。

(4) こども教育センター（OLA I）



- H29年4月6日開所
- 所在地：大槌町大槌第23地割25番地25
- 愛称：「OLA I（おらーい）」（大槌弁で「私の家」、「Otsuchi Learn Act Innovate」の略称）
- 対象：2～9年生及び高校生
- こども達の安心・安全な居場所の確保を目的とした「大槌町こどもセンター」（H24年4月開所）及びこども達の学びたい意欲を応援する「コラボ・スクール大槌臨学舎」（H23年12月開校）の2つの機能を統合した放課後こども教育施設。

※写真はH29.4.6に実施したオープンセレモニー

(5) 公民館 (6) 集会所

(5) 公民館



安渡地区公民館・避難ホール



吉里吉里地区公民館

- 安渡、赤浜、吉里吉里地区とも被災し解体済
- 安渡地区公民館・避難ホールはH28年11月完成
- 赤浜地区公民館・復興まちづくり支援施設は建築設計完了
- 吉里吉里地区は公民館単独でH30年2月完成

(6) 集会所



大槌町小枕地区集会所



大槌町臼澤寺野地区
ふれあい集会所



大槌町花輪田地区集会所

整備済：4箇所

- ①大槌町沢山地区集会所
平成28年3月完成
- ②大槌町臼澤寺野地区ふれあい集会所
- ③大槌町花輪田地区集会所
平成29年3月完成
- ④大槌町小枕地区集会所
平成29年11月完成

(7) 避難路



- 利用開始：平成29年4月17日
- 設置場所：大槌町桜木町裏山
- 建設趣旨：桜木町地区から平成25年3月に「桜木町地区避難路・避難場所整備計画」の提出を受け、町で整備を進めてきた避難路が平成29年3月に竣工しました。当避難路は、城山林道1号線に接続することで、災害対策本部の代替本部として設置される中央公民館や、町指定避難所である城山公園体育館への避難が可能になるほか、城山から自衛隊等の救助や救援物資の搬送、情報伝達が可能となるため、災害時に重要な役割を果たすものとなります。
- 工事概要：組立避難路 延長255.6m 幅員1.5m

(8) 大槌町交流文化センター



★東日本大震災により被災した御社地ふれあいセンター、大槌町立図書館等を（仮称）御社地エリア復興拠点施設として整備。

- 建設場所：大槌町末広町1番15号
- 施設の用途：図書館、ホール、生涯学習施設会議・交流・町民活動施設
- 階数：地上3階建て
- 延床面積：2,200m²
- 愛称「おしゃっち」に決定（平成30年8月22日）
- 大槌町文化交流センター＆図書館：平成30年6月10日 開館

【施設概要】

- 1階：多目的ホール、エントランスホール、ホワイエ（震災伝承展示）
- 2階：会議室1～5（キッチン含む）、スタジオ（2室）、震災伝承展示室
- 3階：図書館（4万5000冊）
- 駐車場（89台）

(9) 大槌駅観光交流施設



←完成イメージ図



東日本大震災により被災した大槌駅舎を観光等の情報発信拠点として整備。

- ・建設場所：大槌町本町1番1号
- ・施設用途：駅舎、観光交流施設
- ・施設概要：鉄骨造・平屋建て
- ・延床面積：161m²
- ・愛称「鮭とひょうたん島の町」に決定（平成30年3月19日）

→デザイン総選挙ポスター

スケジュール（予定含む）

平成29年 6月	基本計画策定
平成30年 3月	設計業務完了
平成30年 7月	工事着手
平成31年 1月	駅舎完成
平成31年 3月	全線一貫開通


5. 震災津波伝承 (1) 納骨堂



- 供用開始：平成29年2月19日
- 建設場所：大槌町小槌第32地割字金崎126番34
(中央公民館駐車場内)
- 建設趣旨：東日本大震災津波による身元不明の御遺骨
計66柱を収蔵するもの
- 敷地面積：687.13m²
- 建築面積：10.37m²

(2) デジタルアーカイブ

東日本大震災津波に関する画像や文書などを収録した大槌町震災アーカイブ
～つむぎ～の公開を開始しました。



The screenshot shows the homepage of the Otsuchi Town Disaster Archive website. Red dashed arrows point from text annotations to specific features on the site:

- 地域別に収録** (Recorded by region): Points to the '地域' (Region) menu item in the top navigation bar.
- 震災前2009年から2017年まで収録。2011年は時間経過と共に分類収録** (Recorded from 2009 before the disaster to 2017. 2011 is classified and recorded over time): Points to the main banner area which includes a timeline.
- 被害、避難防災支援・ボランティア、復旧・復興、行政、福祉等12のカテゴリ別に収録** (Recorded by 12 categories: damage, disaster relief, volunteer activities, restoration, recovery, administration, welfare, etc.): Points to the 'アーカイブ' (Archive) section on the right side of the page.
- 震災事象に特化して検索・閲覧が可能** (Search and viewing are possible, specialized for disaster events): Points to the search bar at the top of the page.

- 使用開始：平成29年8月8日
- 収録点数：約14,000点
- 収録内容：震災前の大槌町、災害の状況、行政の対応、救助、搜索活動、避難所、医療福祉、がれき、ライフライン、まちづくり、ボランティア活動、コミュニティ再生、学校保育所の再開、産業再開など

• URL:
<https://archive.town.otsuchi.iwate.jp/>
※27ページに記載されている「おしゃっち」に設置する タッチパネルモニタでの閲覧も可能となります。

(3) 生きた証

東日本大震災津波で犠牲となられた方々の人生の歩みや、震災時の様子などを記録した「生きた証回顧録」の平成28年度版と平成29年度版が発行となりました。

平成28年度版には、545名、平成29年度版には76名の方の記録が掲載されています。



発行された回顧録

【平成28年度版】

- 発行日：平成29年3月11日
- 発行部数：1,000部
- 配布部数：遺族分 394部。残部につきましては、希望される方へ販売

【平成29年度版】

- 発行日：平成30年3月11日
- 発行部数：900部
- 配布部数：遺族分 51部。残部につきましては、希望される方へ販売

6. 生活再建と支援

(1) 地域復興協議会とコミュニティ協議会

地域復興協議会

災害復興対策を総合的かつ計画的に推進するための過程において、地域住民との合意形成を図るため、地域復興協議会を設置しています。

主に次の項目を協議します。

- 大槌町震災復興構想素案に関する事
- 地域復興計画策定に関する事
- 身近な暮らしや地域の課題に関する事



コミュニティ協議会

町内の自治会組織、NPO及び企業などの代表が集まり、被災者支援やコミュニティ形成、観光、地域活性化など共有の課題解決について議論するとともに、各団体間の交流を図る場として、コミュニティ協議会を設置しています。

年2回程度開催



(2) 自治会の設立状況と活動例

既設の自治会

○吉里吉里結和会 ○吉里吉里越郷会 ○吉里吉里若葉会 ○吉里吉里花道育成会
○安渡町内会 ○沢山町内会 ○源水自治会 ○大ケ口団地自治会
○桜木町自治会 ○花輪田自治会

震災後に再生・新設した自治会


○赤浜自治会 ○柁内町内会 ○臼沢自治会 ○小枕地区自治会
○大ケ口一丁目町営住宅自治会 ○大ケ口町内会 ○迫又町内会
○吉里吉里町営住宅自治会 ○県営屋敷前アパート自治会
○松の下町営住宅自治会

休止中または自治会のない地区

上町、本町、大町、新町、松の下、金沢、小鎚、浪板



(3) ボランティア数の推移

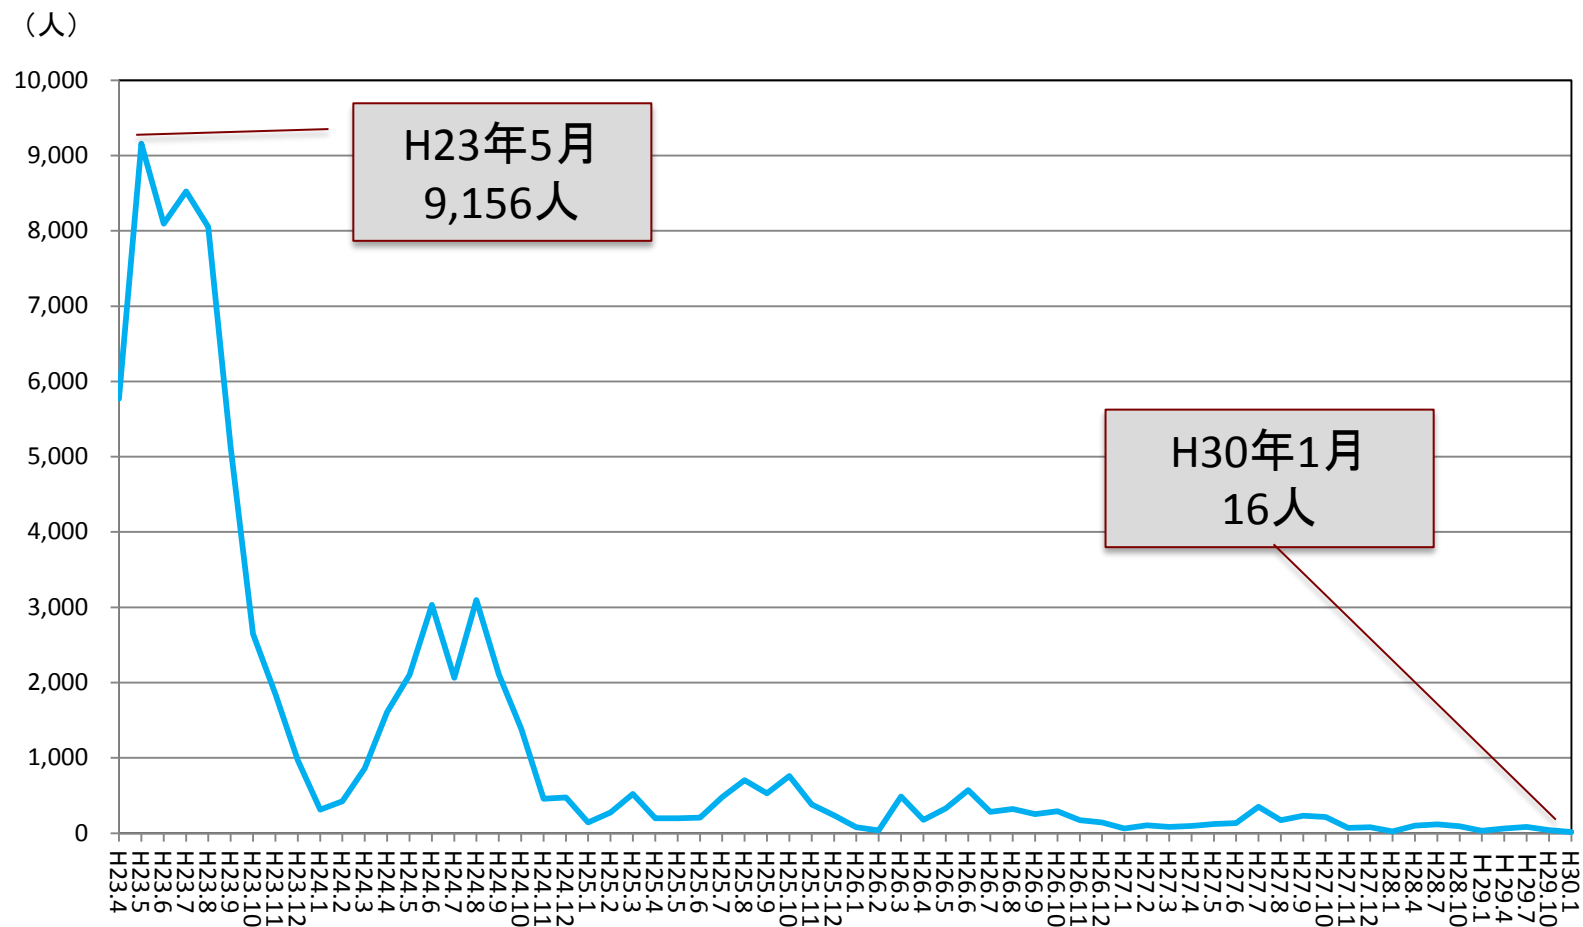

7. スケジュール (1)面整備

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）			第3期 （更なる展開への連結期間）			国復興期間		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29（2017）		H30（2018）		2019	2020
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	（災害復旧） 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	用地、設計等			★工事								
			2 小鎚川	（災害復旧） 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基	用地、設計等			★工事								
	林野海岸		3 浪板地区	（治山施設災害） 防潮堤L=0.4km	■H24.10完成											
	漁港海岸		4 吉里吉里 漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基	用地、設計等			★工事								
			5 大槌漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=2.0km、 水門N=1基	用地、設計等			★工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30供用予定 釜石北IC～大槌IC H31供用予定											
	復興関連道路	県	B（主） 大槌小国線	土坂の3	★工事											

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成30年3月31日(平成30年5月7日公表))」より

(1)面整備

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												国復興期間	
					第1期 〈基礎復興期間〉			第2期 〈本格復興期間〉			第3期 〈更なる展開への連結期間〉							
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29(2017)		H30(2018)		2019	2020		
漁 港	漁 港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他					■H28.3完成									
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他					■H28.3完成									
医 療	病院	県	県立大槌病院	病院(RC造) 医師公舎(RC造) 職員公舎(RC造)					■H28.3完成									
教 育	小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転					■H28.9完成			H25 H28	小学校4校統合(新校名:大槌小学校) 小学校及び中学校を統合し、義務教育 学校に移行(新校名:大槌学園)					
	中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転					■H28.9完成									

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成30年3月31日(平成30年5月7日公表))」より

(1)面整備

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										国復興期間			
					第1期 （基礎復興期間）			第2期 （本格復興期間）			第3期 （更なる展開への連結期間）							
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29（2017）		H30（2018）					
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1（一）吉里吉里 釜石線	赤浜														
	土地区画整理		a 町方地区	区域面積：30.0ha 対象戸数：793戸 （民510戸・公283戸）														
			b 安渡地区	区域面積：5.9ha 対象戸数：171戸 （民110戸・公61戸）	用地、設計等													
			c 赤浜地区	区域面積：7.7ha 対象戸数：147戸 （民147戸）														
			d 吉里吉里地区	区域面積：9.1ha 対象戸数：219戸 （民200戸・公19戸）														
	津波復興拠点		e 町方地区	区域面積 町方地区（3.8ha）	用地、設計等													
			f 安渡地区	区域面積 安渡地区（19.6ha）	用地、設計等													
	漁業集落防災 機能強化		z 吉里吉里地区	漁業集落排水施設他	用地、設計等													
			aa 浪板地区	対象戸数：21戸 （民10戸・公11戸）														
			ab 安渡地区	集落連他	用地、設計等													
			ac 赤浜地区	対象戸数：2戸 （民2戸）														

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成30年3月31日(平成30年5月7日公表))」より

(1)面整備

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										回復期期間		
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (生活復興期間)			第3期 (更なる発展への道徳期間)				2019		2020
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29(2017)		H30(2018)		2019	2020	
復興 まちづくり	防災集団移転	町	e 赤浜地区 (赤浜①団地)	対象戸数:18戸 (民11戸・公7戸)	用地、設計等			★工事				民11戸	公7戸				
			h 赤浜地区 (赤浜②団地)	対象戸数:34戸 (民24戸・公10戸)					民24戸		公10戸						
			i 赤浜地区 (赤浜③団地)	対象戸数:32戸 (民13戸・公19戸)	用地、設計等			★工事				民11戸 公19戸	民2戸				
			j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)	対象戸数:18戸 (民18戸)			民2戸	民18戸									
			k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)	対象戸数:35戸 (民35戸)					民35戸								
			l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)	対象戸数:13戸 (民13戸)					民13戸								
			m 浪板地区 (浪板①団地)	対象戸数:11戸 (民11戸)					民11戸								
			n 安渡地区	対象戸数:4戸 (民4戸)	用地、設計等			★工事				民1戸	民3戸				
			o 安渡地区 (安渡①団地)	対象戸数:27戸 (民27戸)							民27戸						
			p 安渡地区 (安渡②団地)	対象戸数:13戸 (民13戸)					民13戸								
			q 安渡地区 (安渡③団地)	対象戸数:10戸 (民10戸)					民10戸								
			r 安渡地区 (安渡④団地)	対象戸数:11戸 (民11戸)	用地、設計等			★工事				民44戸	民11戸				
			s 町方・小枕・ 伸松地区 (寺野白澤団地)	対象戸数:138戸 (民100戸・公38戸)				民42戸	民24戸 公16戸	公11戸		民34戸 公11戸					
			t 町方・小枕・ 伸松地区 (大ヶ口、沢山、夏本、 延内、藤敷前団地)	対象戸数:65戸 (民65戸)			民4戸	民37戸		民24戸							
			u 町方・小枕・ 伸松地区 (町方団地)	対象戸数:35戸 (民35戸)					民7戸	民14戸		民14戸					
			v 町方・小枕・ 伸松地区 (小枕団地)	対象戸数:22戸 (民22戸)						民22戸							
			w 町方・小枕・ 伸松地区 (花輪田地区)	対象戸数:10戸 (民10戸)				民10戸									

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成30年3月31日(平成30年5月7日公表))」より

(2) 災害公営住宅

路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												国復興期間	
		第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)							
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29(2017)		H30(2018)		2019	2020		
ア 吉里吉里 (単独)	RC造5階 戸数:34戸			34戸 ■H25.8完成											
イ 大槌(柱内) (単独)	木造 戸数:24戸					24戸 ■H28.3完成									
ウ 大槌(屋敷前) (単独)	RC造5階 戸数:151戸					151戸 ■H27.10完成									
エ 安渡(C) (区:安渡地区)	RC造5階 戸数:23戸			用地、設計等・工事						★工事		23戸			
オ 三枚堂 (単独)	木造 戸数:97戸									97戸 ■H30.3完成					
カ 町方1(共同) (区:町方地区)	RC造 戸数:23戸		用地、設計等・工事						★工事		23戸				
キ 町方2(戸建) (区:町方地区)	木造 戸数:38戸									■H30.3完成			38戸		
キ 町方2(共同) (区:町方地区)	RC造 戸数:23戸		用地、設計等・工事						工事		23戸				
ク 大ケ口 (単独)	木造 戸数:70戸			70戸 ■H25.8完成											
ケ 屋敷前 (単独)	木造 戸数:21戸			21戸 ■H25.11完成											
コ 大ケ口2丁目 (単独)	木造2階 戸数:23戸				23戸 ■H26.9完成										
サ 柱内① (単独)	木造 戸数:13戸				13戸 ■H26.12完成										
シ 町方(末広町) (区:町方地区)	RC造6階 戸数:53戸					53戸 ■H28.3完成									
ス 町方(御社地) (区:町方地区)	RC造 戸数:24戸									24戸 ■H29.12完成					
セ 町方(本町) (区:町方地区)	木造 戸数:8戸						8戸 ■H29.3完成								

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成30年3月31日(平成30年5月7日公表))」より

(2) 災害公営住宅

路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												国復興期間	
		第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)							
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29(2017)		H30(2018)		2019	2020		
ソ 町方D東-1 (区:町方地区)	木造 戸数:4戸								■H29.12完成	4戸					
ソ 町方D東-2 (区:町方地区)	木造 戸数:5戸								■H29.12完成	5戸					
ソ 町方D東-4 (区:町方地区)	木造 戸数:12戸								■H29.12完成	12戸					
タ 町方E-1 (区:町方地区)	木造 戸数:3戸		用地、設計等							工事			3戸		
タ 町方E-2 (区:町方地区)	木造 戸数:6戸		用地、設計等							工事			6戸		
タ 町方E-3 (区:町方地区)	木造 戸数:11戸		用地、設計等							工事			11戸		
チ 町方(上町) (区:町方地区)	木造 戸数:4戸							4戸 ■H29.3完成							
ツ 町方D西-6 (区:町方地区)	木造 戸数:2戸								2戸 ■H30.3完成						
ソ 町方D西-7 (区:町方地区)	木造 戸数:3戸		用地、設計等							工事			3戸		
ツ 町方D西-8 (区:町方地区)	木造 戸数:5戸		用地、設計等							工事			5戸		
テ 町方F-1 (区:町方地区)	木造 戸数:15戸		用地、設計等							工事			15戸		
テ 町方F-2 (区:町方地区)	木造 戸数:26戸		用地、設計等・工事							工事			26戸		
テ 町方F-3 (区:町方地区)	木造 戸数:12戸		用地、設計等							工事			12戸		
ト 吉里吉里(A) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:5戸							1戸	■H29.4完成	4戸					
ト 吉里吉里(B1) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:12戸								■H29.7完成	12戸					


※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成30年3月31日(平成30年5月7日公表))」より

(2) 災害公営住宅

路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										国復興期間	
		第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)					
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29(2017)		H30(2018)		2019	2020
ト 吉里吉里(C1) (区:吉里吉里地区)	木造 戸数:2戸							■H29.10完成		2戸			
ナ 赤浜①団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:7戸			用地、設計等								7戸 工事	
ナ 赤浜②団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:10戸							■H29.5完成		10戸			
ナ 赤浜⑥団地 (防:赤浜地区)	木造 戸数:19戸							■H29.12完成		19戸			
ニ 浪板 (漁:浪板地区)	木造 戸数:11戸							■H29.7完成		11戸			
ニ 浪板(1) (単独)	木造 戸数:3戸						■H28.6完成	3戸					
ヌ 安渡(A①) (区:安渡地区)	木造 戸数:11戸							■H29.12完成		11戸			
ヌ 安渡(A②) (区:安渡地区)	木造 戸数:8戸							■H30.3完成		8戸			
ヌ 安渡(A③) (区:安渡地区)	木造 戸数:2戸							■H30.2完成		2戸			
ヌ 安渡(B1) (区:安渡地区)	木造 戸数:12戸							■H29.7完成		12戸			
ヌ 安渡(B2) (区:安渡地区)	木造 戸数:5戸			用地、設計等							工事		5戸
ネ 寺野1 (防:寺野地区)	木造 戸数:16戸					■H27.9完成	16戸						
ネ 寺野2 (防:寺野地区)	木造 戸数:11戸						■H28.7完成	11戸					
ネ 寺野3 (防:寺野地区)	木造 戸数:11戸							■H30.3完成		11戸			

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成30年3月31日(平成30年5月7日公表))」より

1. 町方地域、小枕・伸松地域

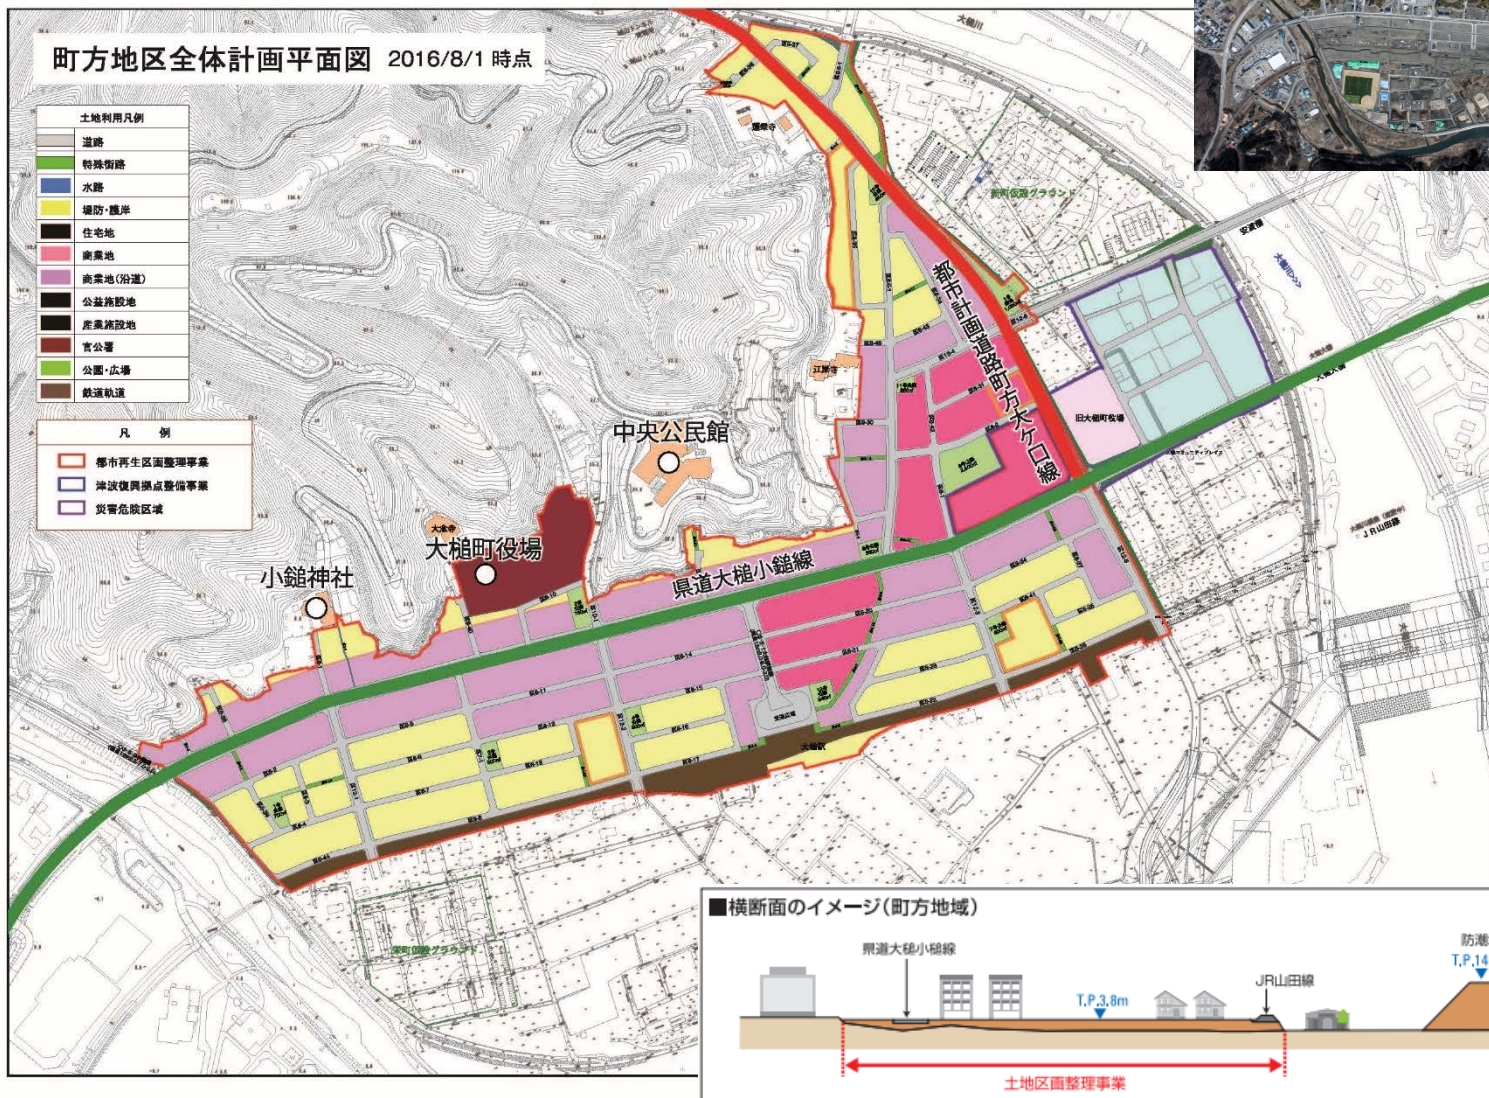


IV 各地区の土地利用の状況

1. 町方地域、小枕・伸松地域 (1) 土地区画整理事業


平成30年4月1日現在



(2) 防災集団移転促進事業

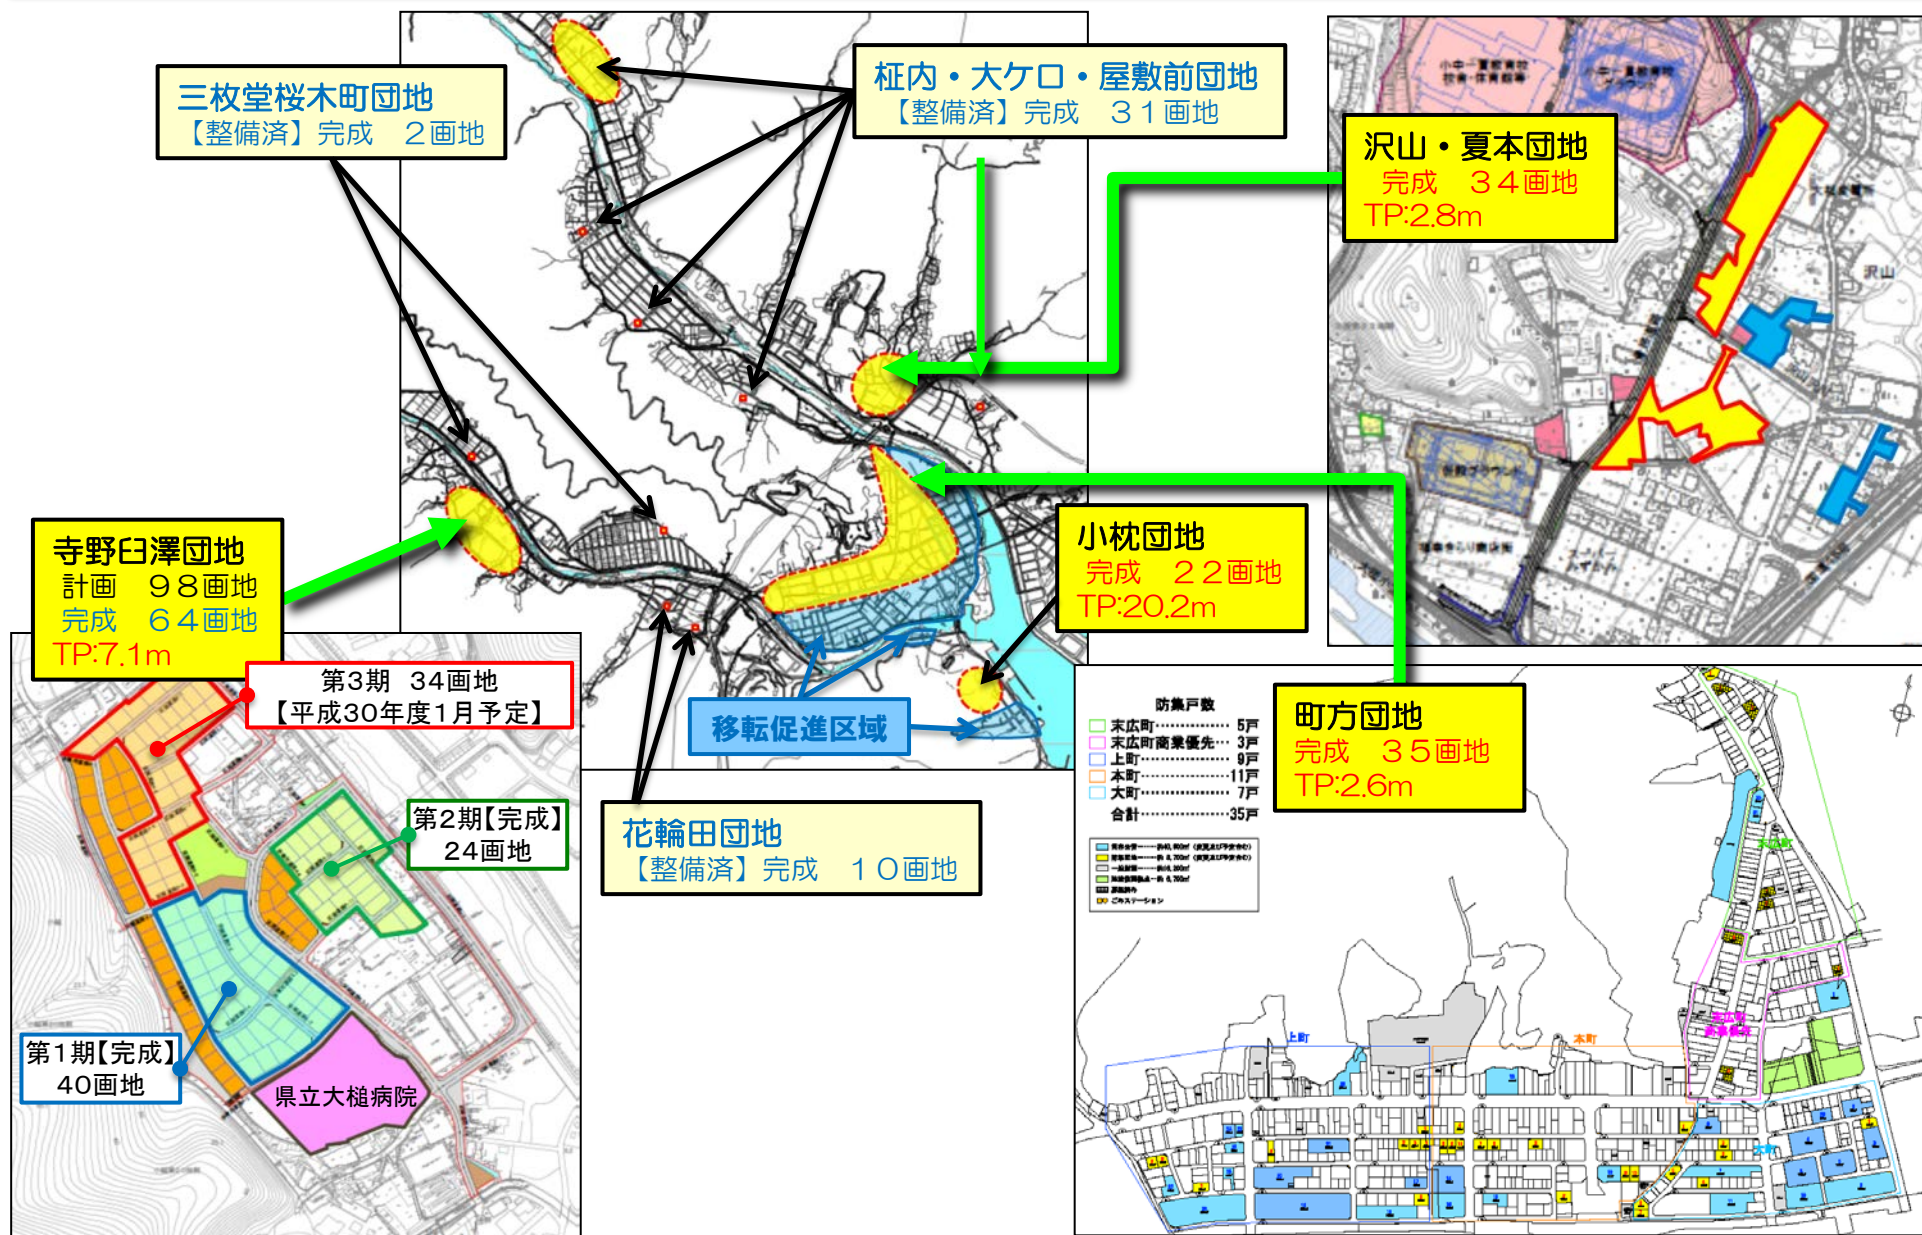


(2) 防災集団移転促進事業

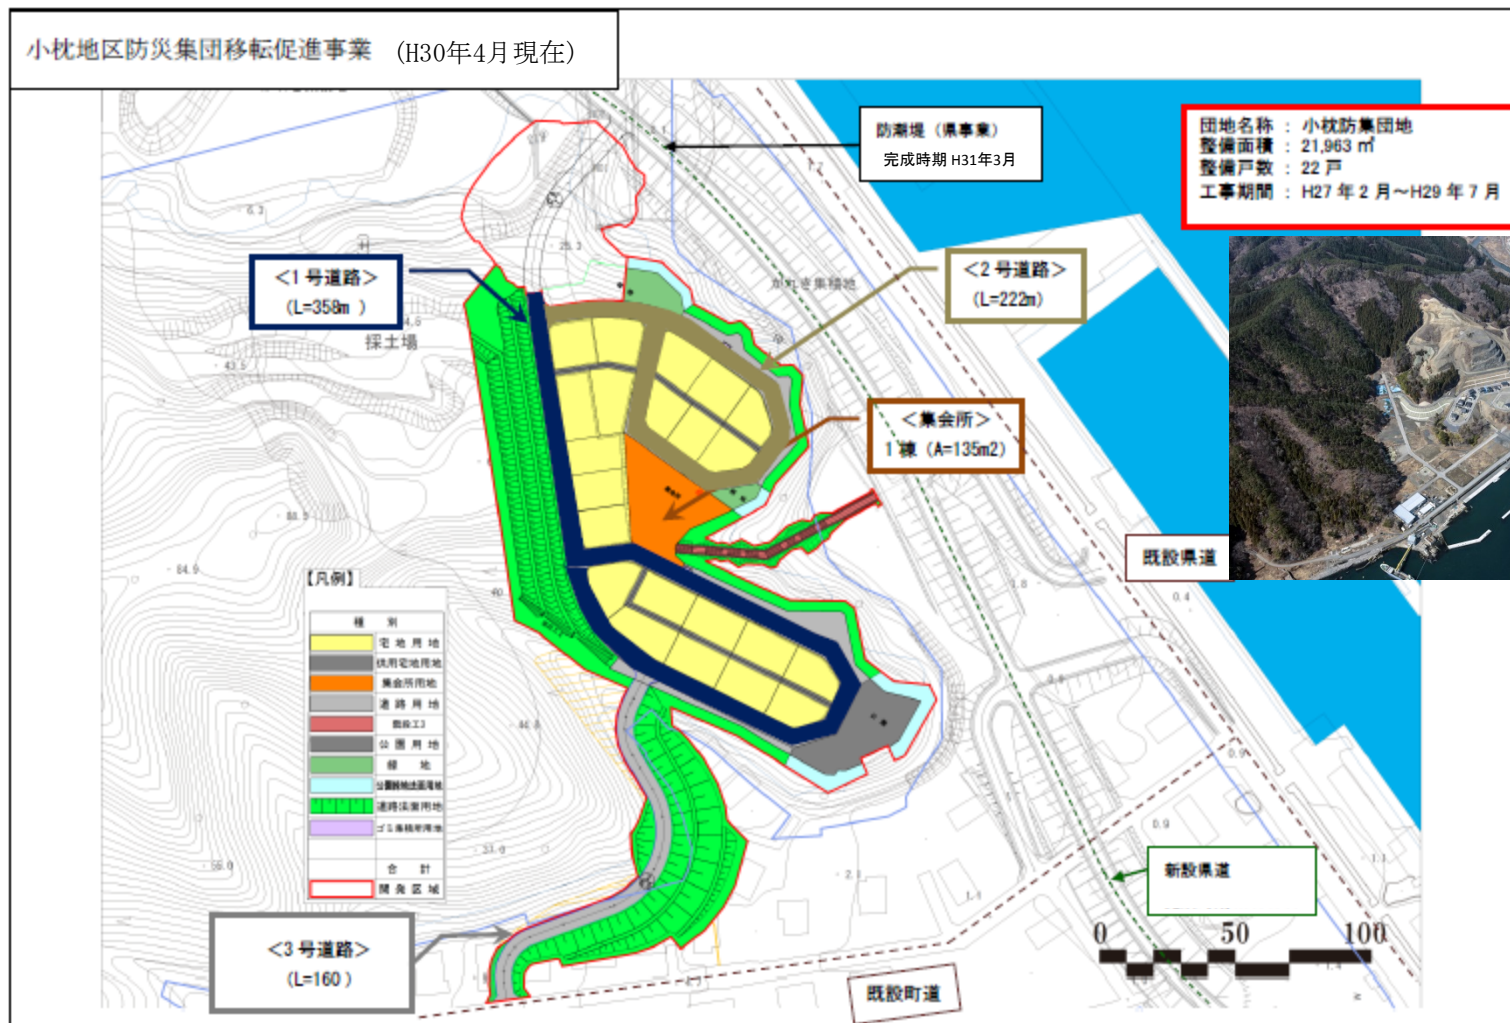


➤小枕団地の引渡:平成28年12月22日

TP:20.2m

(3) 災害公営住宅

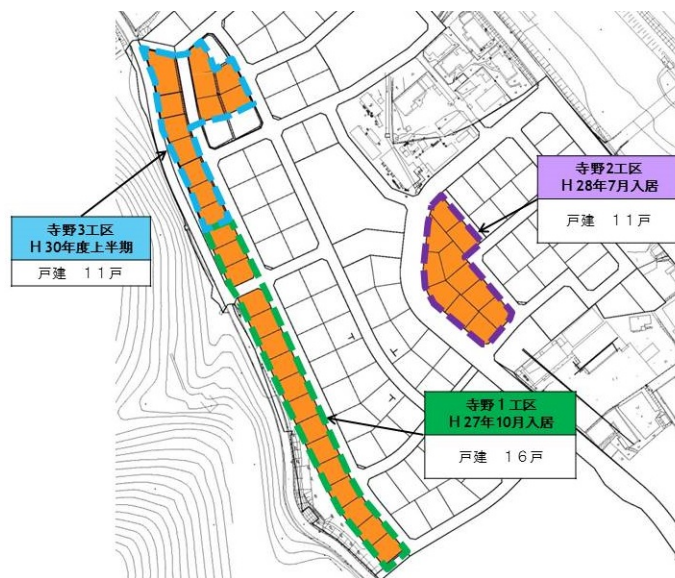

寺野地区

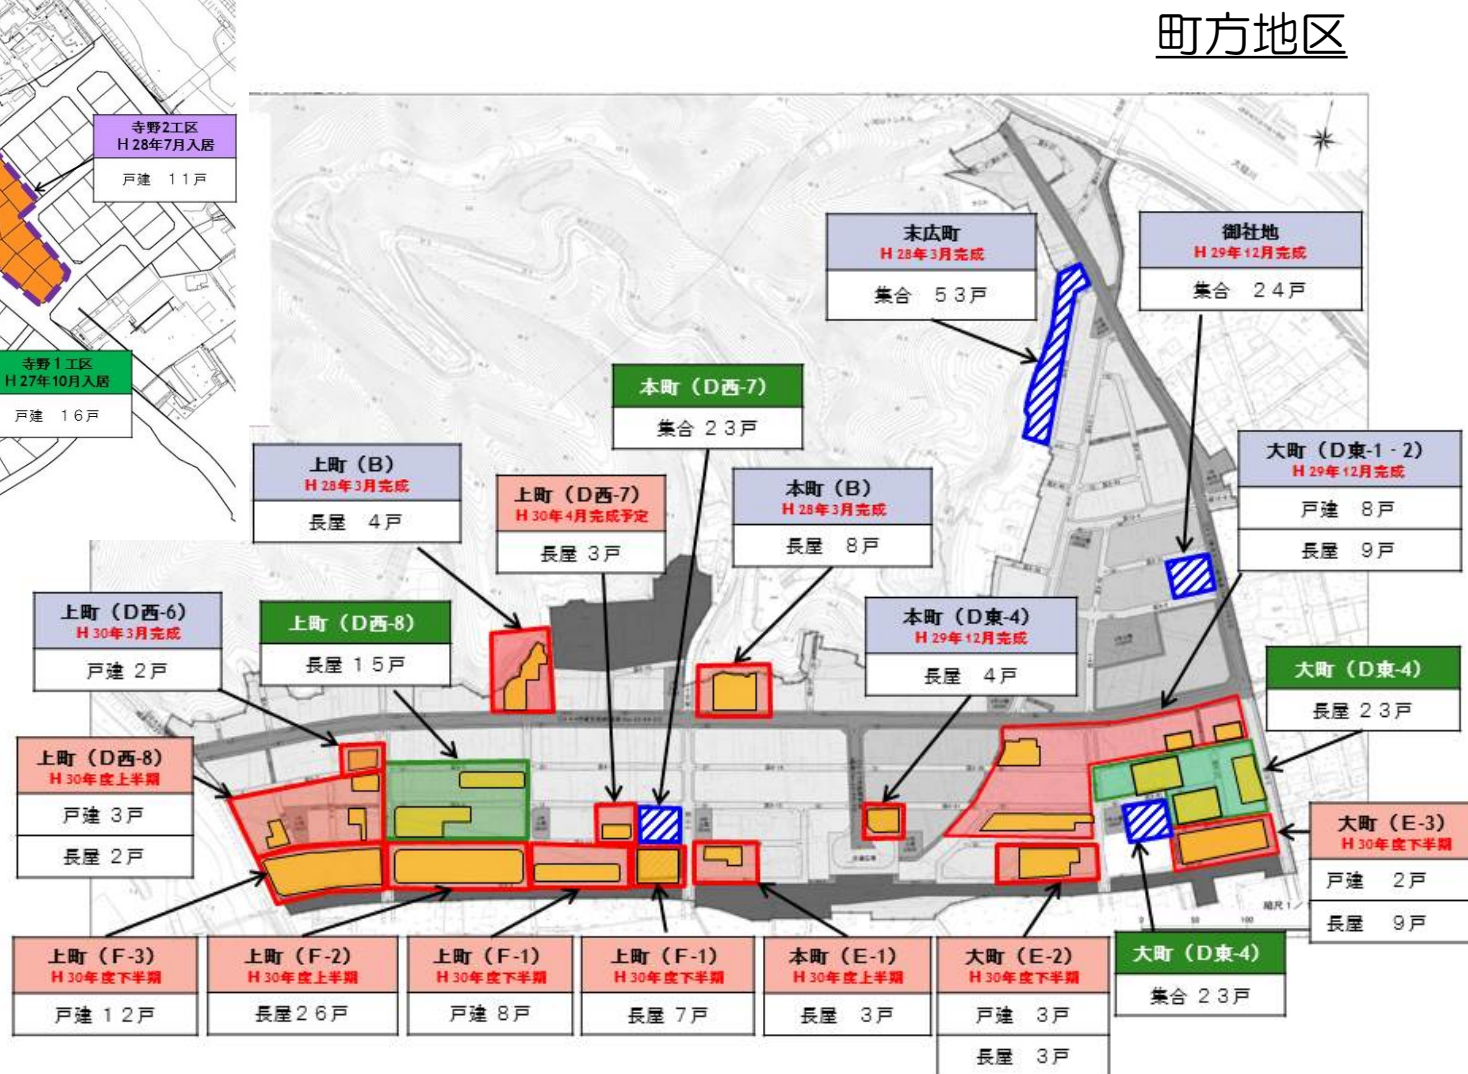



(4) 津波復興拠点整備事業




町方地区津波復興拠点整備事業(4.4ha)

- 先行街区においては、平成25年11月に造成工事が完成し、県道大槌小槌線沿いで営業していた店舗などが仮設店舗にて営業中。
- A-E区画においては、平成26年12月に造成工事が概ね完成し、23事業者の入居が決定。平成30年4月現在、20事業者が営業を開始している。


2. 安渡地域

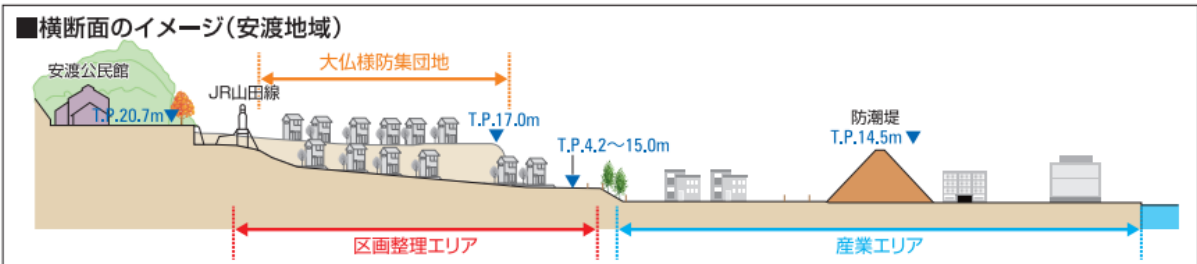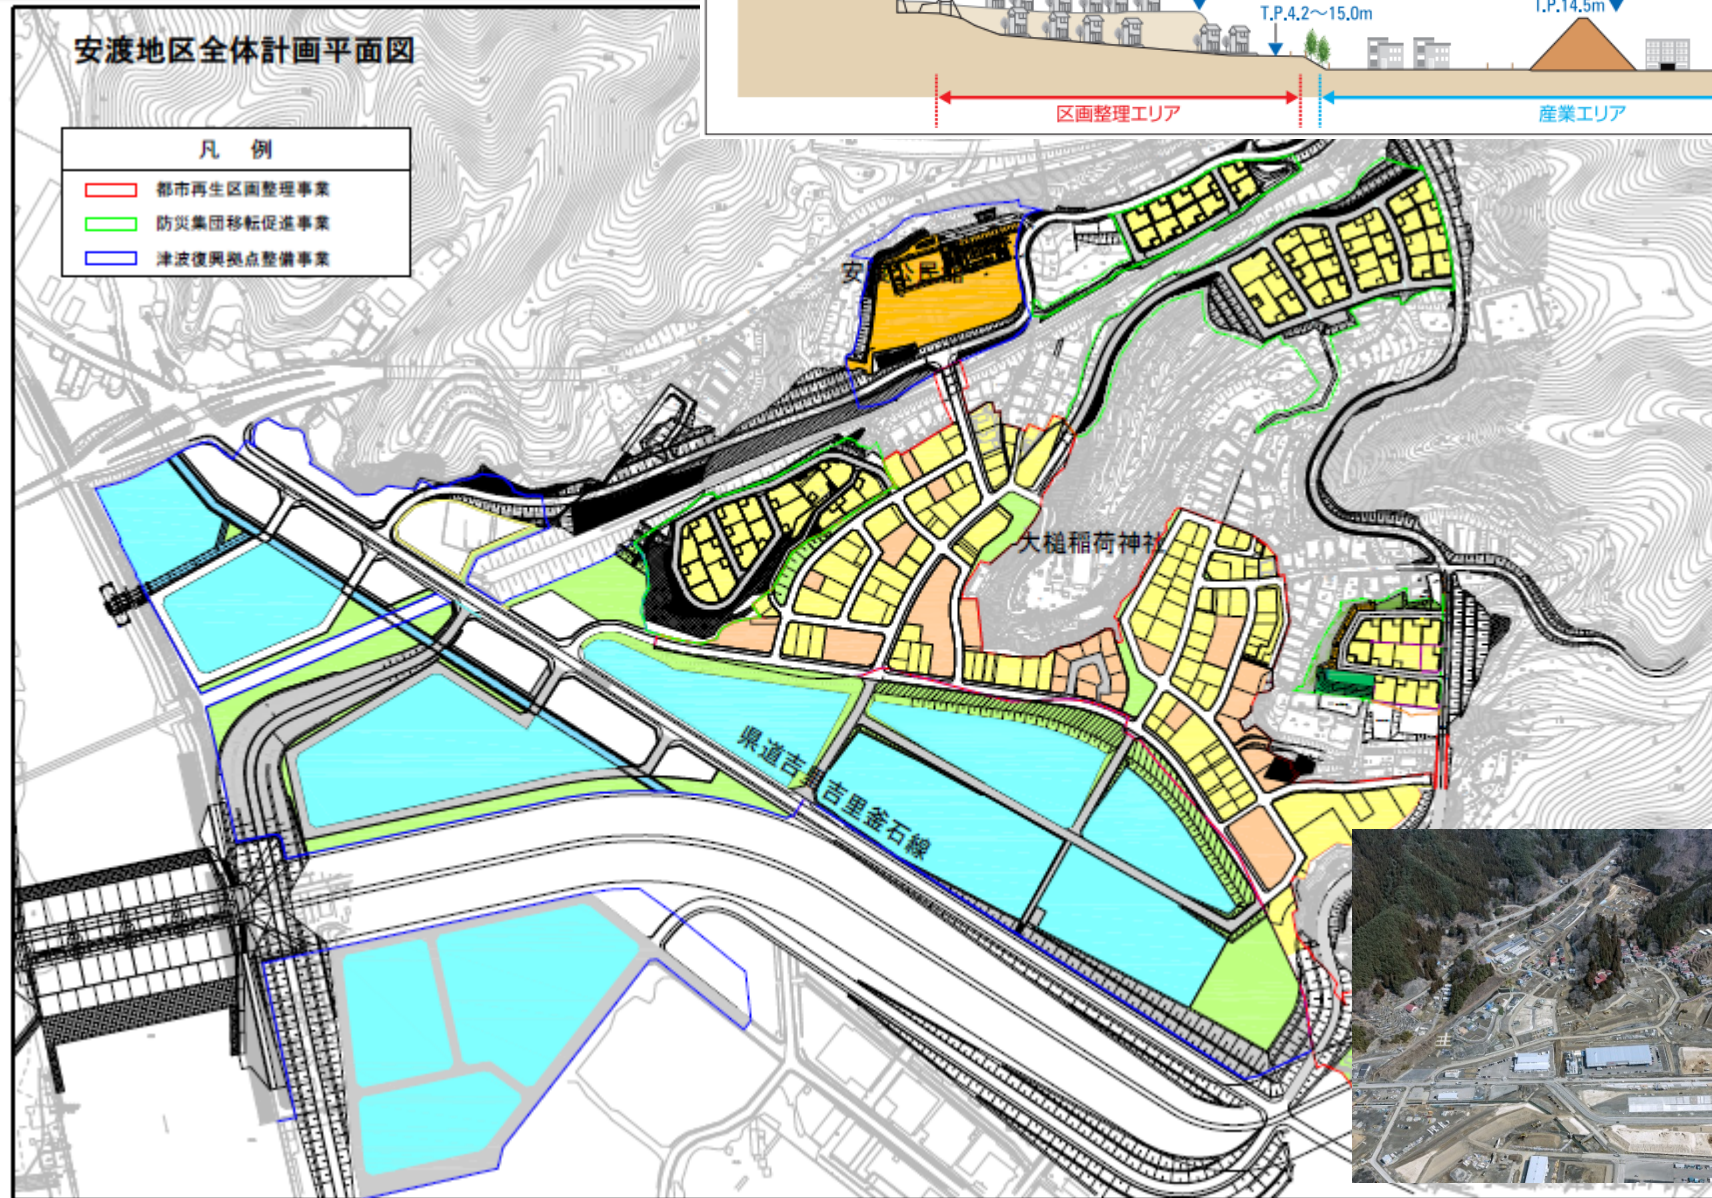


2. 安渡地域 (1) 土地区画整理事業

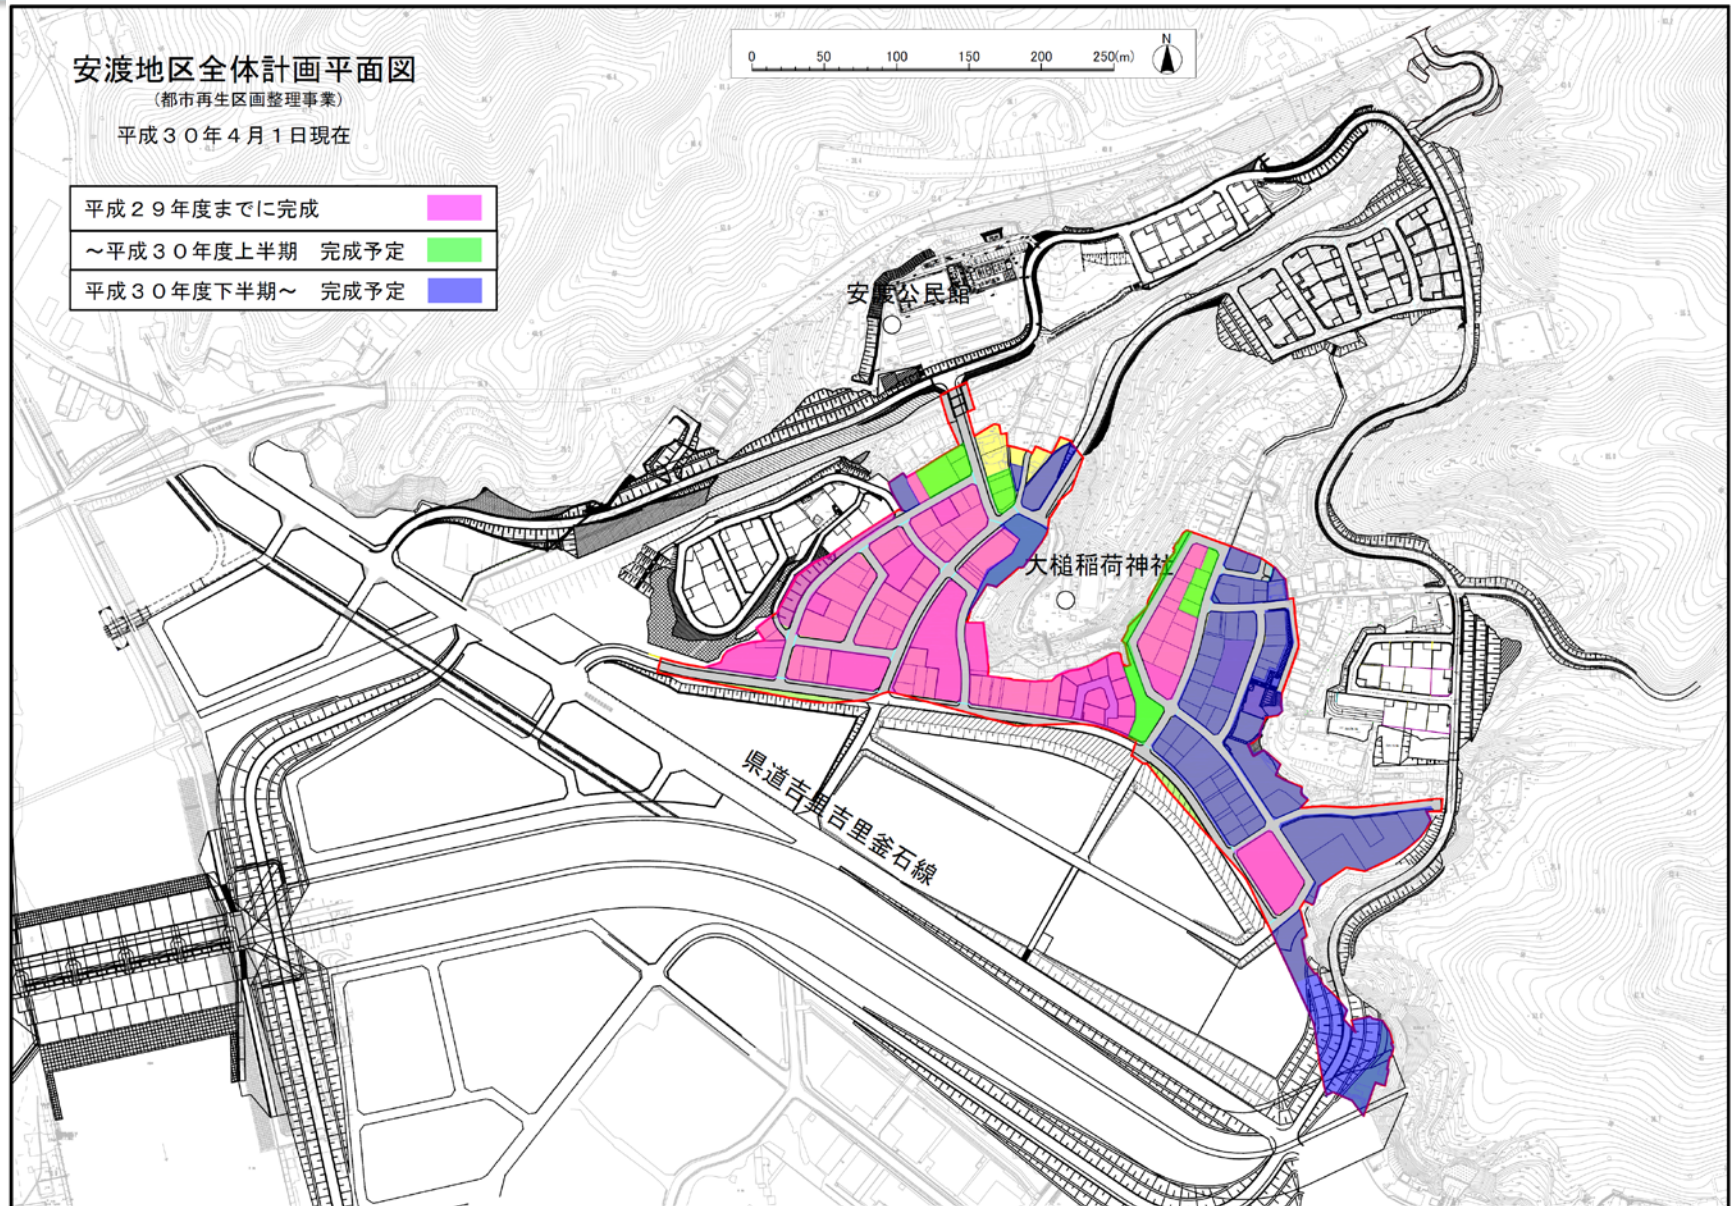

(2) 防災集団移転促進事業

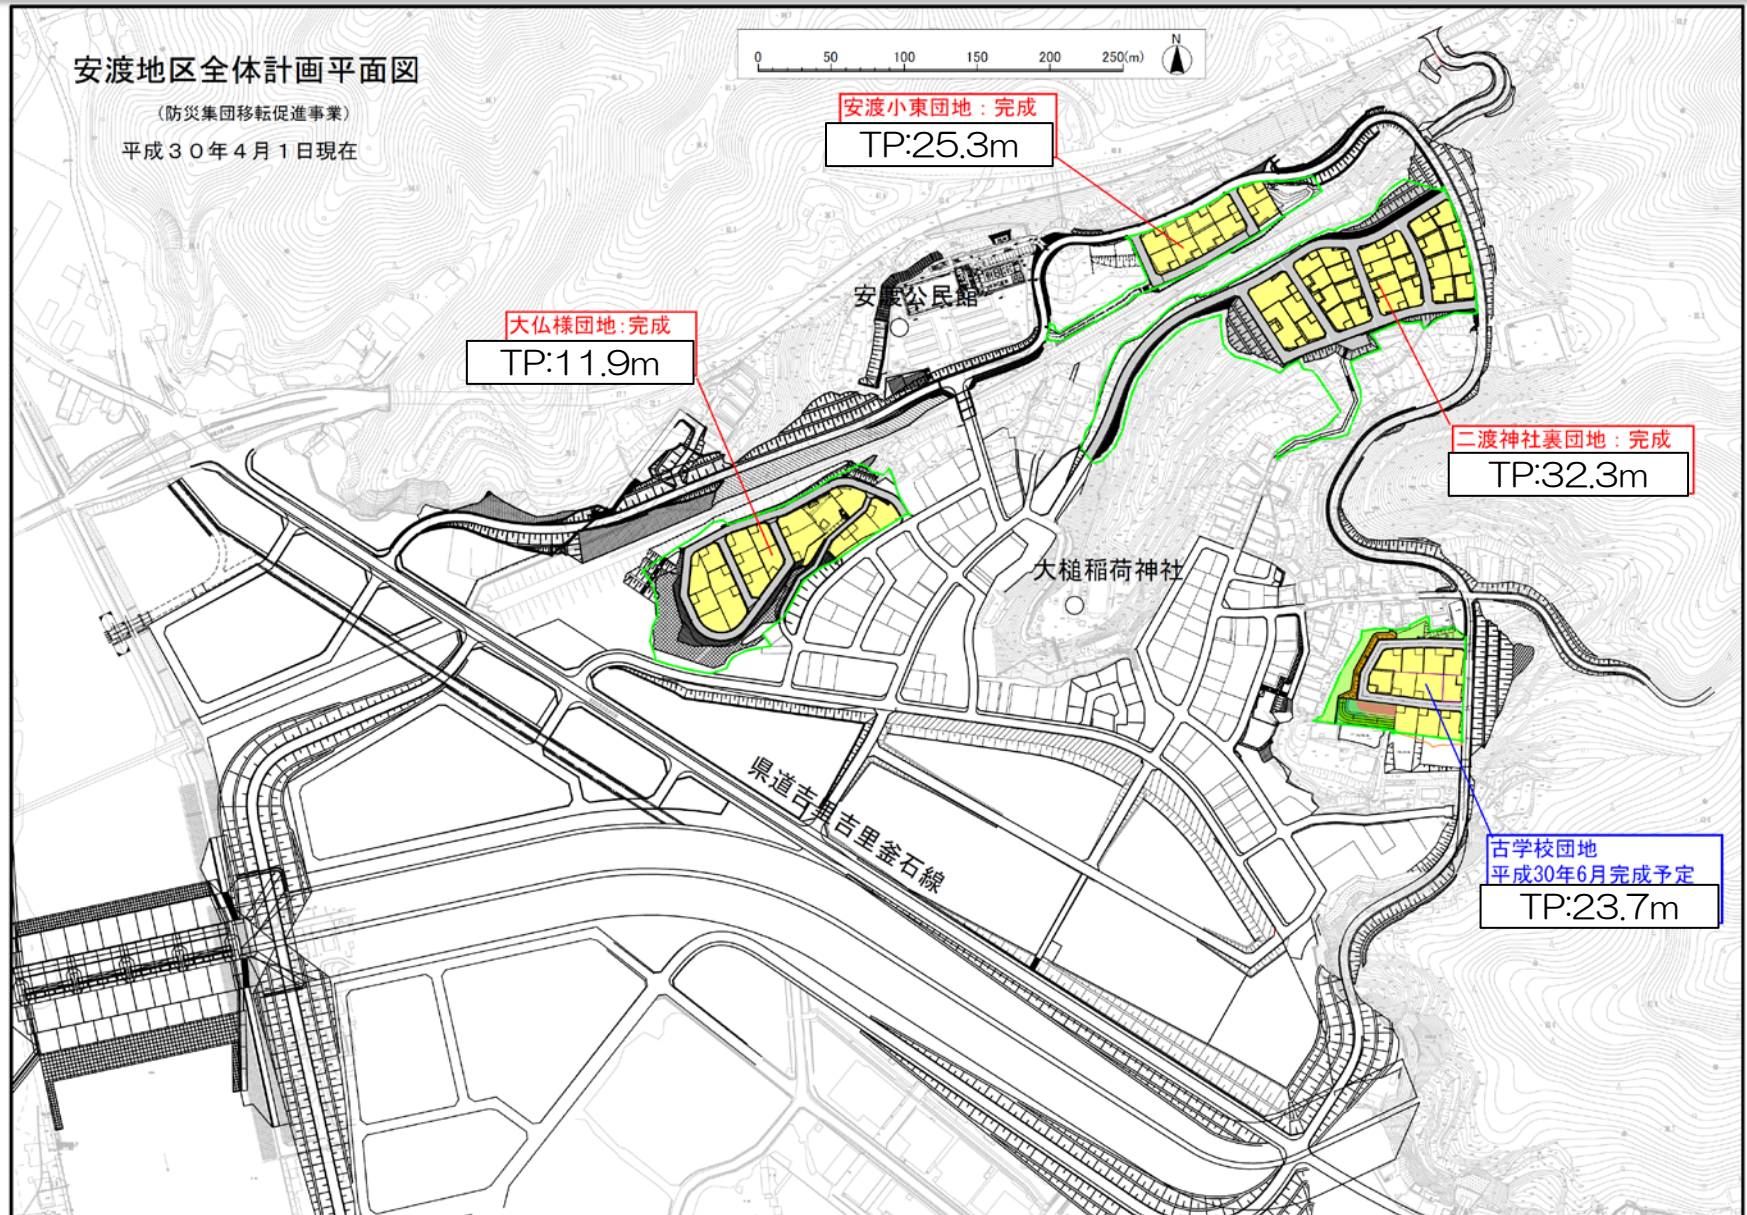


(3) 災害公営住宅

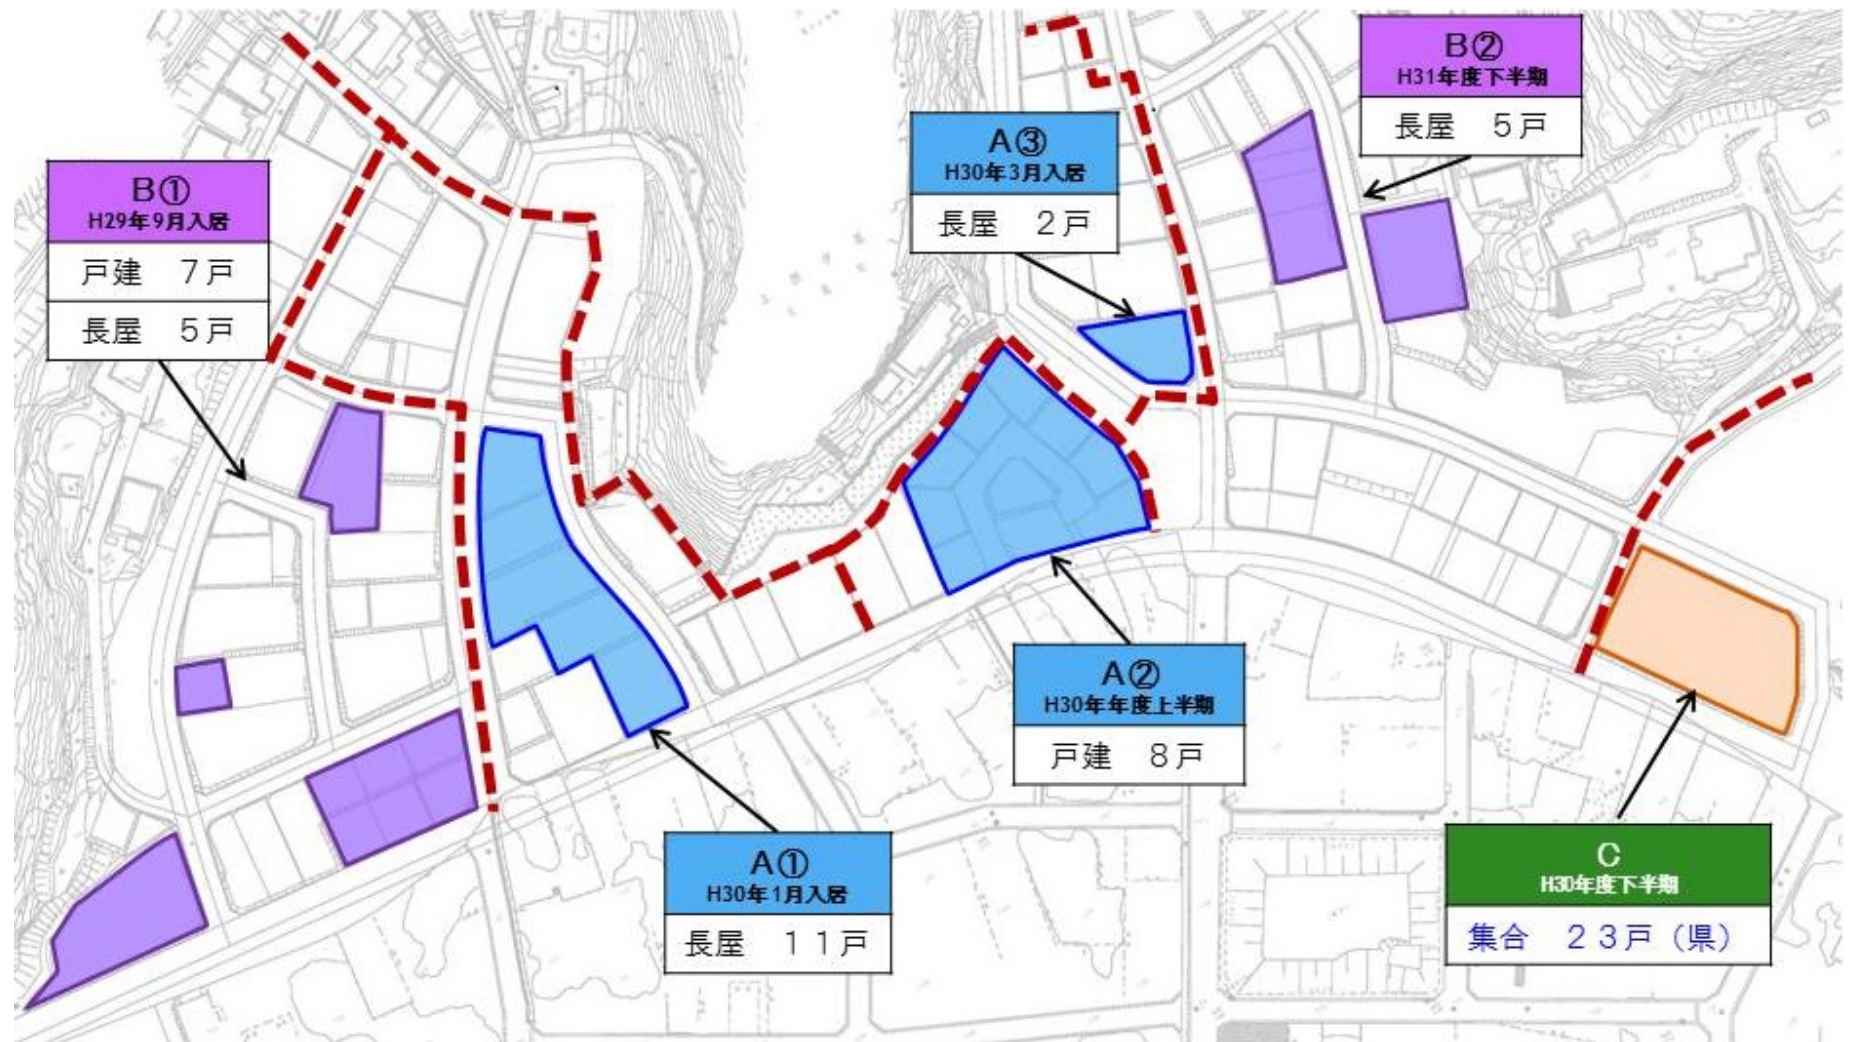

※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期


(4) 津波復興拠点整備事業

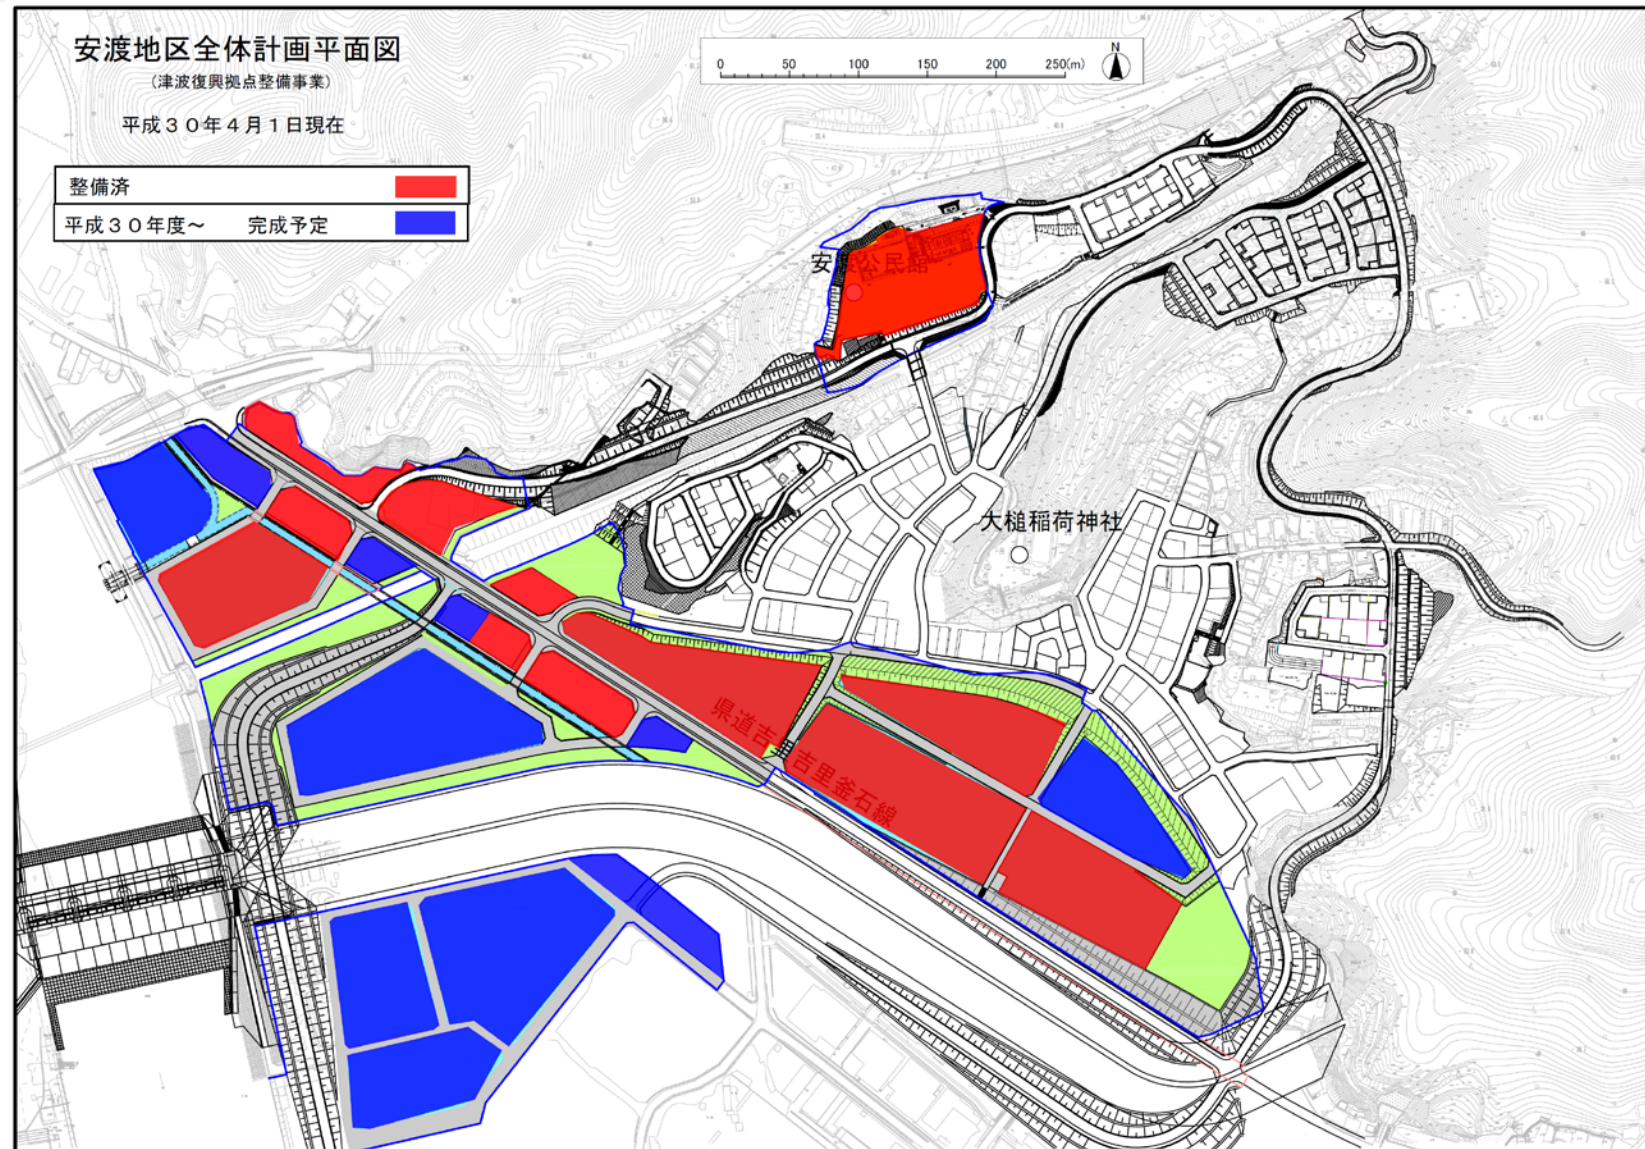


安渡地区津波復興拠点事業(19.6ha)

3. 赤浜地域 (1)土地区画整理事業 (2)防災集団移転促進事業 (3)漁業集落防災機能強化事業

赤浜地区 施工展開図
(平成30年4月1日現在)

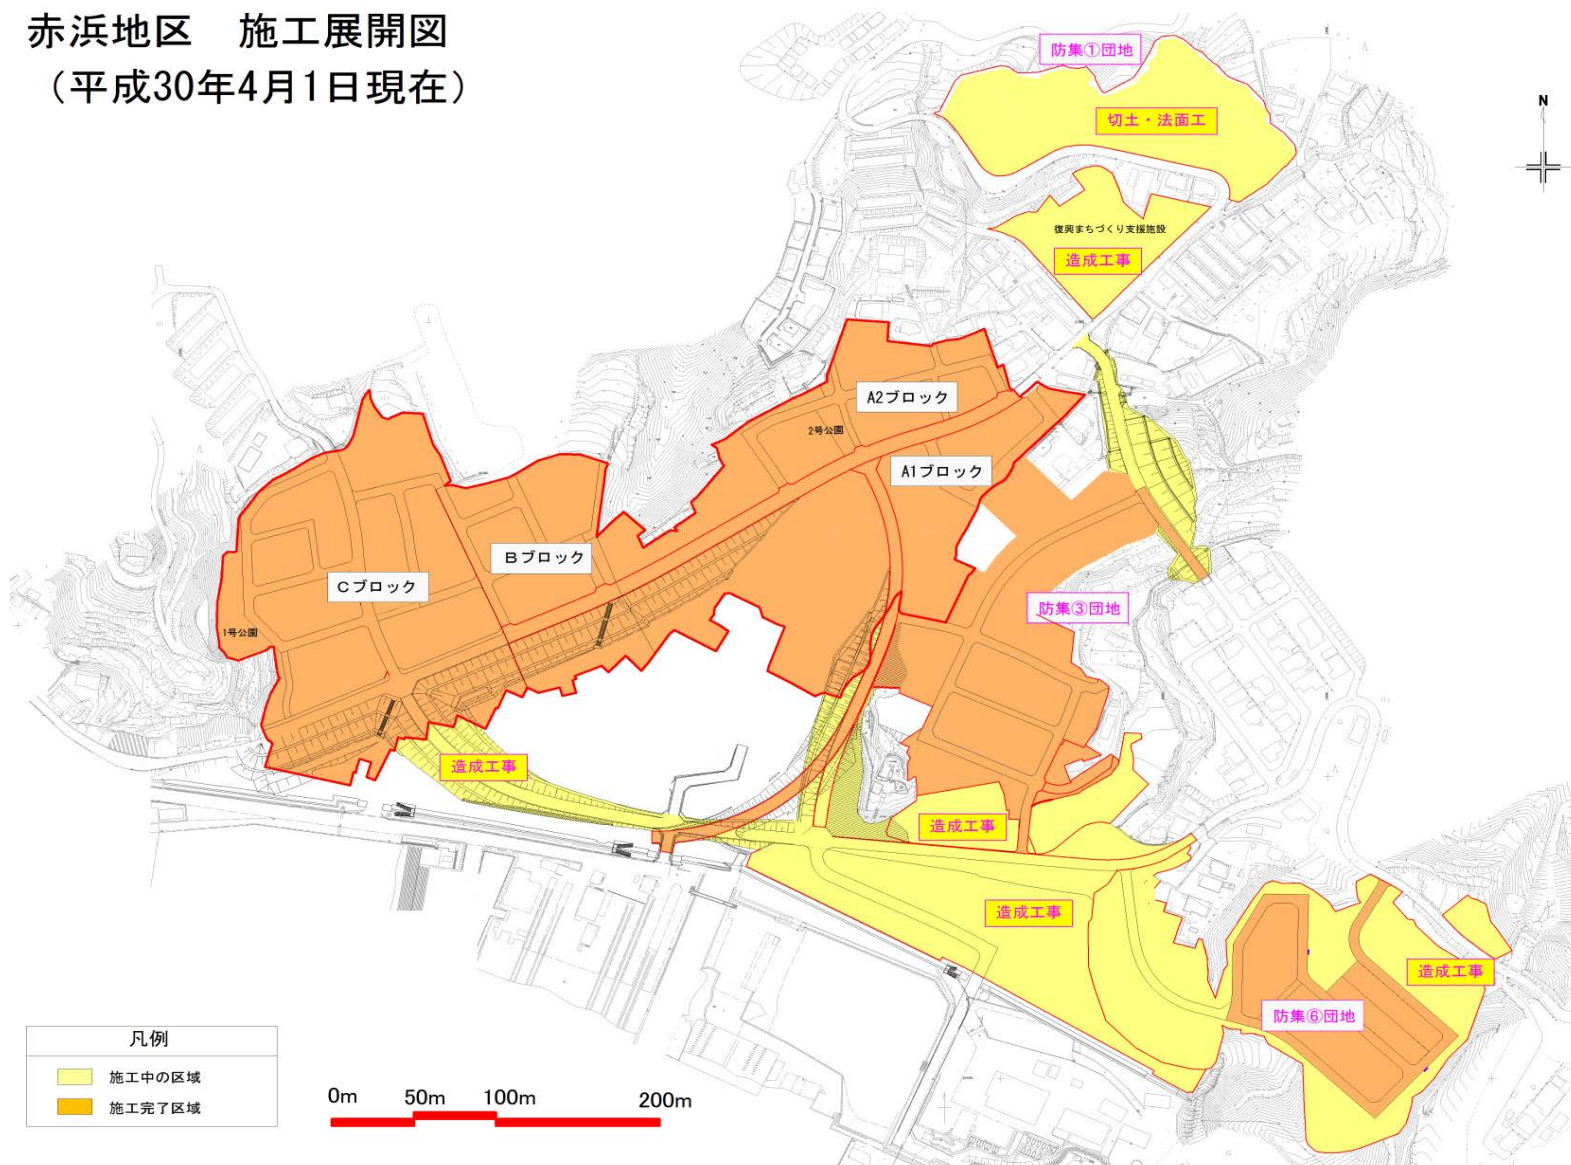


(2)防災集団移転促進事業

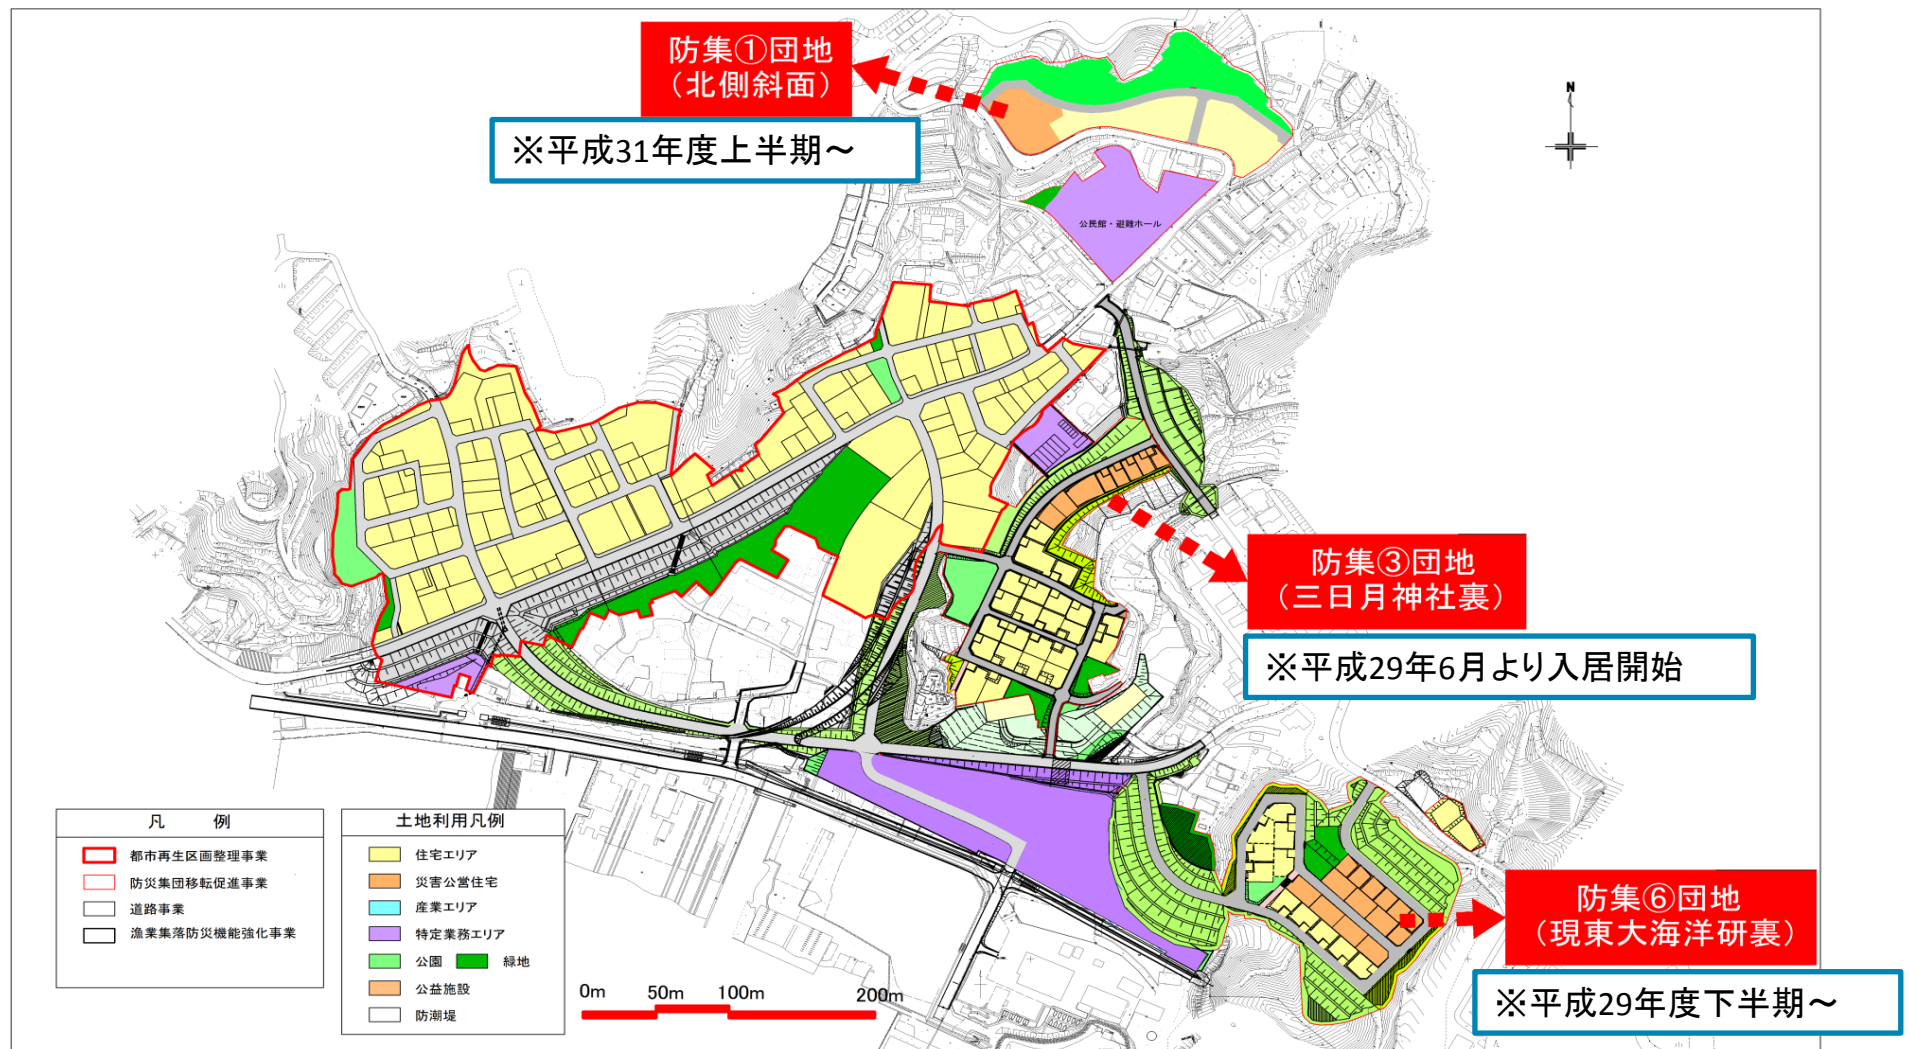


※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

(4) 災害公営住宅

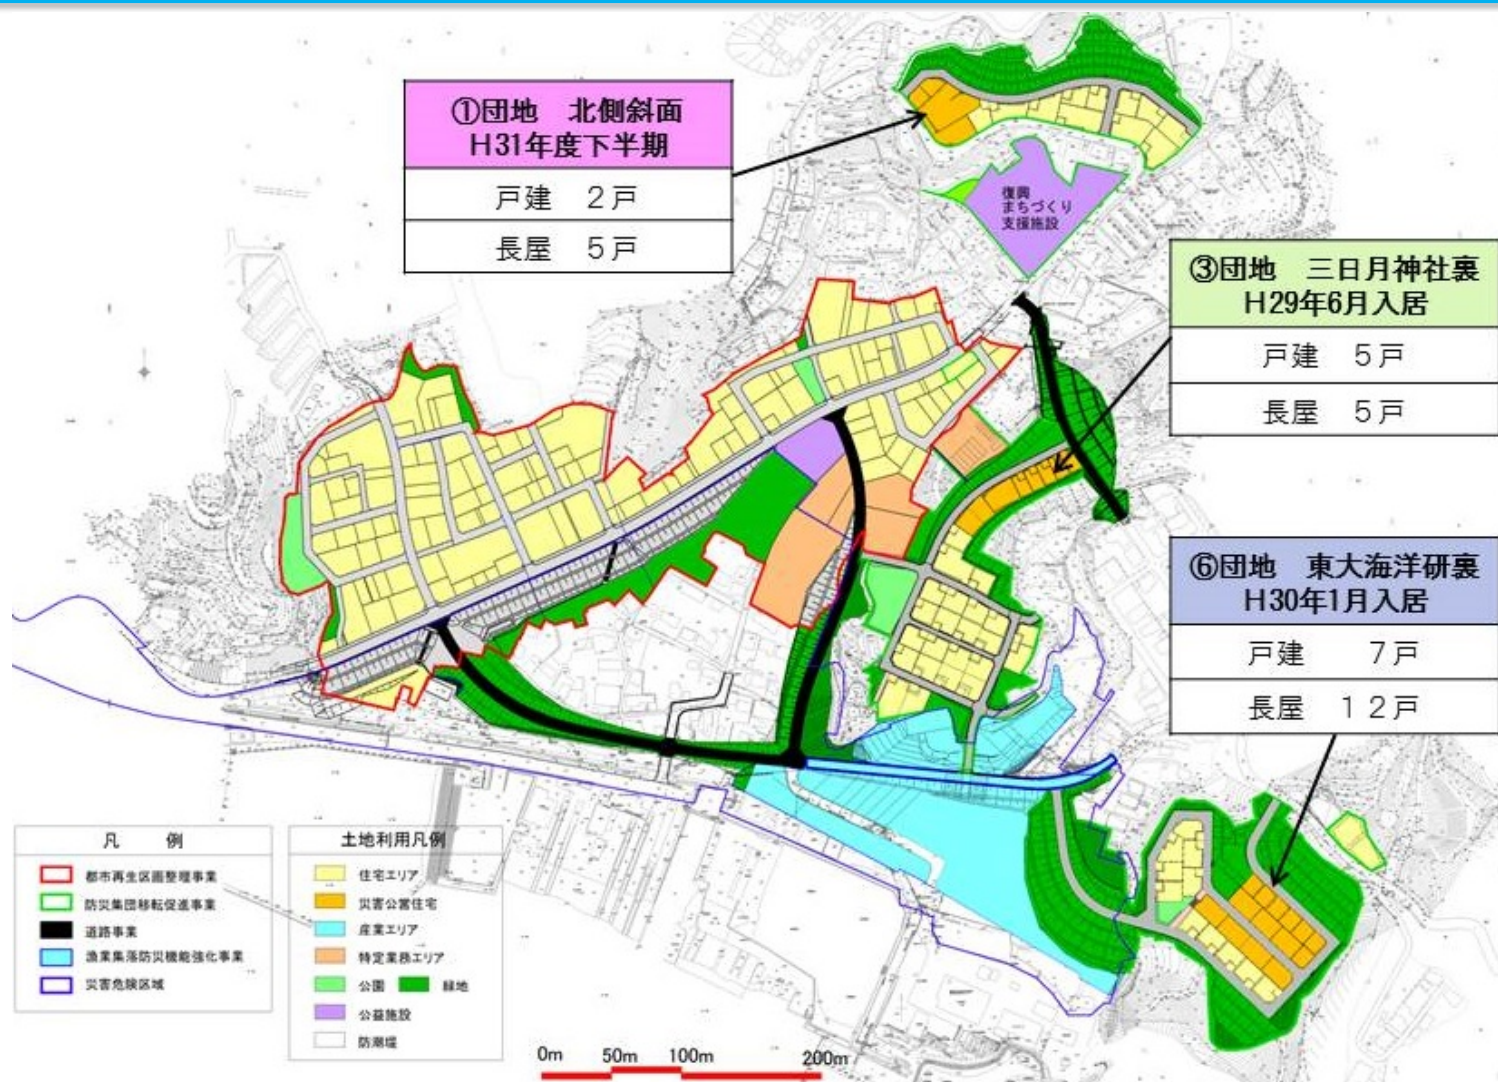


※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

4. 吉里吉里地域

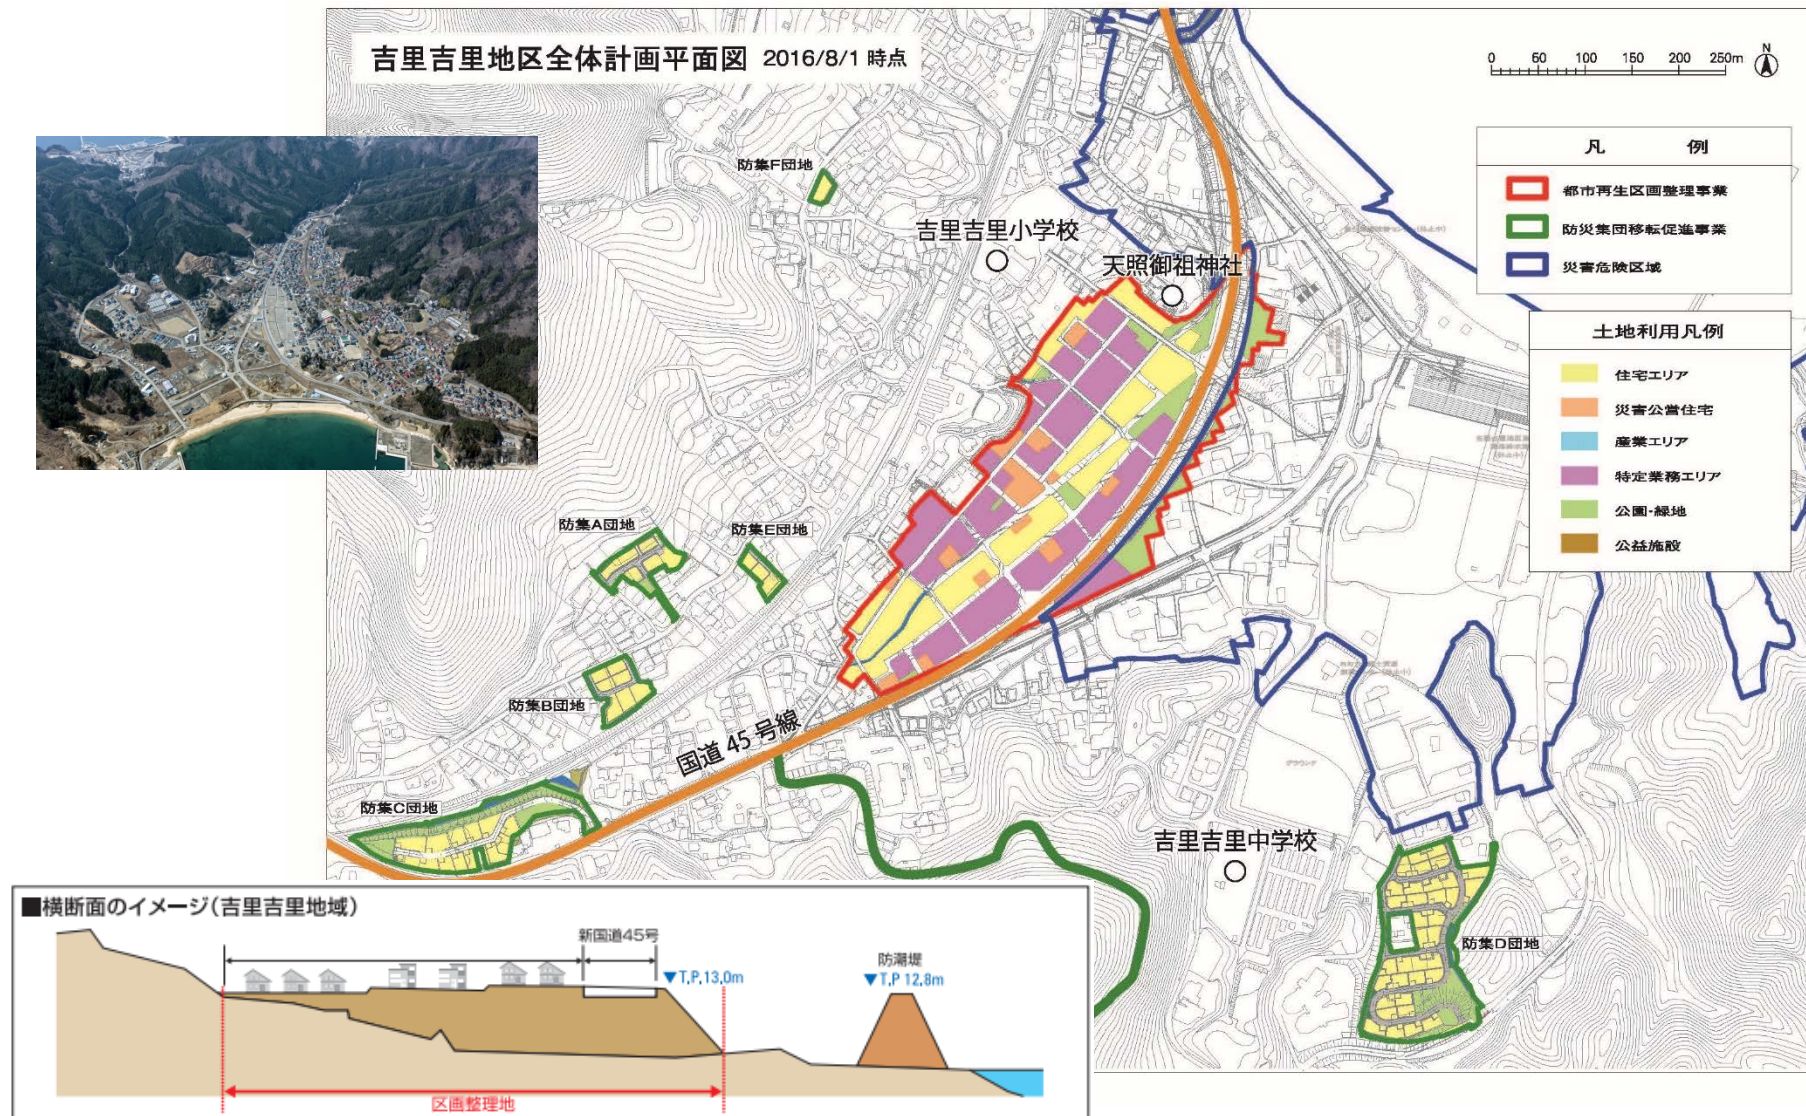


4. 吉里吉里地域 (1) 土地区画整理事業

平成29年10月1日現在

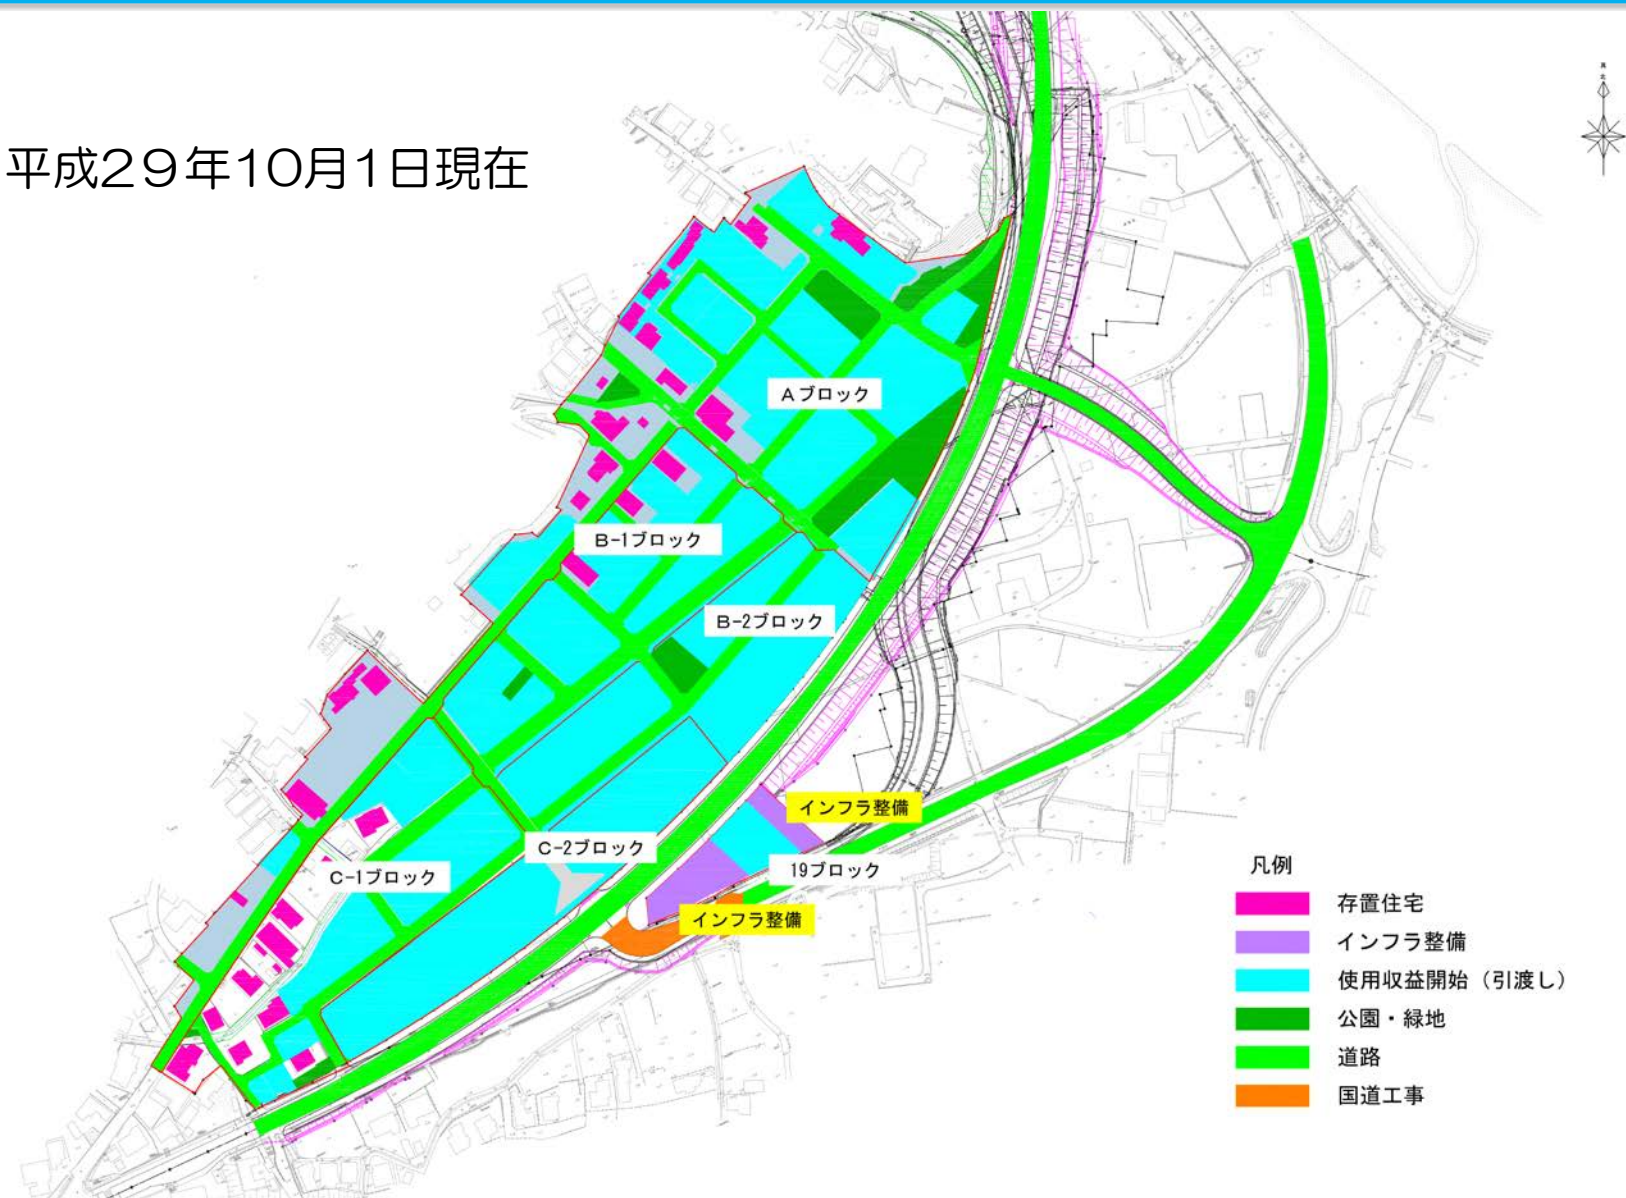


➤ 引き続き整備完了したブロック(仮換地)より使用収益開始(引渡し)予定

(2) 防災集団移転促進事業

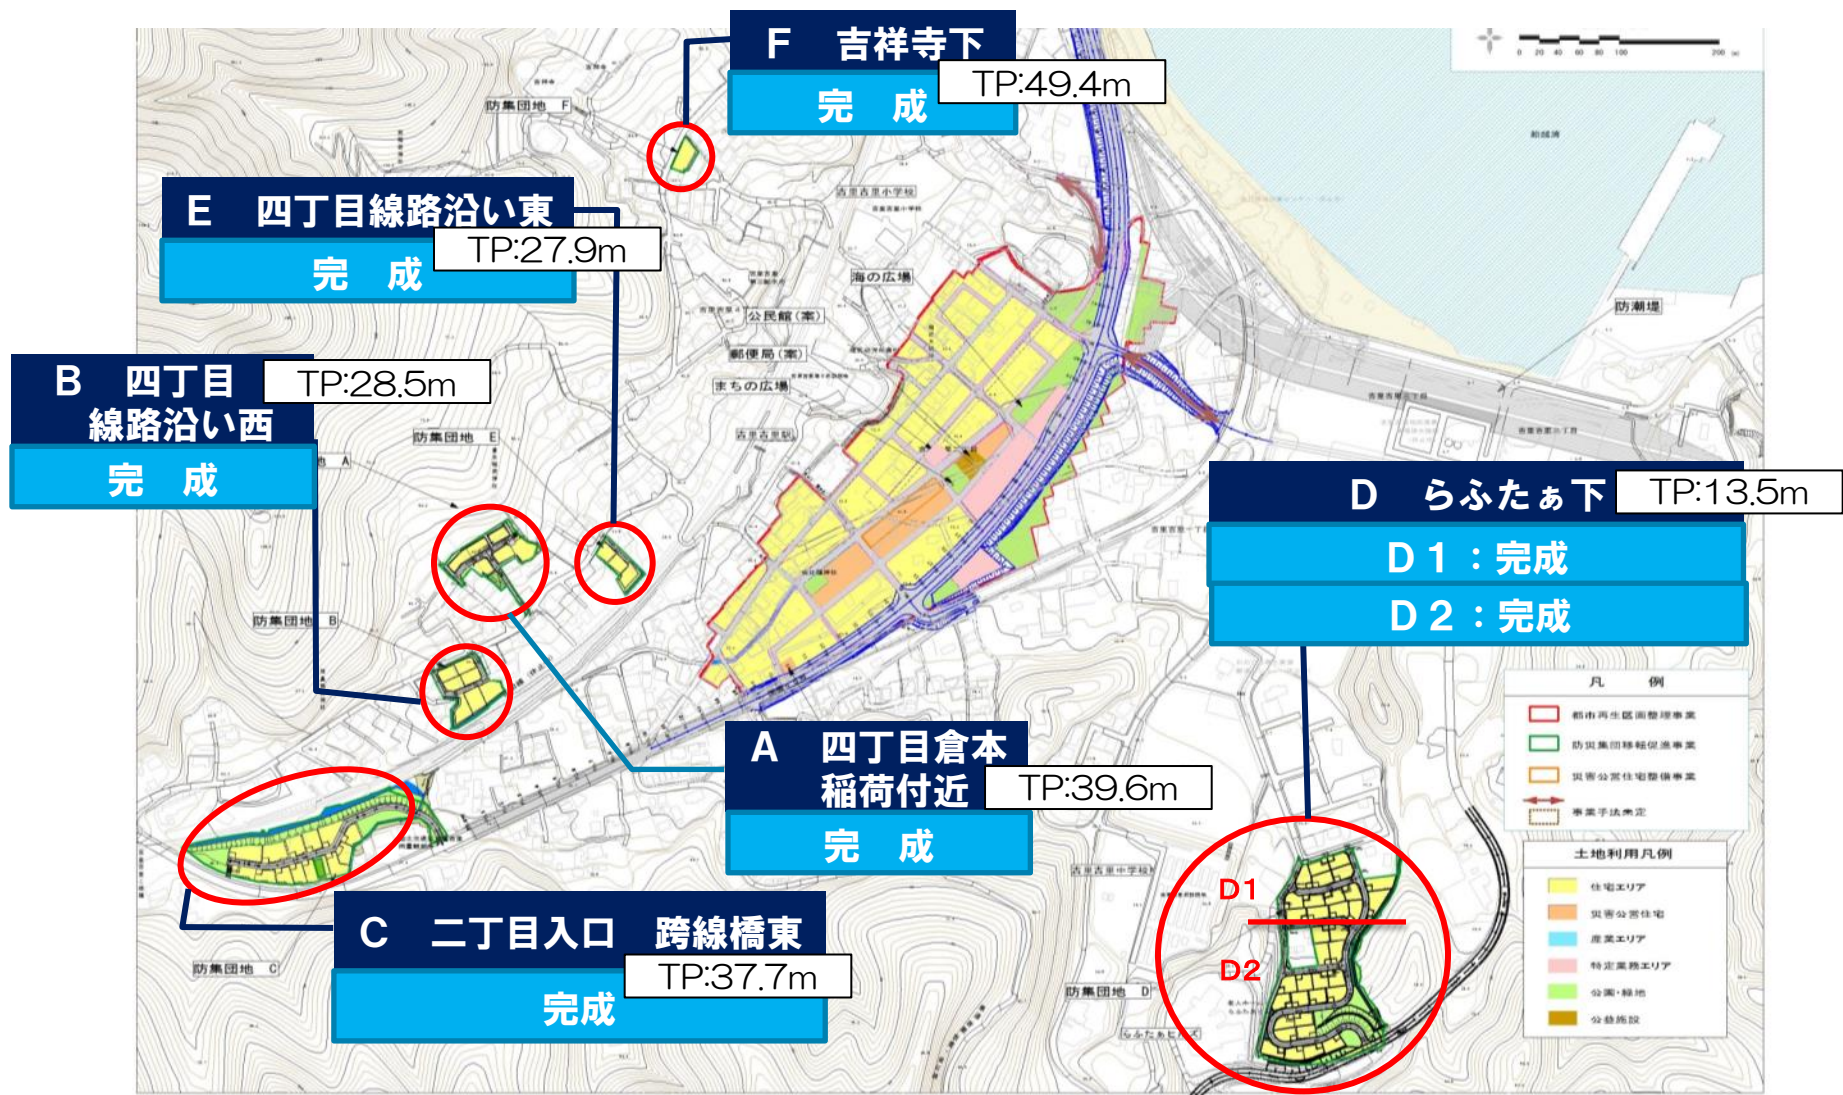


(3) 災害公営住宅

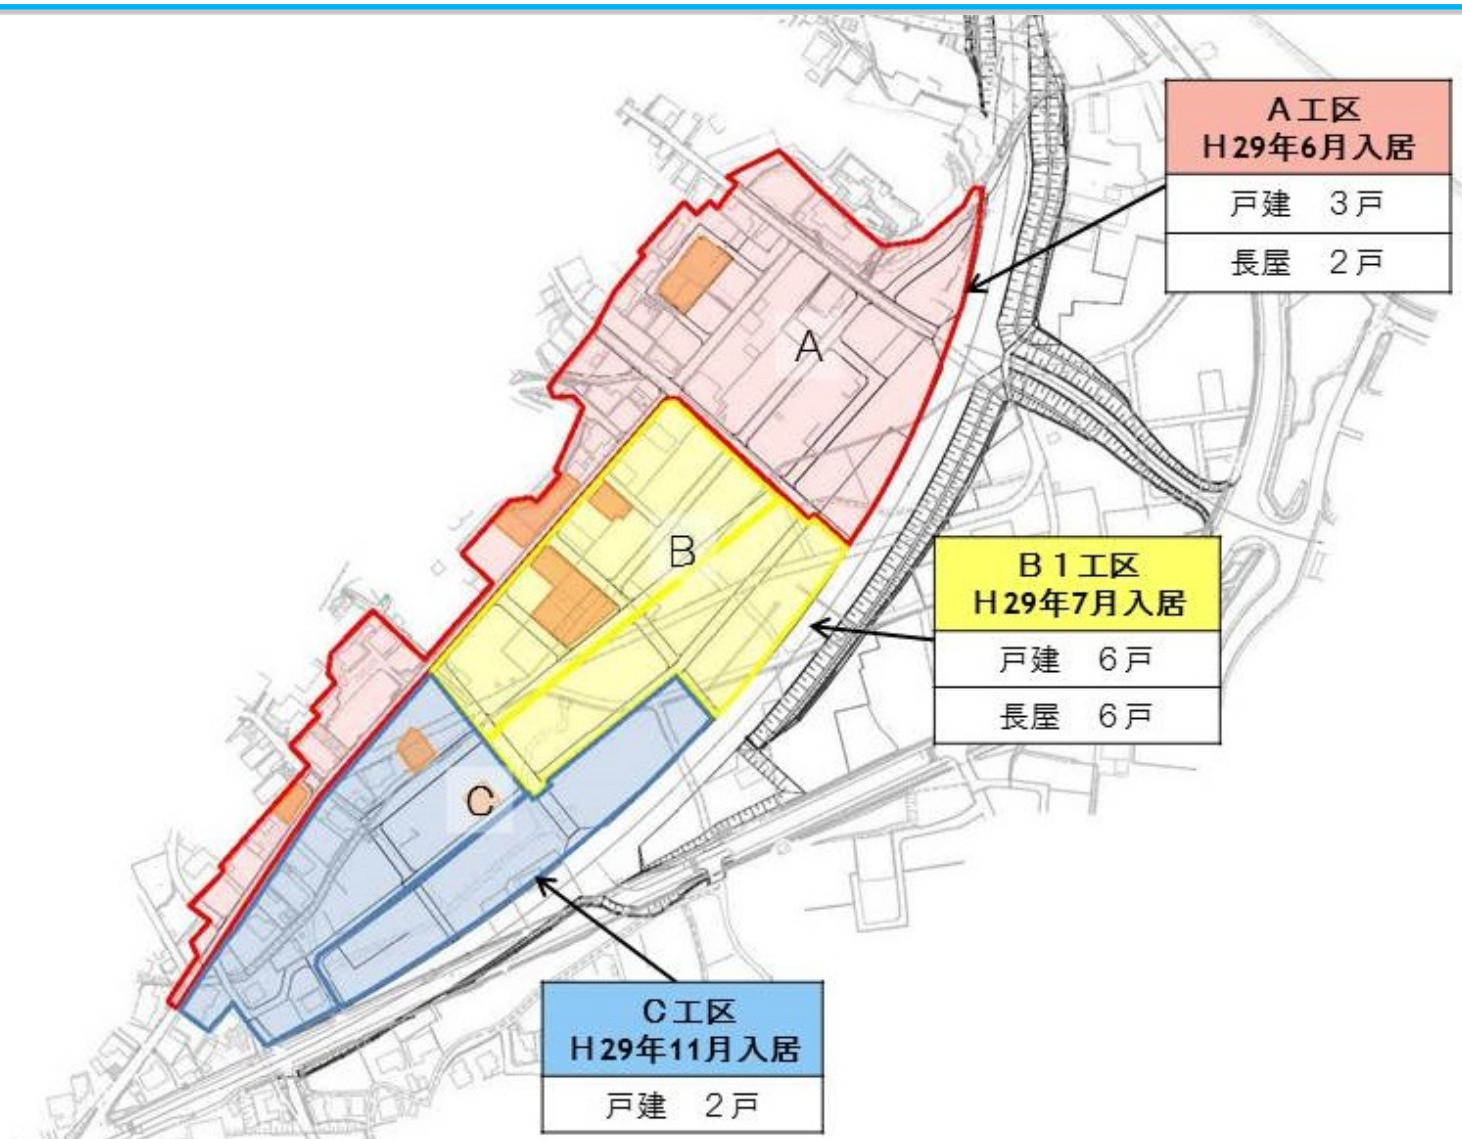


※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

5. 沢山地域 (1)整備状況

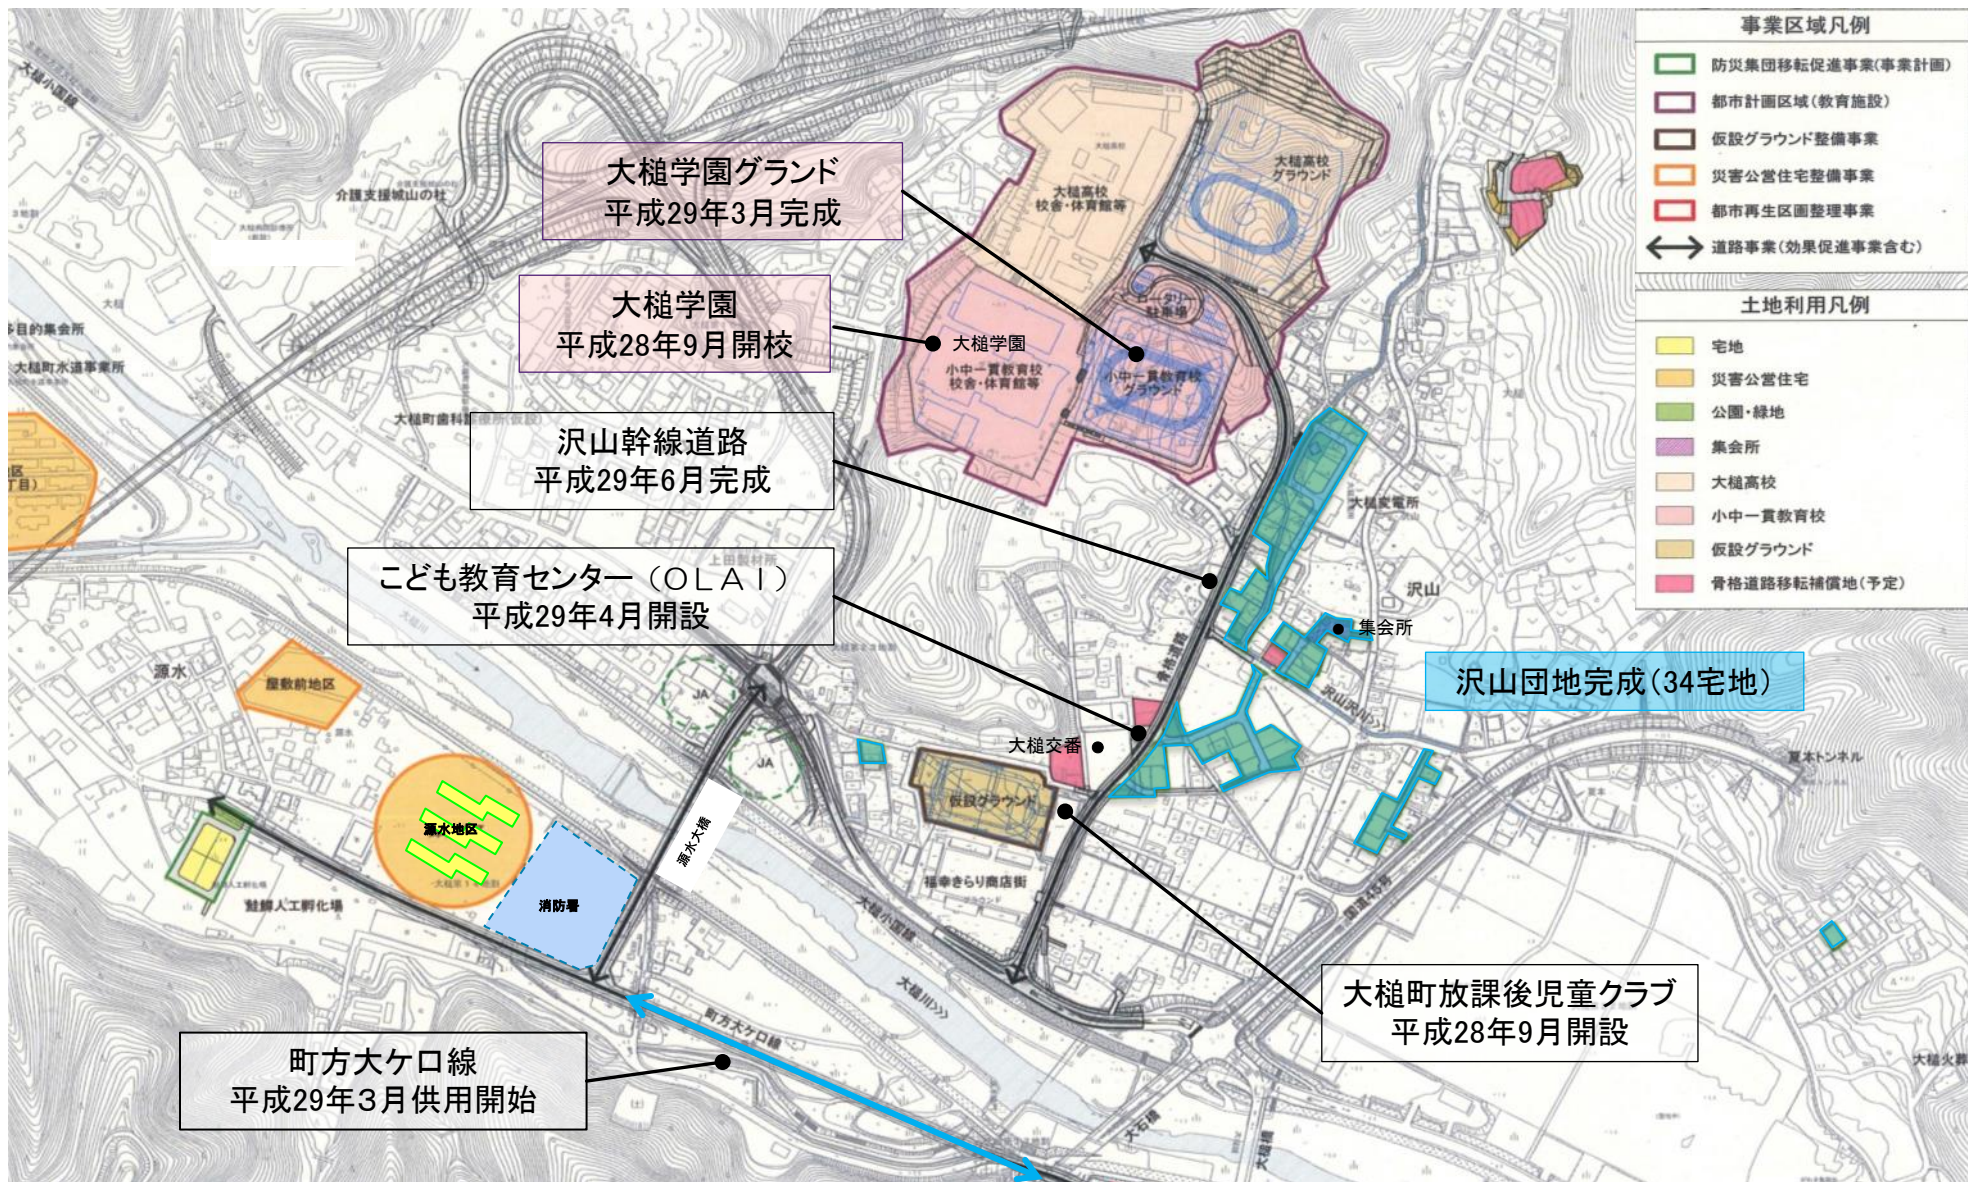

6. 浪板地域 (1)防災集団移転促進事業 (2)漁業集落防災機能強化事業 (3)災害公営住宅

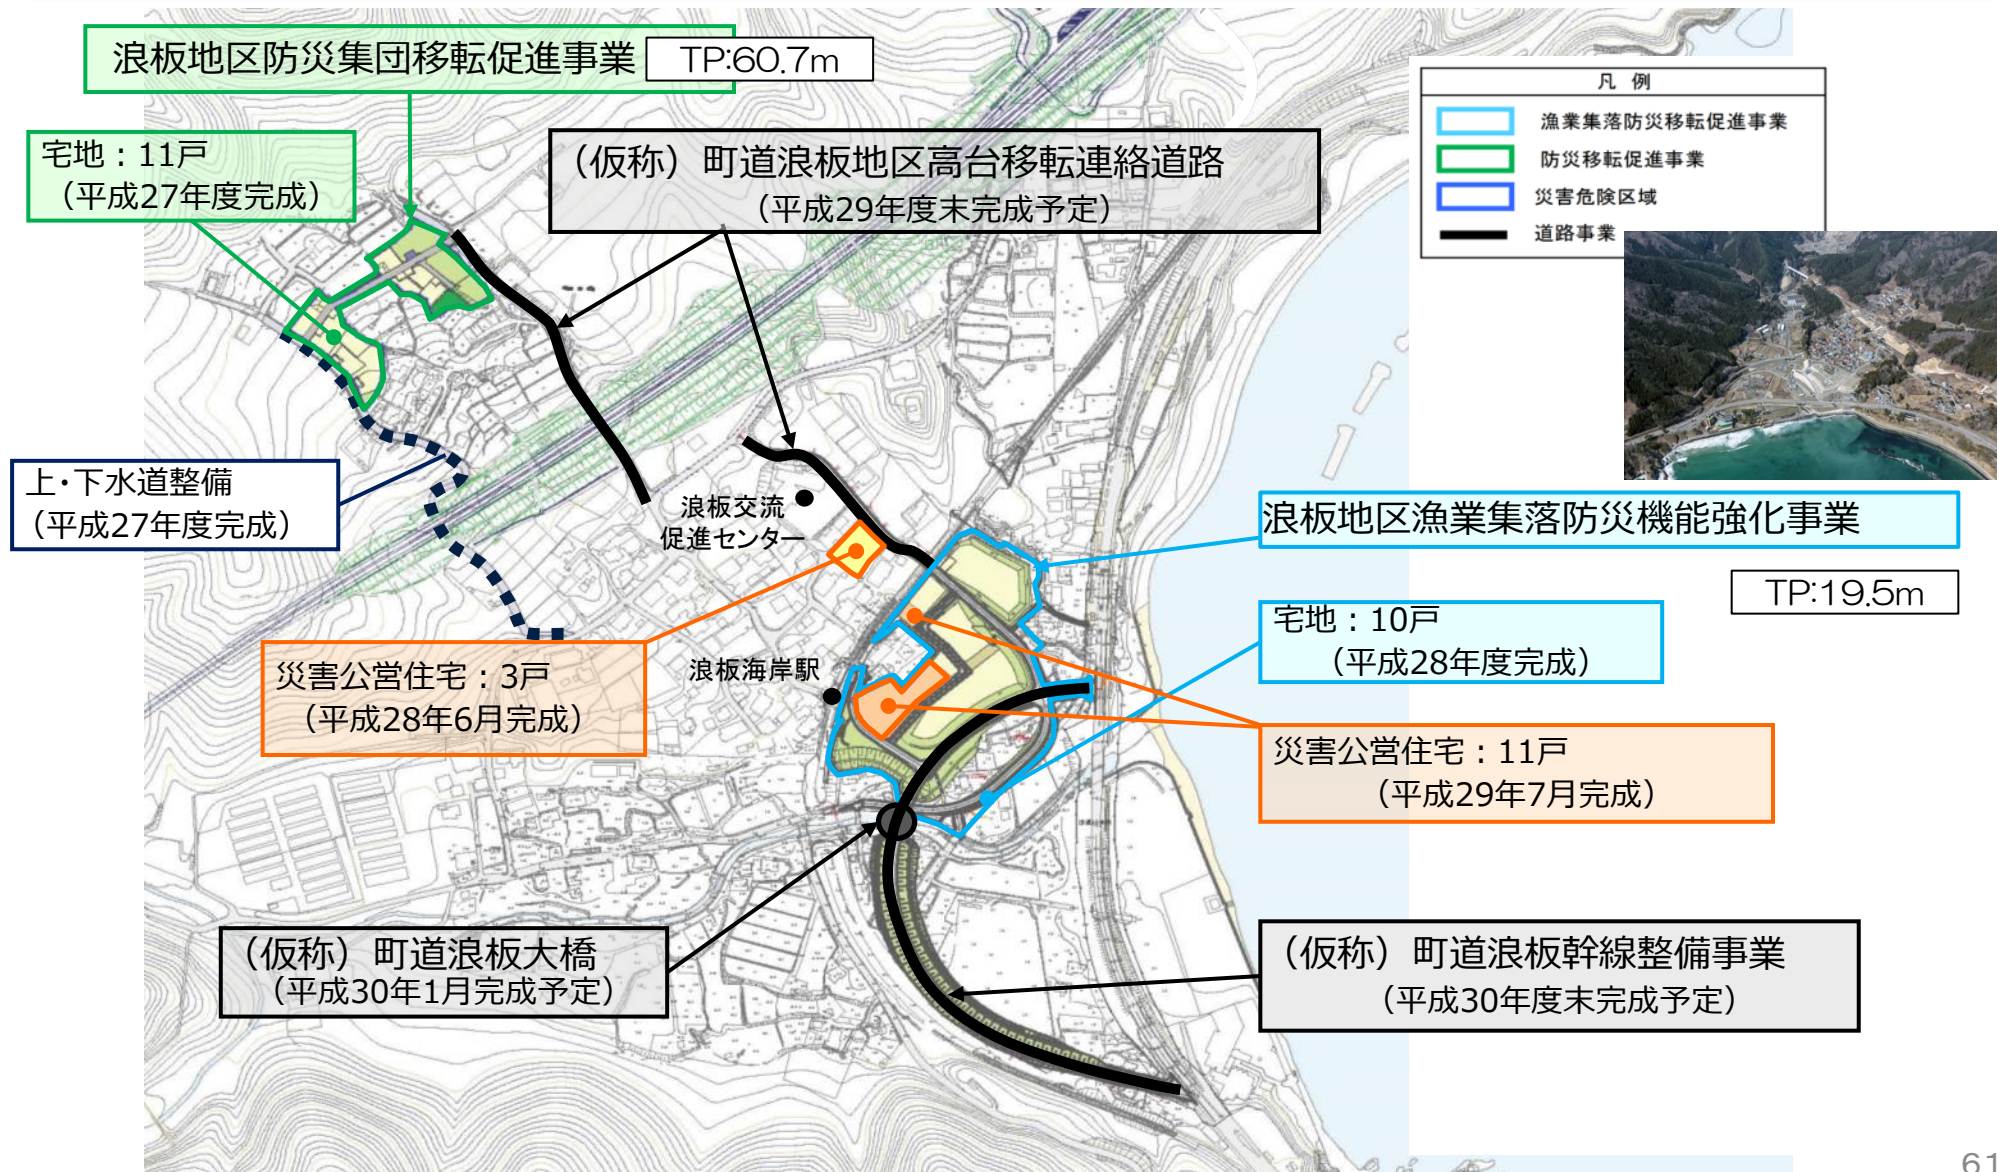

V 各事業の問い合わせ先

項目			部署	連絡先
大	中	小		
I 東日本大震災津波の概要				
	1	地震及び津波の概要	総務部危機管理室	Tel. 0193-42-8781
	2	被害の状況等	総務部危機管理室	Tel. 0193-42-8781
	3	町方地区の状況	総合政策部総合政策課	Tel. 0193-42-8724
II 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要				
III 復旧・復興の進捗状況				
	1	町民生活の状況	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
	(1)	人口及び世帯数の推移	民生部町民課	Tel. 0193-42-8713
	(2)	応急仮設住宅の設置状況	民生部コミュニティ総合支援室	Tel. 0193-42-8718
	(3)	町外避難者数等	民生部コミュニティ総合支援室	Tel. 0193-42-8718
		児童生徒数	教育委員会事務局学務課	Tel. 0193-42-6100
		生活保護受給者数	民生部保健福祉課	Tel. 0193-42-8715
	2	町の復旧・復興の状況		
	(1)	予算の状況	総務部財政課	Tel. 0193-42-8712
		復興交付金の推移	復興局復興推進課	Tel. 0193-42-8714
	(2)	復興事業の進捗状況～職員数の推移～	総務部総務課	Tel. 0193-42-8710
	(3)	復旧事業の進捗状況	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
	(4)	復興事業の進捗状況	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
	(5)	復興事業の進捗状況～災害公営住宅～	復興局住宅課	Tel. 0193-42-8719
	3	産業の状況		
	(1)	生業の状況	産業振興部商工観光課	Tel. 0193-42-8725
	(2)	水産業の状況	産業振興部農林水産課	Tel. 0193-42-8717
	4	公共施設の再建状況		
	(1)	消防署	総務部消防課(大槌消防署)	Tel. 0193-42-3121
	(2)	県立大槌病院	民生部保健福祉課	Tel. 0193-42-8715
	(3)	大槌学園	教育委員会事務局学務課	Tel. 0193-42-6100
	(4)	こども教育センター	教育委員会事務局学務課	Tel. 0193-42-6100
	(5)	公民館	教育委員会事務局生涯学習課	Tel. 0193-42-2300
	(6)	集会所	教育委員会事務局生涯学習課	Tel. 0193-42-2300
	(7)	避難路	総務部危機管理室	Tel. 0193-42-8781
	(8)	御社地エリア復興拠点施設	大槌町文化交流センター	Tel. 0193-27-5181
	(9)	大槌駅観光交流施設	総合政策部総合政策課	Tel. 0193-42-8724
	5	震災伝承		
	(1)	納骨堂	民生部町民課	Tel. 0193-42-8713
	(2)	デジタルアーカイブ	大槌町文化交流センター	Tel. 0193-27-5181
	(3)	生きた証	大槌町文化交流センター	Tel. 0193-27-5181

6 生活再建と支援			
(1)	地域復興協議会とコミュニティ協議会	総合政策部総合政策課 民生部コミュニティ総合支援室	Tel. 0193-42-8724 Tel. 0193-42-8718
(2)	自治会の設立状況と活動例	民生部コミュニティ総合支援室	Tel. 0193-42-8718
(3)	ボランティア数の推移	民生部保健福祉課	Tel. 0193-42-8715
7 スケジュール			
(1)	面整備	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(2)	災害公営住宅	復興局住宅課	Tel. 0193-42-8719
IV 各地区の土地利用の状況			
1 町方地域、小枕・伸松地域			
(1)	土地区画整理事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(3)	災害公営住宅	復興局住宅課	Tel. 0193-42-8719
(4)	津波復興拠点整備事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
2 安渡地域			
(1)	土地区画整理事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(3)	災害公営住宅	復興局住宅課	Tel. 0193-42-8719
(4)	津波復興拠点整備事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
3 赤浜地域			
(1)	土地区画整理事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(3)	漁業集落防災機能強化事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(4)	災害公営住宅	復興局住宅課	Tel. 0193-42-8719
4 吉里吉里地域			
(1)	土地区画整理事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
(3)	災害公営住宅	復興局住宅課	Tel. 0193-42-8719
5 沢山地域			
(1)	整備状況	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
6 浪板地域			
(1)	整備状況	復興局都市整備課	Tel. 0193-42-8723
V 各事業の問い合わせ先			
		総合政策部総合政策課	Tel. 0193-42-8724
