

大槌町復興レポート

平成29年10月1日

岩手県大槌町



目次

	スライド番号		スライド番号
I 東日本大震災津波の概要			
1 地震及び津波の概要	1	(4) 放課後こども教育センター	24
2 被害の状況等	3	(5) 公民館	25
3 町方地区の状況	3	(6) 集会所	25
		(7) 避難路	26
		(8) 御社地エリア復興拠点施設	27
II 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要	5	5 震災津波伝承	
		(1) 納骨堂	28
III 復旧・復興の進捗状況	7	(2) デジタルアーカイブ	29
町方地区を中心とした航空写真	8	(3) 生きた証	30
1 町民生活の状況	9	6 生活再建と支援	31
(1) 人口及び世帯数の推移	9	(1) 地域復興協議会とコミュニティ協議会	32
(2) 応急仮設住宅の設置状況	10	(2) 自治会の設立状況と活動例	32
(3) 町外避難者数等	12	(3) ボランティア数の推移	33
2 町の復旧・復興の状況	13	7 スケジュール	34
(1) 予算の状況	13	(1) 面整備	35
(2) 復興事業の進捗状況 ～職員数～	14	(2) 災害公営住宅	36
(3) 復旧事業の進捗状況	15		
(4) 復興事業の進捗状況	16	IV 各地区の土地利用の状況	
(4) 復興事業の進捗状況 ～災害公営住宅～	19	1 町方地域、小枕・伸松地域	37～42
3 産業の状況	20	2 安渡地域	43～47
(1) 生業の状況	20	3 赤浜地域	48～49
(2) 水産業の状況	21	4 吉里吉里地域	51～53
4 公共施設の再建状況	23	5 沢山地域	54
(1) 消防署	23	6 浪板地域	55
(2) 県立大槌病院	23		
(3) 大槌学園	24	V 各事業の問い合わせ先	56

I 東日本大震災津波の概要

1. 地震及び津波の概要

項目	東日本大震災津波
発生日時	平成23年3月11日(金) 14時46分頃
震央地名	三陸沖(北緯38.06.2度 東経142.51.6度)
震源の深さ	24km
規模	マグニチュード9.0(モーメントマグニチュード)
周辺の震度	震度6弱(釜石市)
津波	3月11日 14時49分 大津波警報発表 3月12日 20時20分 津波警報 3月13日 7時30分 津波注意報に切替 3月13日 17時58分 津波注意報解除 ※津波の最大波 表1-1
津波浸水高	表1-2
津波痕跡高	痕跡高最大13.7m(安渡)
浸水面積	4平方キロメートル(住宅・市街地面積の52%)


表1-1

調査地域	最大波
釜石	15時21分 4.2m以上
宮古	15時26分 8.5m以上
大船渡	15時18分 8.0m以上
久慈港	15時21分 8.6m以上

表1-2

調査地域	津波浸水高
吉里吉里	16.1m
吉里吉里漁港東側	22.2m
赤浜	12.9m
新港町	12.7m
町役場付近	10.7m
浪板 (※津波遡上高)	19.1m

1. 地震及び津波の概要

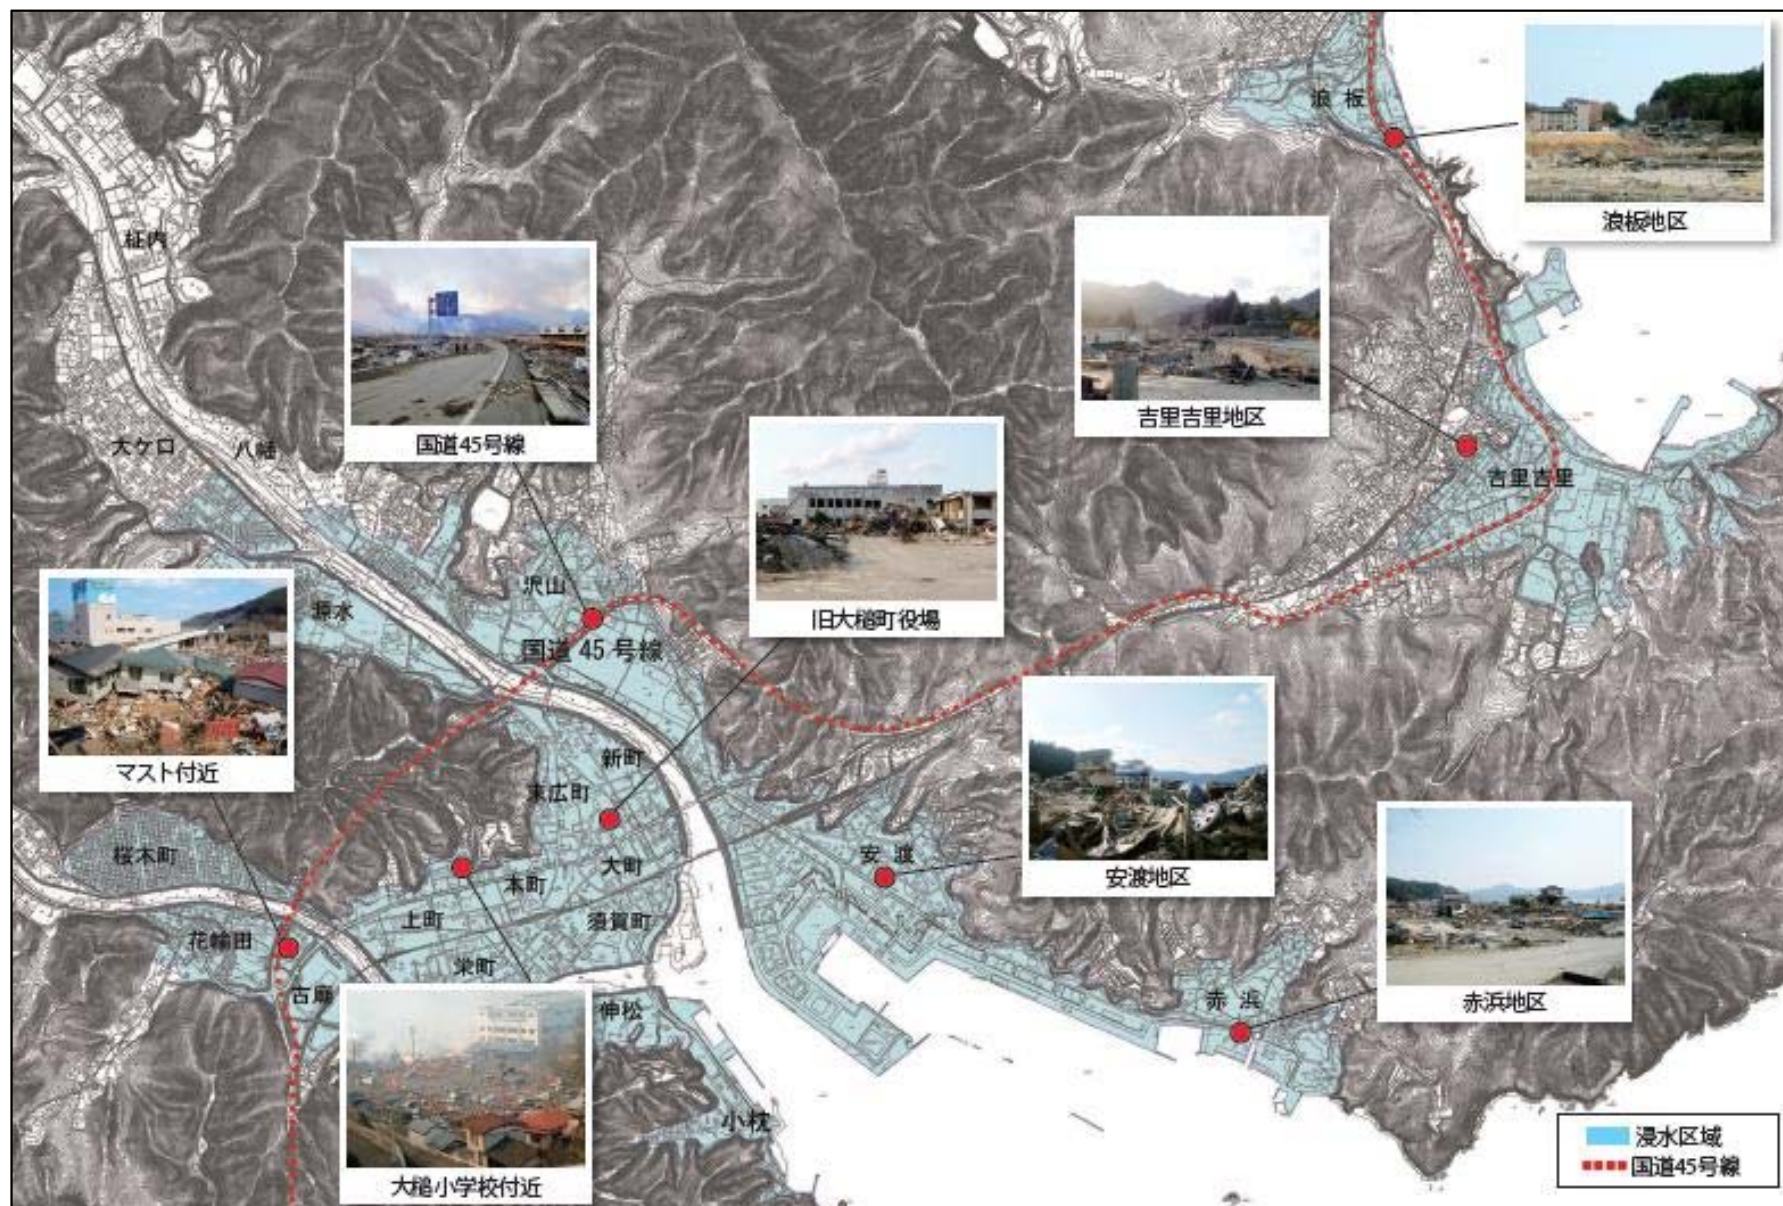

津波浸水区域

2. 被害の状況等

被害の区分		被害	備考
人的被害	死者	814人	
	行方不明者	420人	うち死亡届出数 419人
	震災関連死	51人	
	計	1,285人	
家屋被害 (H27.4確定)	全壊・半壊	4,167棟	
	一部損壊	208棟	
	計	4,375棟	
産業被害	水産業	5,127,926千円	水産施設、漁船、養殖施設等
	農業	610,000千円	水田、畑、用水路、農道
	林業	271,741千円	林野、林道
	商工業	14,039,490千円	建物、機械設備、商品等
	観光業	1,684,607千円	観光施設、自然公園
	計	21,733,764千円	
公共施設 被害	役場庁舎等	9,555,102千円	建物、公用車等
	消防施設等	427,364千円	庁舎、機械、装備、消火栓等
	道路・海岸等	41,181,244千円	公共下水道等
	上水道施設	2,213,311千円	ポンプ場等
	学校	3,044,796千円	建物、設備等
	社会教育施設	1,305,284千円	公民館、図書館、運動場等
	社会福祉施設	136,660千円	児童・障がい・高齢者・福祉施設等
	計	57,863,761千円	
産業・公共施設被害(合計)		79,597,525千円	

3. 町方地区の状況

震災前



震災直後



現在 (H29年11月30日撮影)




城山から見た中心市街地の様子

Ⅱ 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要

○計画の目的及び構成

- 町は、東日本大震災津波が与えた被害の状況や影響、復興に向けた課題を把握し、1日も早く復興を成し遂げるための未来の設計図として「大槌町東日本大震災復興計画」を策定。
- 本計画は震災復興に向けた基本的な施策の方向を示す「基本計画」と、その内容に沿って各施策に対応した事業のあり方を示す「実施計画」の2つの計画で構成。


○計画の期間

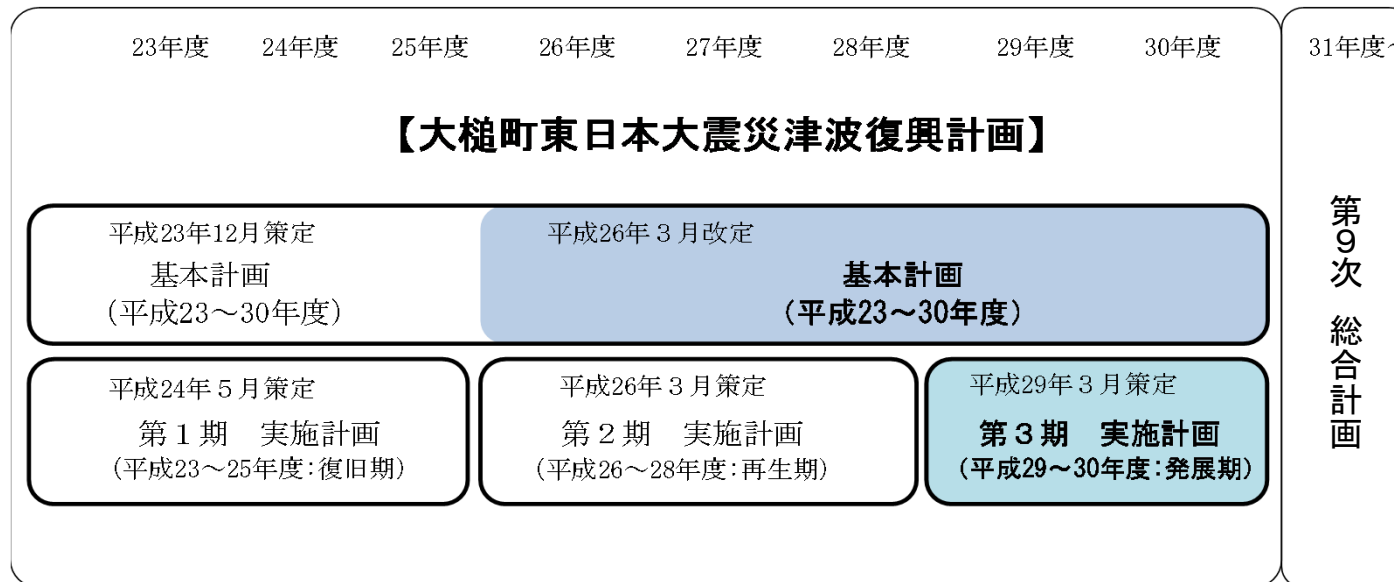

Ⅱ 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要

○復興まちづくりの体系

希望の大槌への挑戦

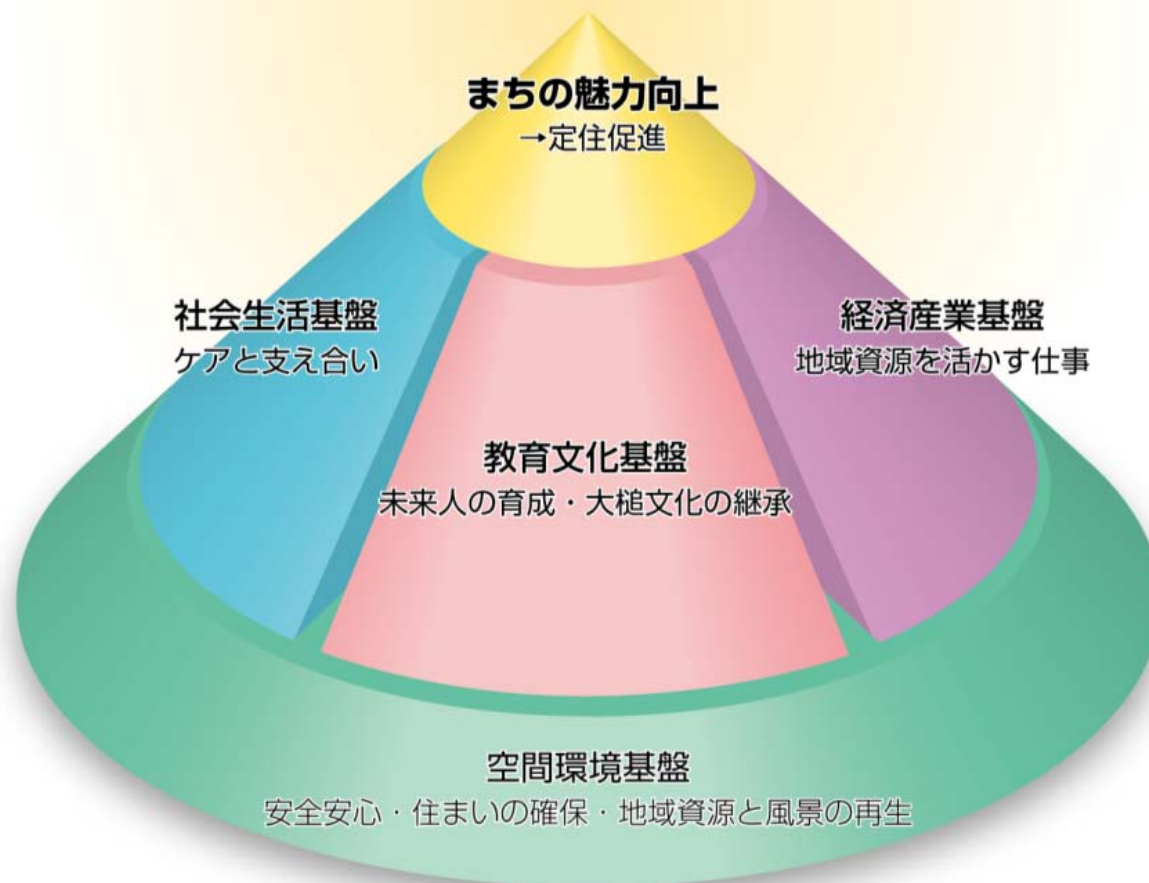

「希望の大槌への挑戦」という基本理念のもと、「空間環境基盤」の上に「社会生活基盤」、「経済産業基盤」、「教育文化基盤」の3つの基盤が三位一体となったまちづくりを進めることで、町の魅力向上による定住促進につなげ、「美しいまち」を実現します。

Ⅲ 復旧・復興の進捗状況

町方地区を中心とした航空写真（H28.3.28撮影）



- 1 大槌学園・大槌高校
- 2 大槌郵便局
- 3 復興きらり商店街
- 4 大槌消防署
- 5 御社地工リア復興拠点施設
- 6 中央公民館
- 7 大槌町役場
- 8 桜木町地区避難路
- 9 県立大槌病院
- 10 大槌駅（予定）

Ⅲ 復旧・復興の進捗状況

H29.3寺野↓



災害公営住宅

H29.3大ケ口↓



小中一貫校

浪板地区防集事業(移転先)
整備面積 0.7 ha

浪板地区漁集事業
整備面積 2.7 ha

H29.3浪板↓



吉里吉里地区防集事業(移転先)
整備面積 3.7 ha

吉里吉里地区土地区画整理事業
整備面積 9.1 ha

H29.3吉里吉里↓



H29.3町方↓

町方地区防集事業(移転先)
整備面積 8.5 ha



町方地区土地区画整理事業
整備面積 30.0 ha

県立病院

消防署

図書館

公民館・避難ホール

安渡地区防集事業(移転先)
整備面積 4.0 ha

安渡地区土地区画整理事業
整備面積 5.9 ha

安渡地区拠点事業
整備面積 19.6 ha

小枕・伸松地区防集事業(移転先)
整備面積 2.3 ha

赤浜地区漁集事業
整備面積 1.8 ha

赤浜地区土地区画整理事業
整備面積 7.7 ha

H29.3赤浜↓



H29.3安渡→



←H29.3
小枕・伸松




防集事業・・防災集団移転促進事業

漁集事業・・漁集集落防災機能強化事業


拠点事業・・津波復興拠点整備事業

1. 町民生活の状況 (1)人口及び世帯数の推移

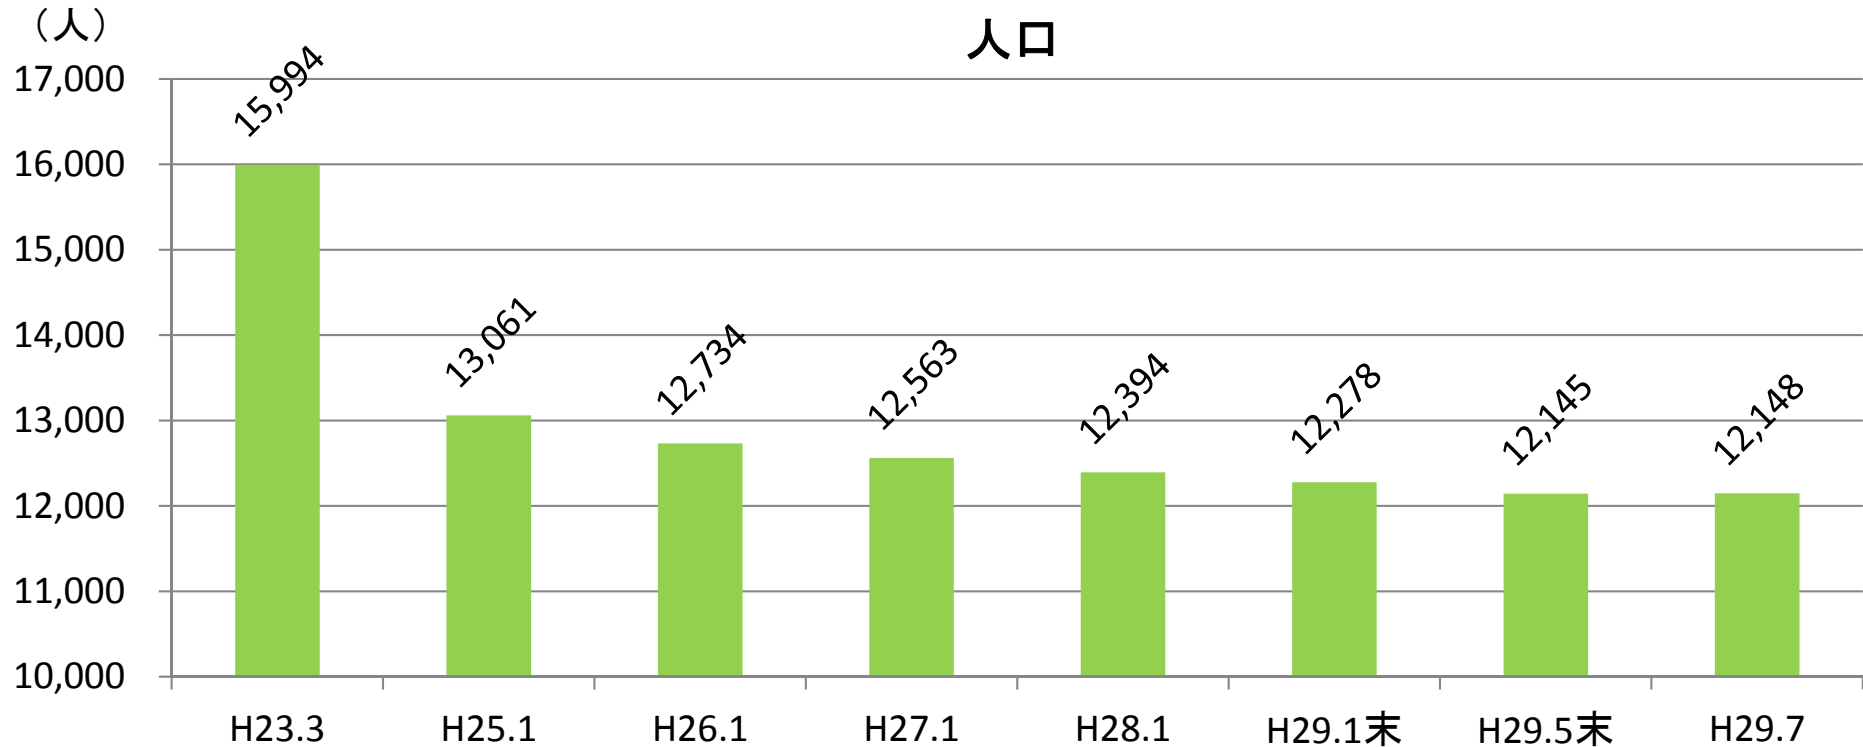

震災前 (H23.3.1)	震災後 (H29.7.1)	増 減
15,994 人	12,148 人	▲3,846 人
6,348世帯	5,440世帯	▲ 908 世帯

(2) 応急仮設住宅の設置状況

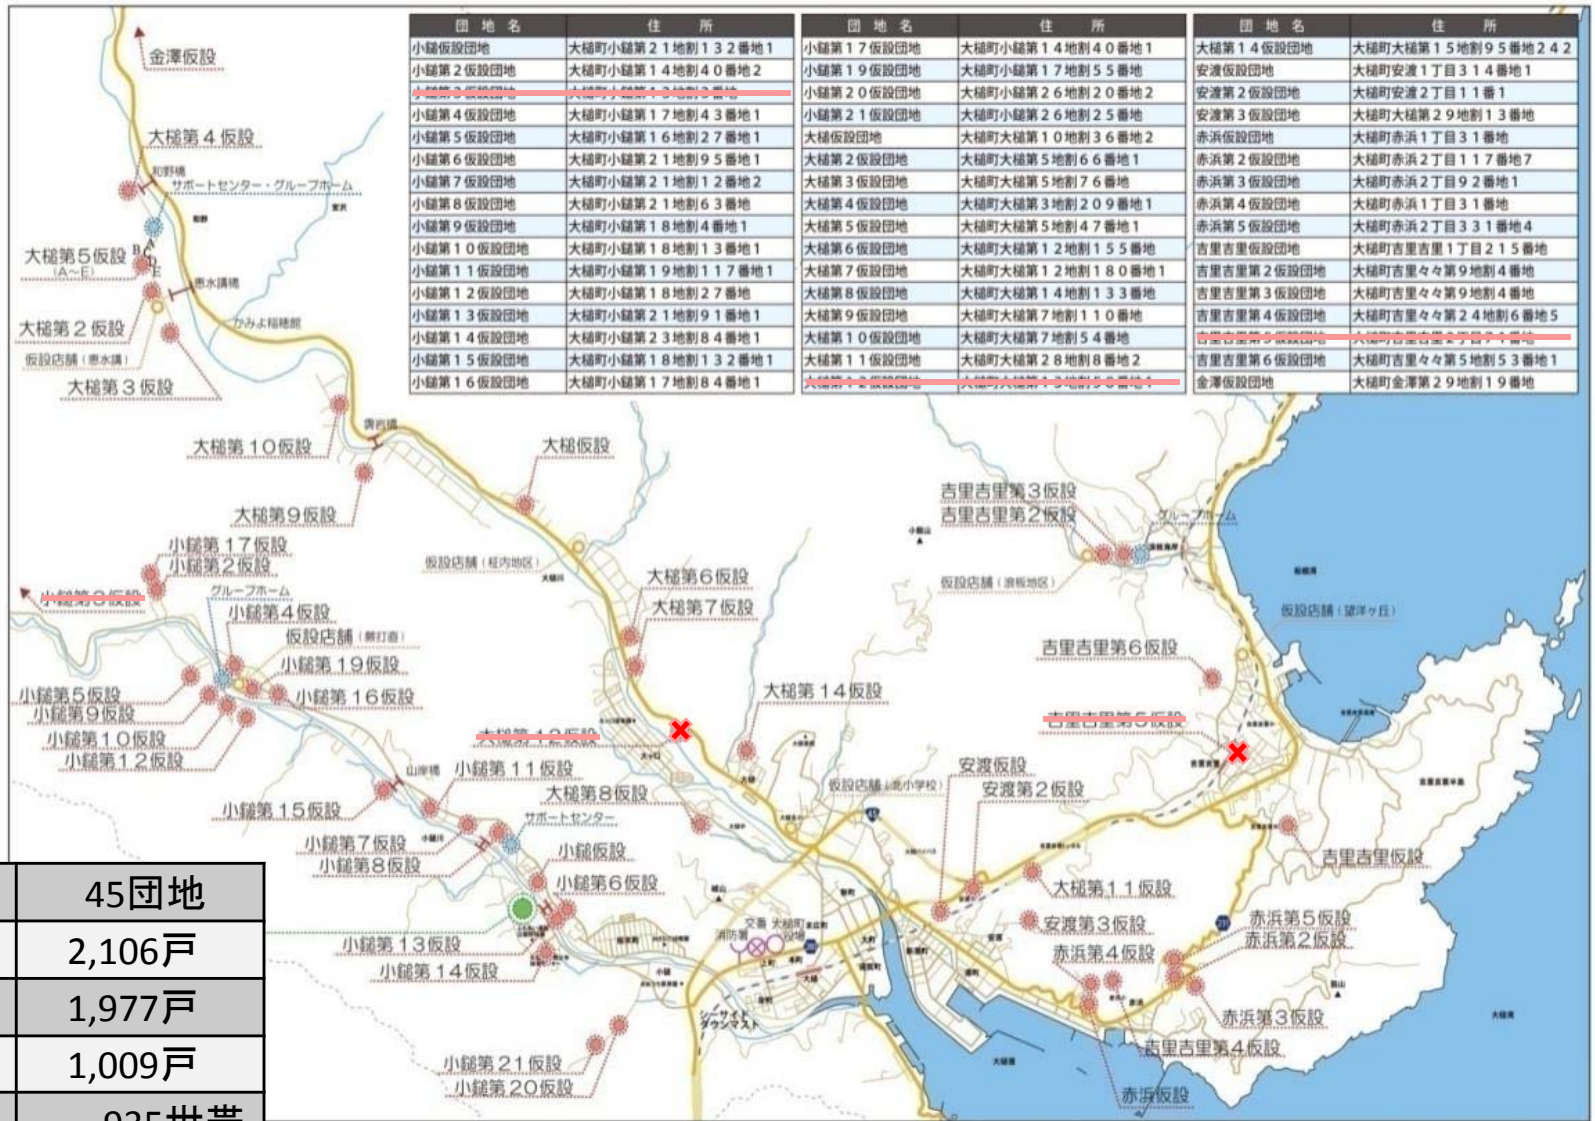


団地数	当初48→	45団地
建設戸数		2,106戸
住宅戸数	(A)	1,977戸
入居戸数	(B)	1,009戸
入居世帯数		935世帯
入居者数		1,863人
入居率	(B/A)	51.0%
空き部屋数	(A-B)	968戸

※H29.10.1現在

(2) 応急仮設住宅の状況 ～入居見込戸数～


入居見込数(戸)

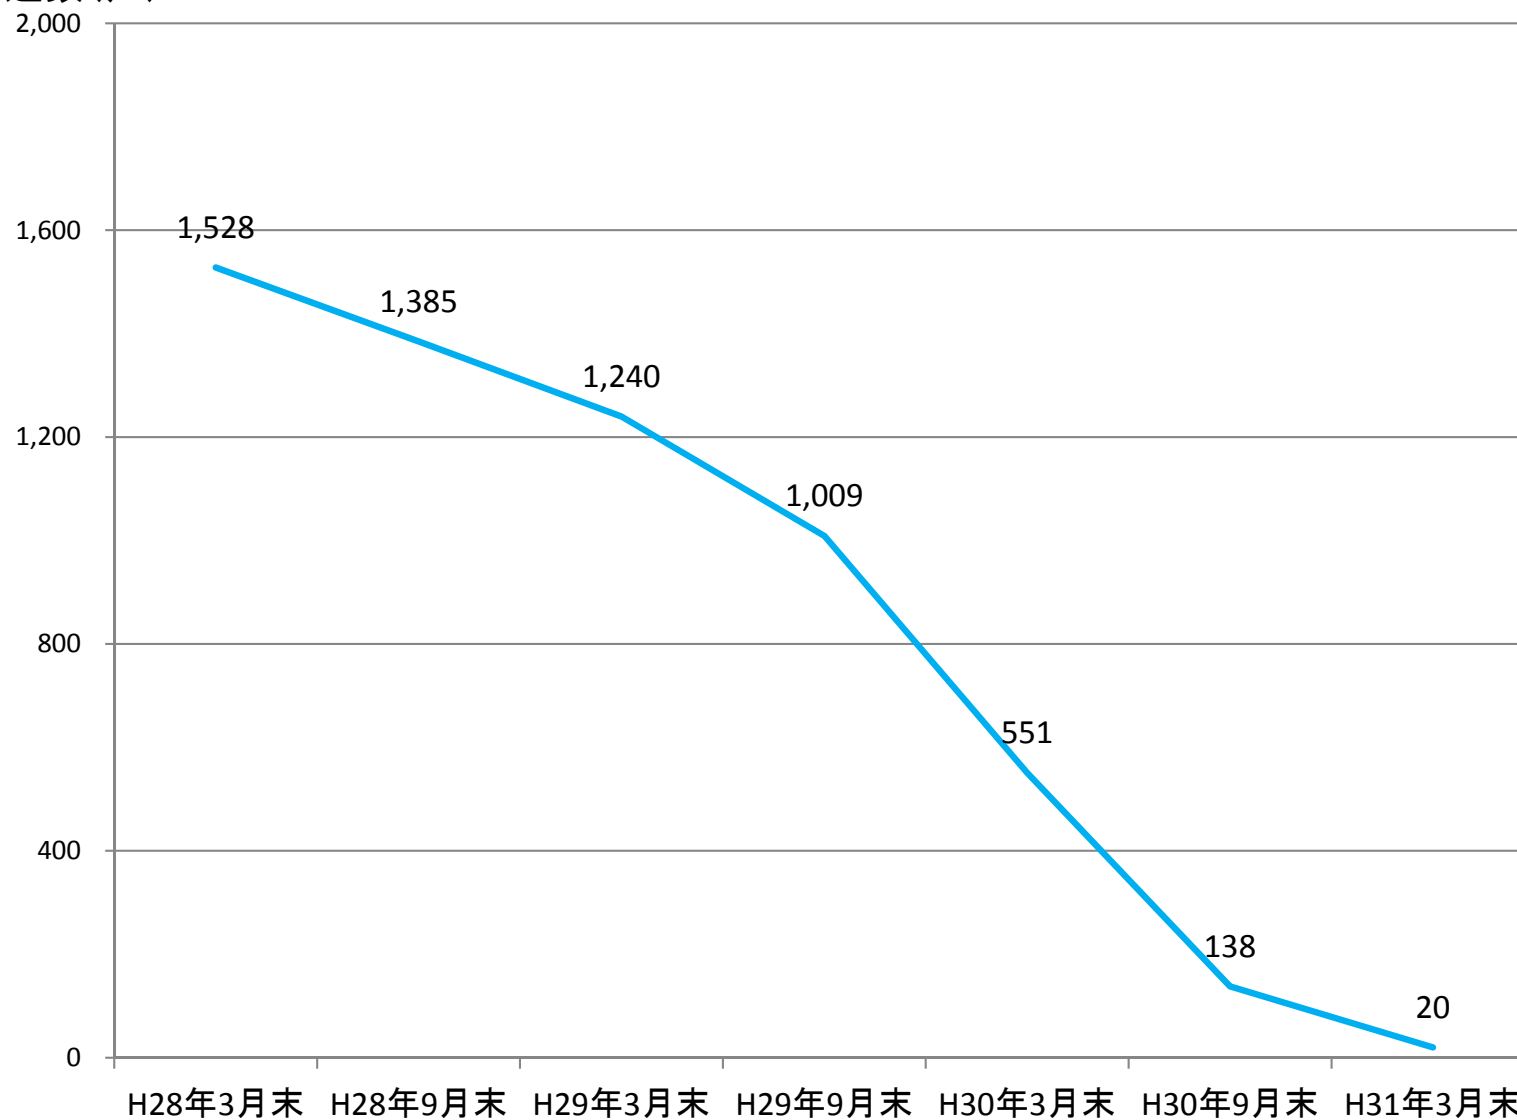

※H29.10.1現在


(3) 町外避難者数等

○町外避難者数

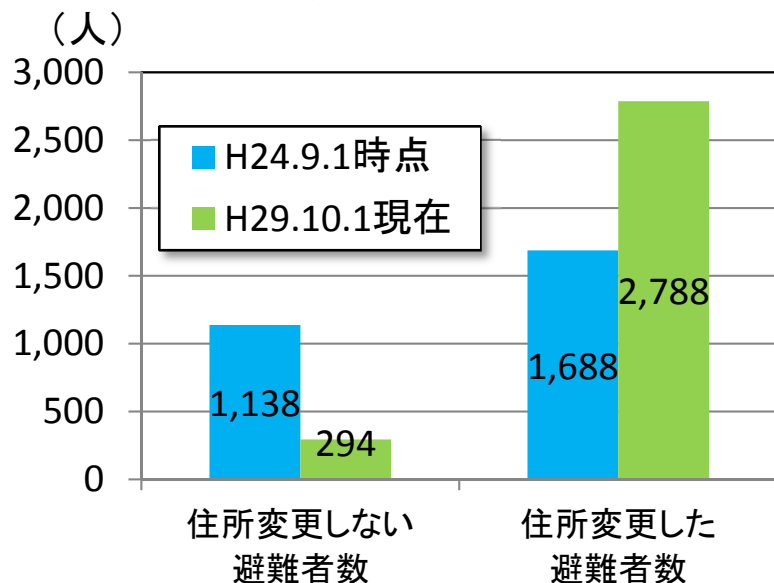



区 分	H24.9.1時点	H29.10.1現在	増 減
住所変更しない避難者数	1,138人	294人	▲844人
住所変更した避難者数	1,688人	2,788人	1,100人
計	2,826人	3,082人	256人

○児童生徒数・生活保護受給者数




区 分	震災前 (H23.3.1)	震災後 (H29.10.1)	増 減
児童生徒数	1,224人	756人	▲468人
生活保護受給者数	286人	105人	▲181人

2. 町の復旧・復興の状況 (1) 予算の状況

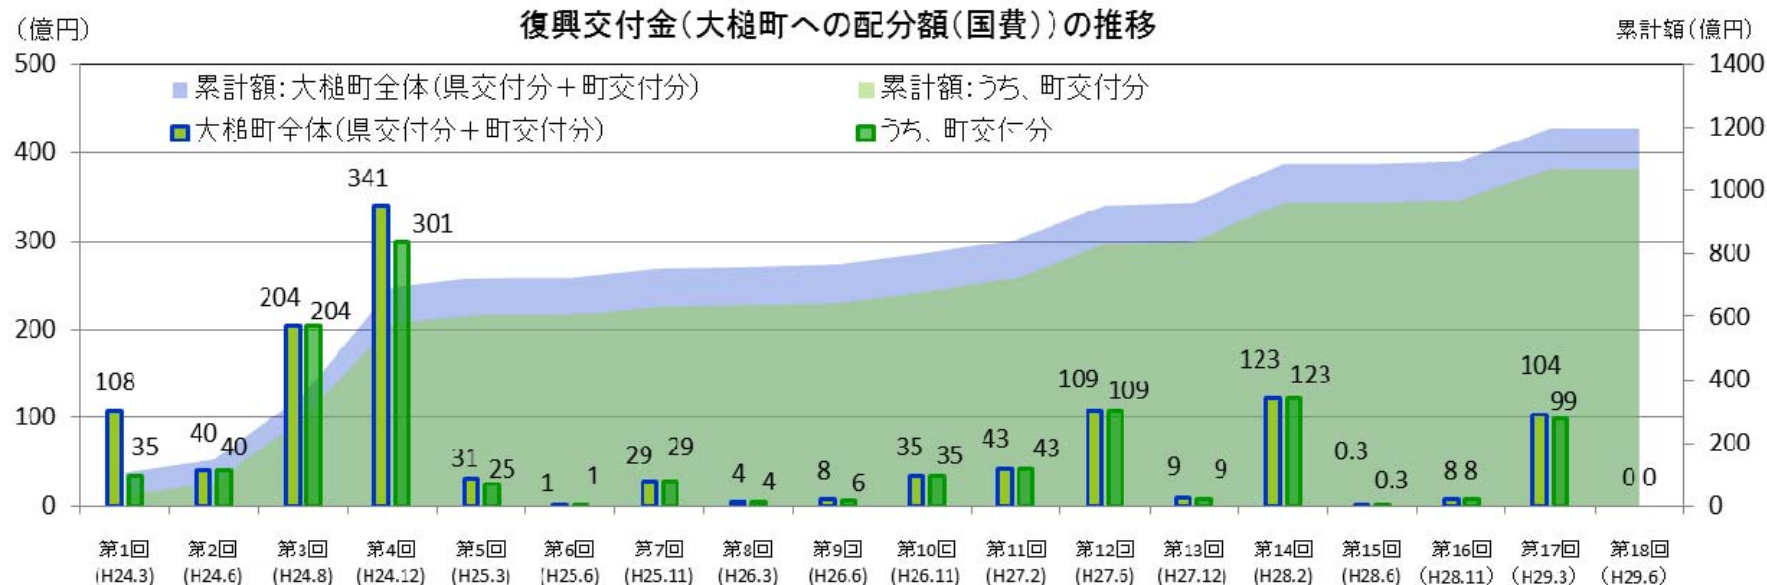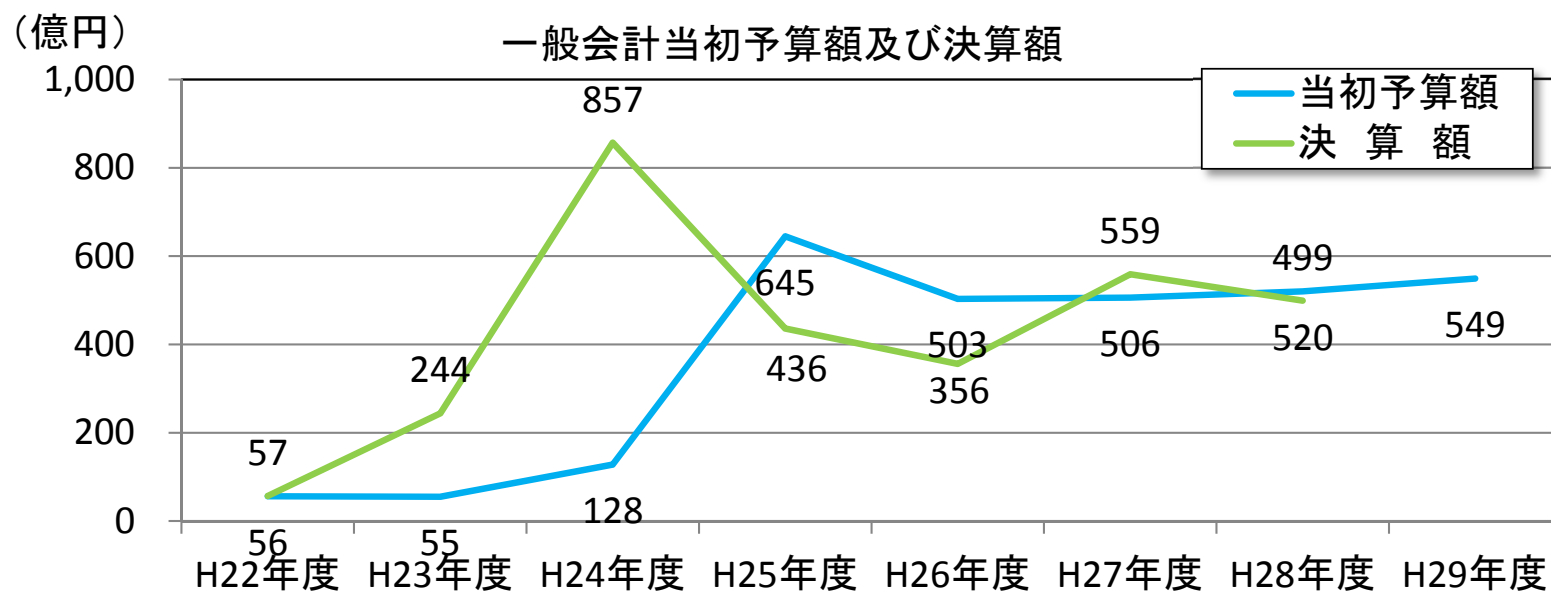


(2) 復興事業の進捗状況 ～職員数～

○職員数の推移

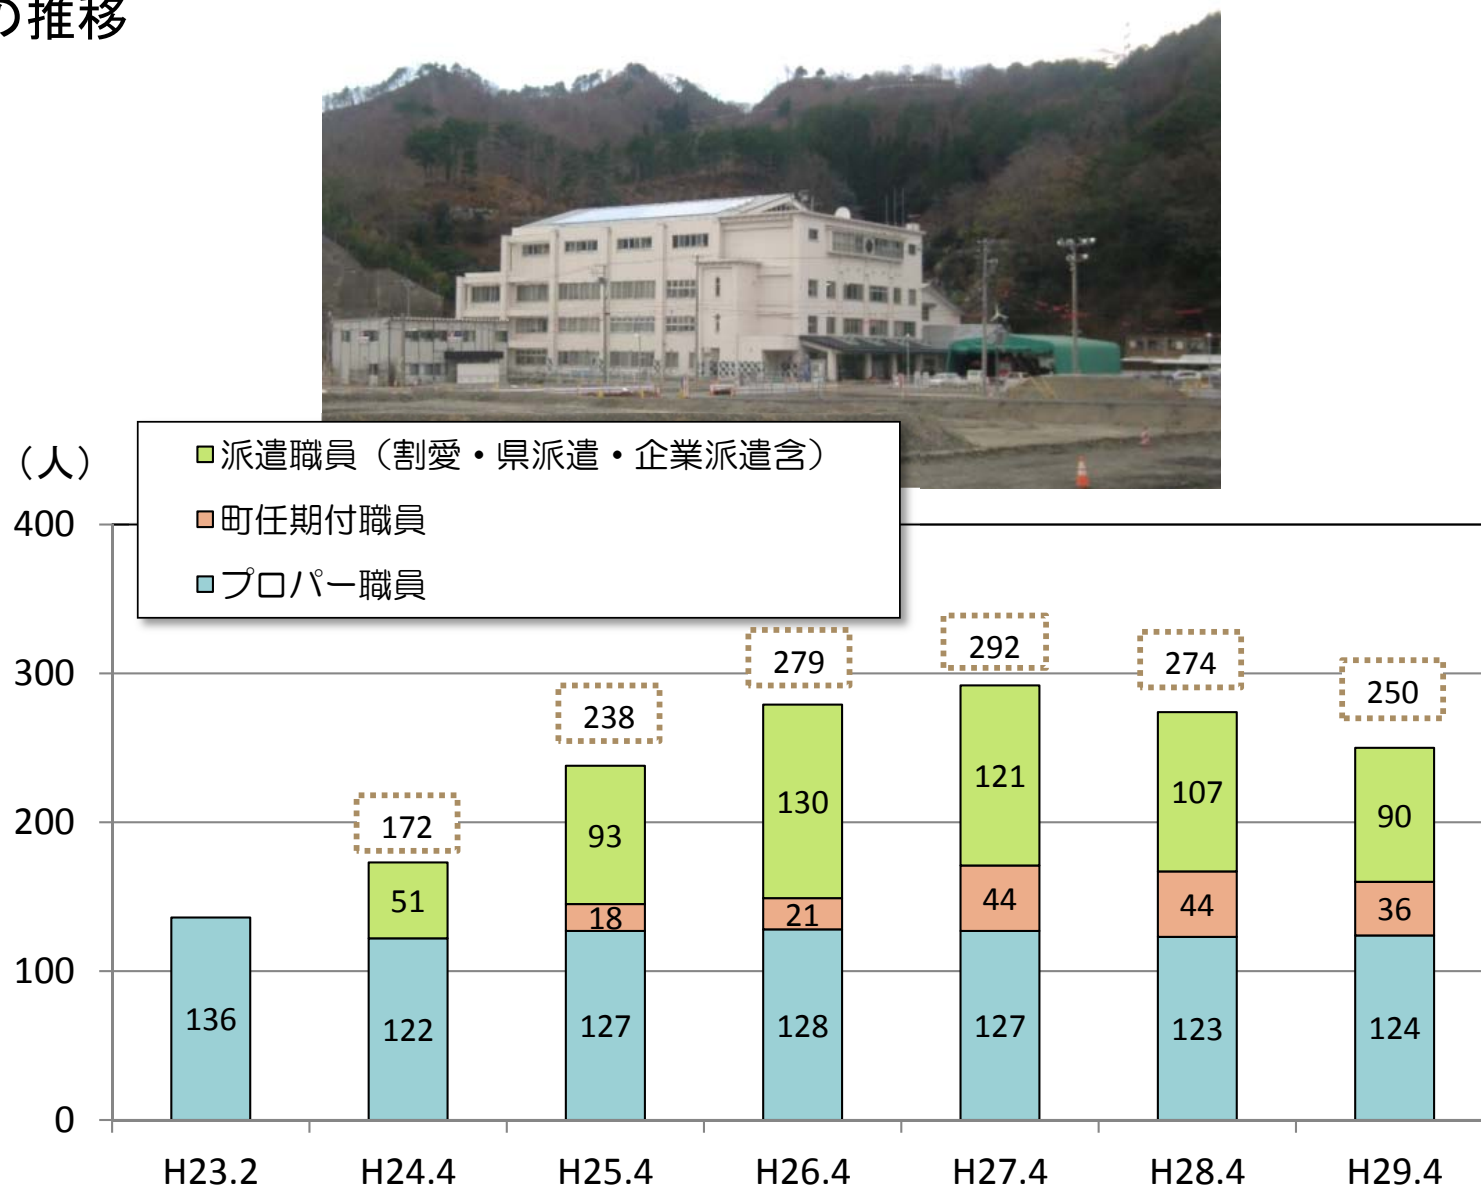


※H29.4.1現在

(3) 復旧事業の進捗状況

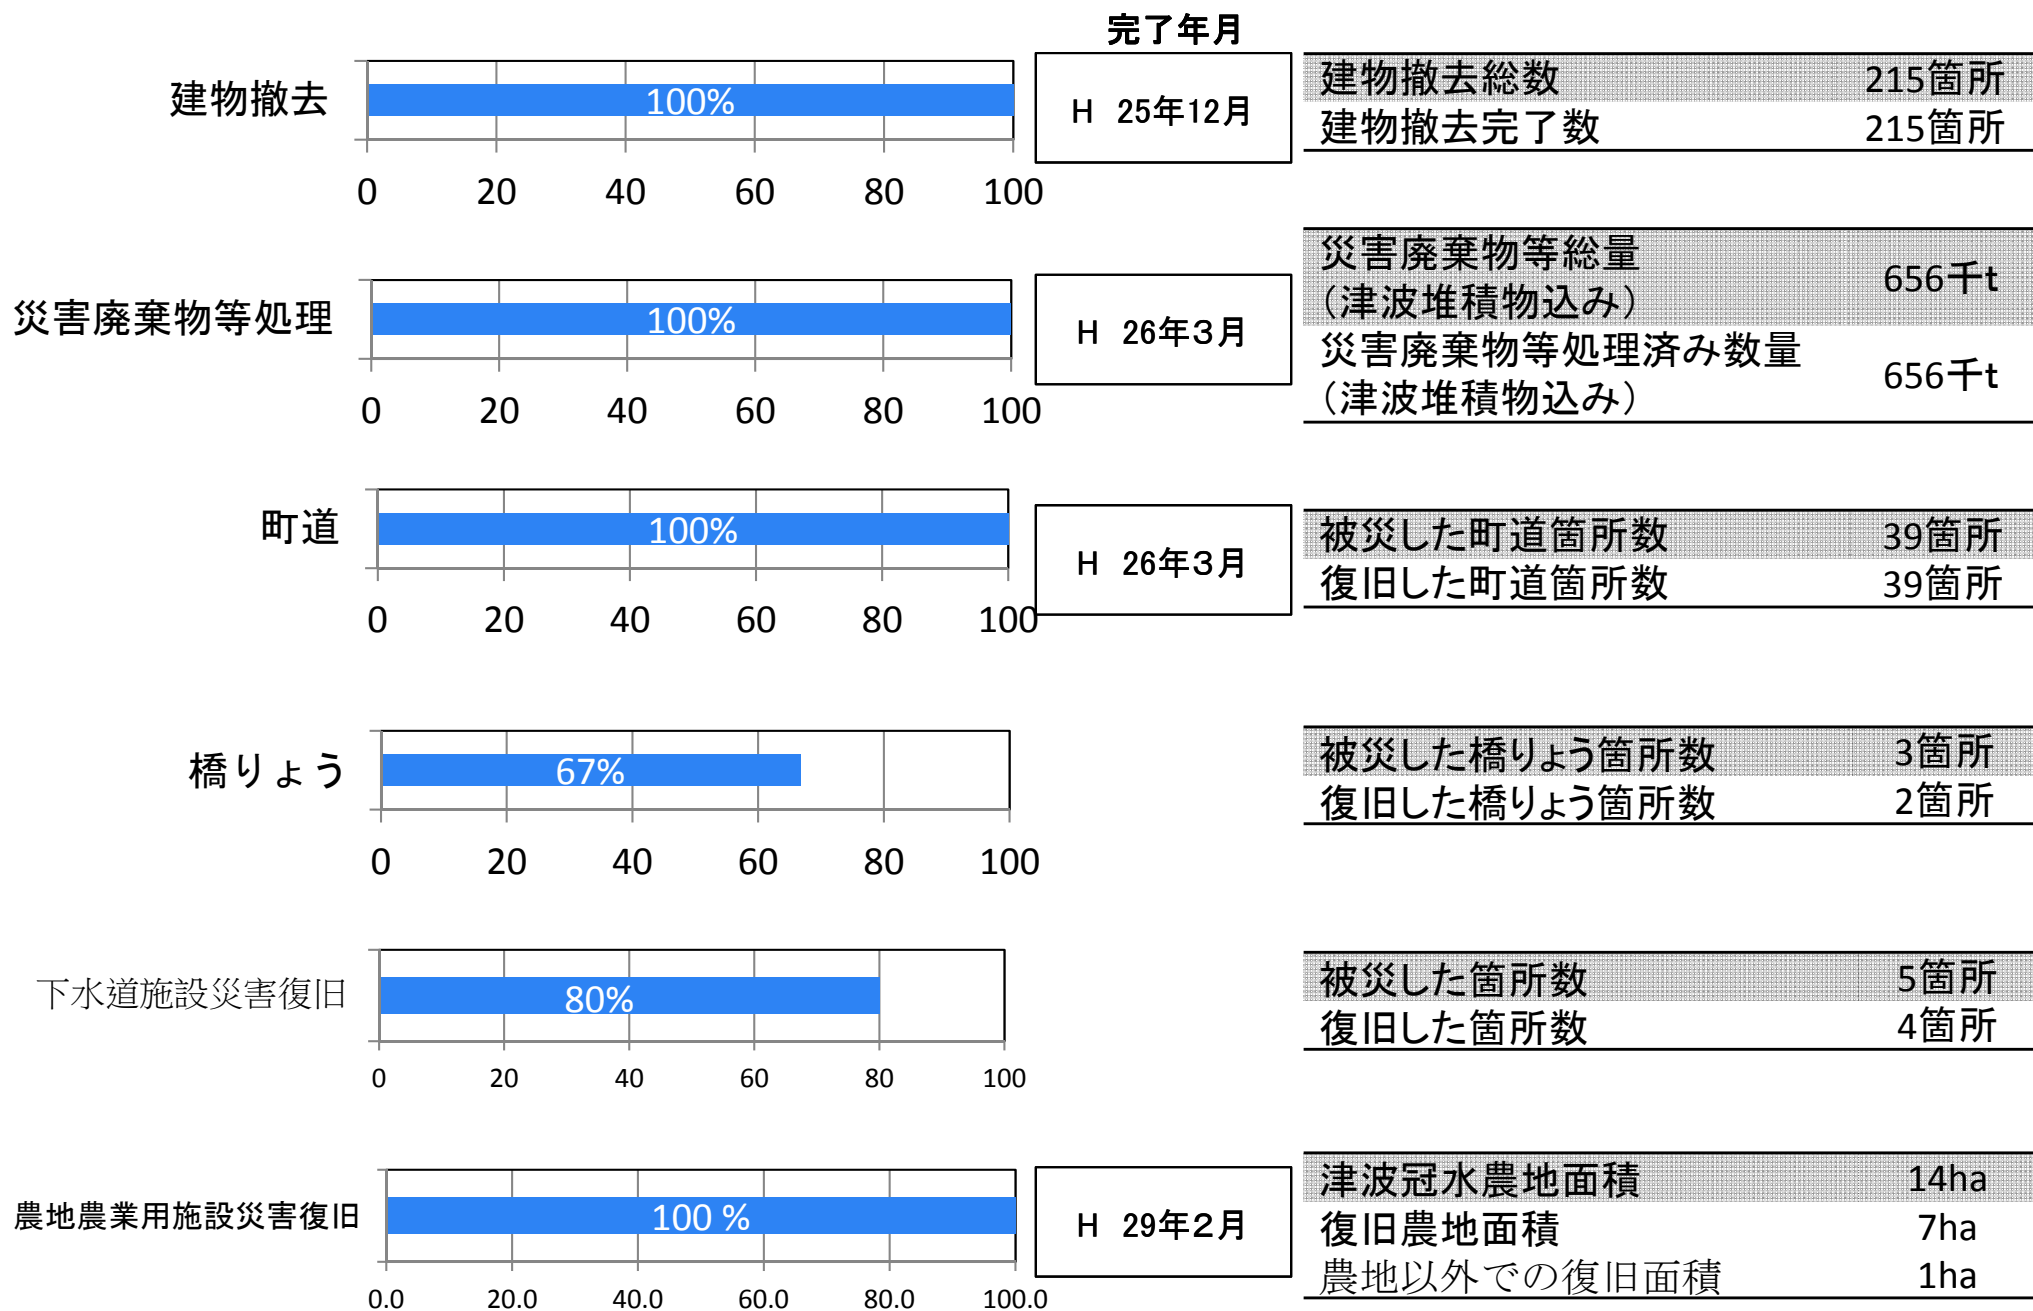


(4) 復興事業の進捗状況

① 土地区画整理事業




換地計画面積	347,007.1m ²
仮換地済面積	339,622.7m ²




換地計画面積	347,007.1m ²
使用収益済面積	294,729.9m ²

② 防災集団移転事業




計画宅地数	422戸
整備済宅地戸数	356戸

③ 災害公営住宅



計画戸数	885戸
完成済戸数	481戸

④ 漁業集落防災機能強化事業



計画戸数	12戸
整備済宅地戸数	12戸

(4) 復興事業の進捗状況

① 土地区画整理事業


地区		町方	安渡	赤浜	吉里吉里	計
面積 (ha)	※1	30.0	5.9	7.7	9.1	52.7
計画人口 (人)	※1	2100	400	360	550	3410
都市計画決定	当初	※1	H24.9.28	H24.9.28	H24.9.28	H24.9.28
	最新	※1	H27.10.26	H27.8.19	H26.12.8	H27.8.19
事業計画認可	当初	※1	H25.3.7	H25.3.7	H25.3.7	H25.3.7
	最新	※1	H28.1.7	H29.3.29	H29.6.5	H27.11.24
宅地完成年月	※2	H30.1	H30.6	H30.3	H29.10	

② 防災集団移転促進事業

地区		町方・小枕・伸松	安渡	赤浜	吉里吉里	浪板	計	
移転促進区域 面積 (ha)	地区面積	※1	28.5	13.6	6.7	8.3	3.3	60.4
	住宅団地面積	※1	20.3	11.2	6.5	5.9	2.3	46.2
被災前戸数 (戸)		※1	918	482	140	177	47	1764
移転先住宅団地 (戸) ※団地内の災害公営 住宅戸数を含む		※2	270	65	84	66	11	498
移転先団地面積 (ha)		※1	11.5	4.0	6.5	3.7	0.7	30.1
国土交通大臣 同意・変更同意	当初	※1	H24.9.24	H24.9.24	H24.9.4	H24.9.24	H24.9.24	
	最新	※1	H29.3.31※大槻町全地区を統合					
宅地完成年月		※2	H29.12	H30.3	H31.2	H28.9	H27.6	

(4) 復興事業の進捗状況 ～区画整理等～

① 復興まちづくり(区画数)

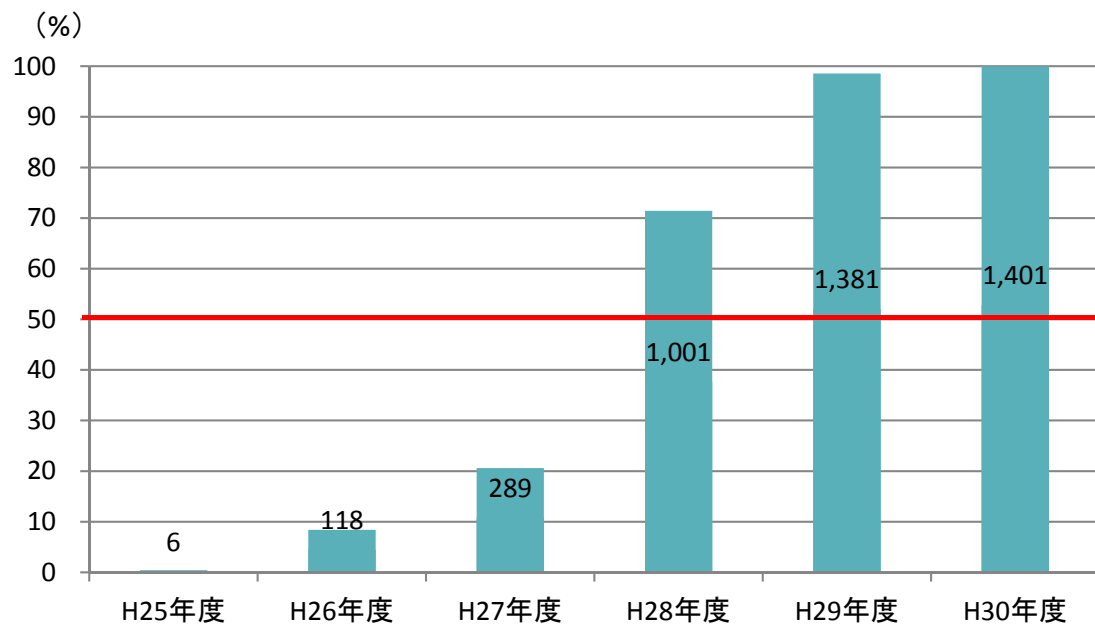


	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計
土地区画整理	0	23	100	558	277	9	967
防災集団移転	6	89	71	142	103	11	422
漁業集落防災機能強化	0	0	0	12	0	0	12
区画合計	6	112	171	712	380	20	1,401
割合(%)	0	8	21	71	99	100.0	
累計	6	118	289	1,001	1,381	1,401	

撮影場所: 町方地区



(5) 復興事業の進捗状況 ～災害公営住宅～

災害公営住宅戸数

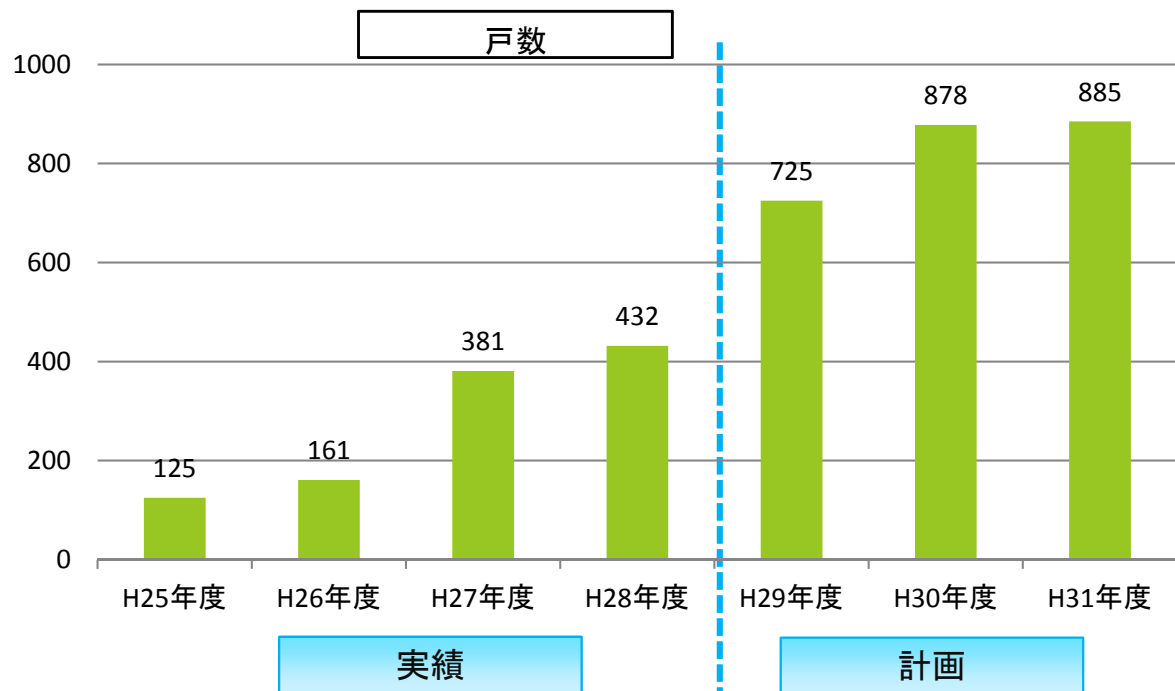

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
単年度	125	36	220	51	293	153	7
累計	125	161	381	432	725	878	885

寺野第2災害公営住宅 H28.7 完成




本町1・上町災害公営住宅 H29.3 完成




3. 産業の状況 (1) 生業の状況

○生業

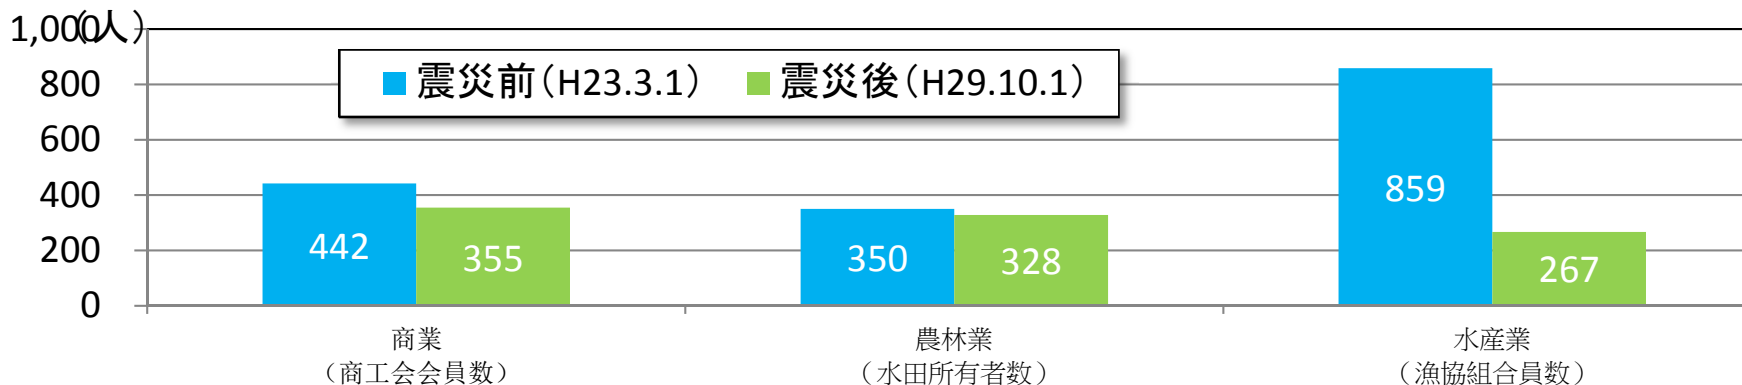

○新規求職者数・求人数

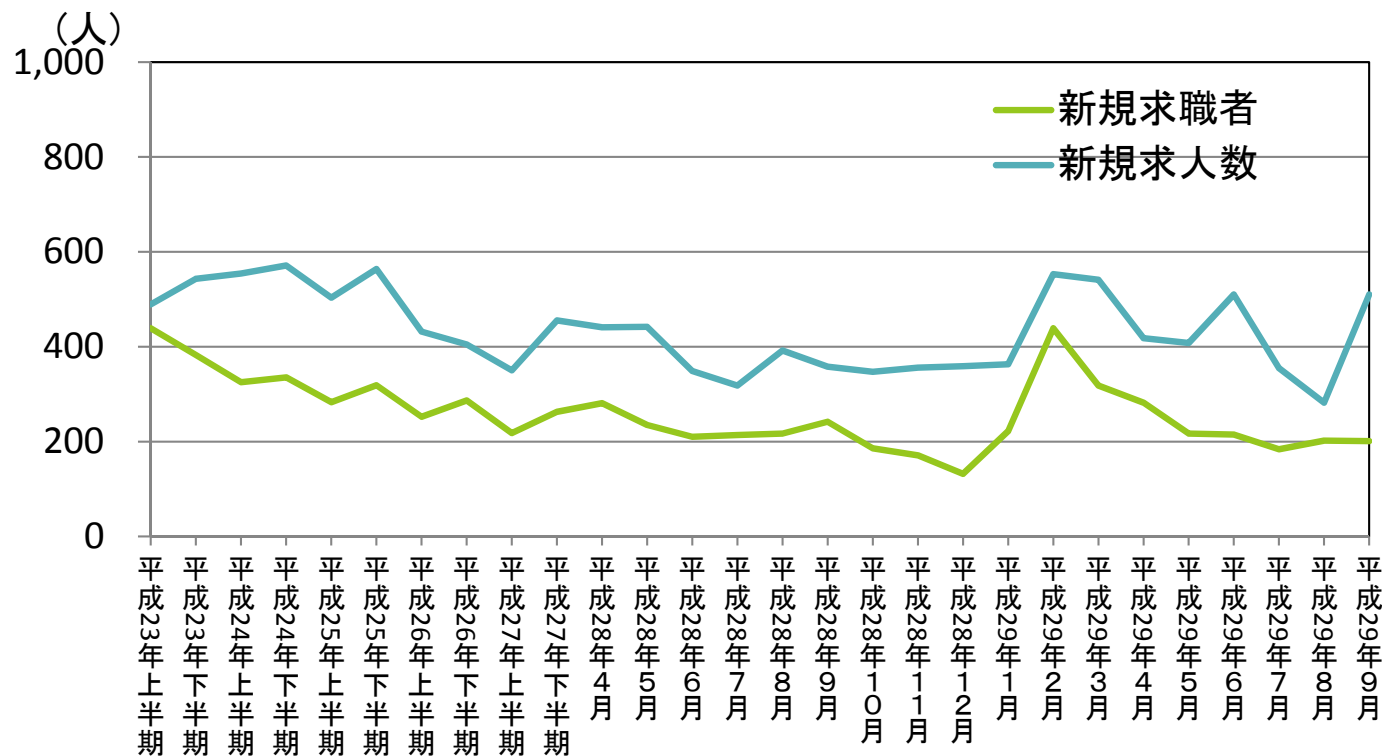


新規求職者数は、震災直後の平成23年5月以降、新規求人数を下回る傾向が続いている。

※H29.10.1現在

(2) 水産業の状況


○施設等整備

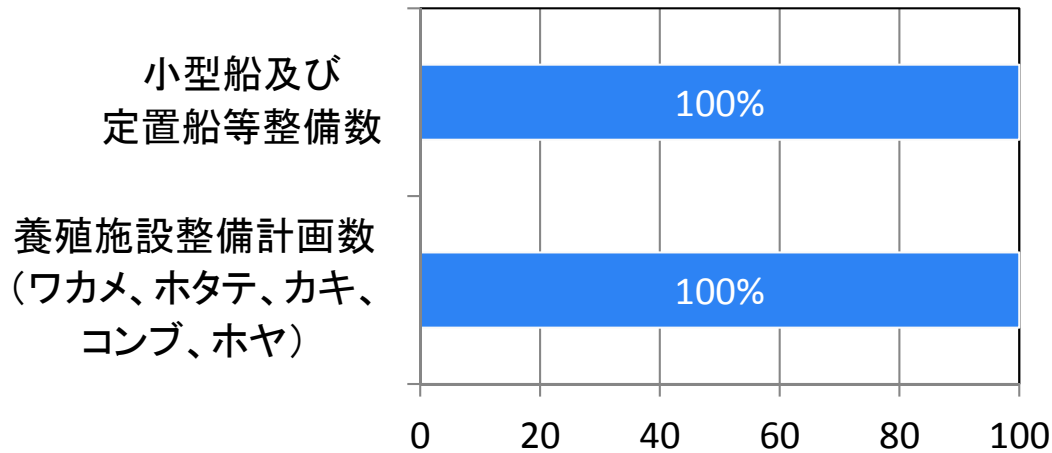

小型船及び定置船等整備計画数	237隻
小型船及び定置船等整備数	237隻

養殖施設整備計画数 (ワカメ、ホタテ、カキ、コンブ、ホヤ)	580台
養殖施設整備数 (ワカメ、ホタテ、カキ、コンブ、ホヤ)	580台

○水産加工業者数

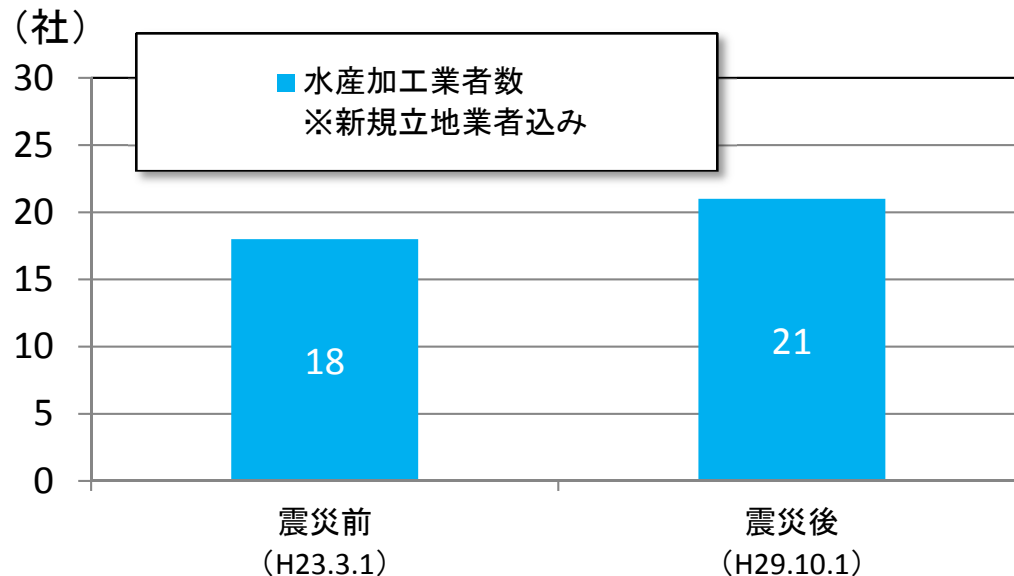


※ナカシヨク、伊藤商店、浦田商店、ゼネラルオイスター、平庄、小豆嶋漁業、TRS、及順商店、たかのり海産、六串商店、あさひ堂、石山水産、小野食品、壮関、中里商店、越田鮮魚店、芳賀鮮魚店、デジタルブックプリント、小国商店、魚よし、どまん中・おおつち

(2) 水産業の状況

○主要水産物水揚げ高

(サケ、ワカメ、コンブ、ホタテ、カキ)

(ウニ、アワビ)

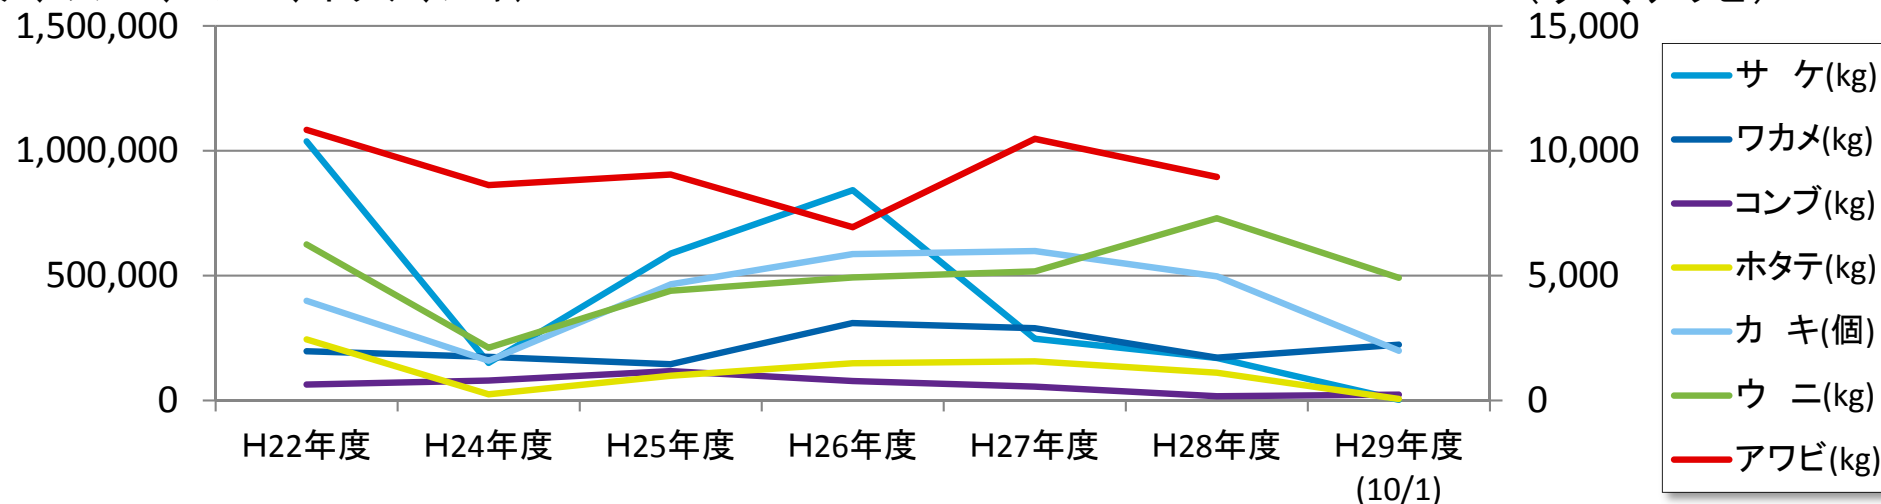

主要水産物水揚げ量表

区分	H22年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 (10/1)
サケ(kg)	1,037,194	150,386	588,321	842,084	246,845	170,369	2,201
ウニ(kg)	6,249	2,111	4,396	4,924	5,171	7,296	4,914
アワビ(kg)	10,837	8,625	9,045	6,941	10,477	8,948	
ワカメ(kg)	197,023	175,025	145,233	309,739	289,151	171,460	223,238
コンブ(kg)	63,690	79,789	117,764	77,730	55,770	16,935	23,535
ホタテ(kg)	244,404	25,059	99,253	149,420	156,600	111,467	6,031
カキ(個)	399,290	159,253	464,798	586,359	598,390	497,076	198,950

4. 公共施設の再建状況 (1)消防署 (2)県立大槌病院

(1) 消防署



- 平成28年年3月19日落成式・運用開始
- 建設場所：大槌町大槌14地割142番地1 大槌中学校跡（源水地区）
- 再建施設はH26年に建築工事着手

(2) 県立大槌病院



- 平成28年5月9日開院
- 建設場所：上閉伊郡大槌町小槌22-31-2
- 病院の機能
 - (1) 圏域の地域病院として、広域基幹病院である県立釜石病院等と連携しながら高齢者を中心とした入院機能を担う。
 - (2) 診療時間内の一次診療を基本とし、診療時間外の救急は県立釜石病院で対応する。
 - (3) 入院患者を中心とした維持期のリハビリテーション機能を提供する。
- 診療科及び病床規模
 - (1) 診療科 内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科
 - (2) 病床数 1病棟 一般病床50床

(3)大槌学園（平成28年9月開校） (4)こども教育センター

(3) 大槌学園



授業風景



外観

- 住所：大槌町大槌第15地割71番9号
- 大槌小、大槌北小、赤浜小、大槌中学校が被災。
- 安渡小を含め4小学校・1中学校を合わせて寺野地区に仮設校舎設置。
- 大槌学園小中一貫教育校として再建することとし、移転先を決定（H26.3都市計画決定）。校舎はH27年2月より建築工事着手H28年9月26日開校。
- 吉里吉里小・吉里吉里中は、吉里吉里学園として、小中校舎を小学部・中学部校舎として使用。
- H27年4月から小中一貫教育「ふるさと科」が本格実施。

(4) こども教育センター（OLA I）



※写真はH29.4.6に実施したオープンセレモニー

- 住所：大槌町大槌第23地割25番地25
- 経緯：こども達の安心・安全な居場所の確保を目的とした「大槌町こどもセンター」（H24年4月開所）、及び、こども達の学びたい意欲を応援する「コラボスクール大槌臨学舎」（H23年12月開校）の2つの機能を統合した放課後こども教育施設として、H29年3月に大槌学園新校舎のある沢山地区に建設。
- 愛称：「OLA I（おらーい）」（大槌弁で「私の家」、「Otsuchi Learn Act Innovate」の略称）
- 対象：1～9年生及び高校生

(5) 公民館 (6) 集会所

(5) 公民館



- 安渡、赤浜、吉里吉里地区とも被災し解体済
- 安渡地区公民館・避難ホールはH28年11月完成
- 赤浜地区公民館・復興まちづくり支援施設は整備用地調整中
- 吉里吉里地区は公民館単独で再建、建築設計中

(6) 集会所



整備済：4箇所

- ①大槌町沢山地区集会所
平成28年3月完成
- ②大槌町臼澤寺野地区ふれあい集会所
- ③大槌町花輪田地区集会所
平成29年3月完成
- ④大槌町小枕地区集会所
平成29年11月完成

(7) 避難路



桜木町避難路竣工式（4月17日）



- 利用開始：平成29年4月17日
- 設置場所：大槌町桜木町裏山
- 建設趣旨：桜木町地区から平成25年3月に「桜木町地区避難路・避難場所整備計画」の提出を受け、町で整備を進めてきた避難路が平成29年3月に竣工しました。当避難路は、城山林道1号線に接続することで、災害対策本部の代替本部として設置される中央公民館や、町指定避難所である城山公園体育館への避難が可能になるほか、城山から自衛隊等の救助や救援物資の搬送、情報伝達が可能となるため、災害時に重要な役割を果たすものとなります。
- 工事概要：組立避難路 延長255.6m 幅員1.5m

(8) 御社地エリア復興拠点施設



← 完成イメージ図
→ 写真 (12月撮影)



スケジュール (予定含む)

東日本大震災により被災した御社地ふれあいセンター、大槌町立図書館等を（仮称）御社地エリア復興拠点施設として整備。

- 建設場所：大槌町末広町2番、大町7番
- 施設の用途：図書館、ホール、生涯学習施設会議・交流・町民活動施設
- 階数：地上3階建て
- 延床面積：2,200m²程度
- 愛称「おしゃっち」に決定

平成29年12月	駐車場工事開始
平成30年2月末	施設完成 展示関連工事開始
平成30年3月末	駐車場完成
平成30年5月末	展示工事完成
平成30年6月	図書館開館

5. 震災津波伝承 (1) 納骨堂



- 供用開始：平成29年2月19日
- 建設場所：大槌町小槌第32地割字金崎126番34
(中央公民館駐車場内)
- 建設趣旨：東日本大震災津波による身元不明の御遺骨
(計69柱 平成29年9月末現在)を収蔵
するもの
- 敷地面積：687.13㎡
- 建築面積：10.37㎡

(2) デジタルアーカイブ

東日本大震災津波に関する画像や文書などを収録した大槌町震災アーカイブ～つむぎ～の公開を開始しました。



【図1】

- 使用開始：平成29年8月8日
- 収録点数：約14,000点
- 収録内容：震災前の大槌町、災害の状況、行政の対応、救助、捜索活動、避難所、医療福祉、がれき、ライフライン、まちづくり、ボランティア活動、コミュニティ再生、学校保育所の再開、産業再開など

• URL:

<https://archive.town.otsuchi.iwate.jp/>
 ※27ページに記載されている「おしゃっち」に設置する タッチパネルモニタでの閲覧も可能となります。

(3) 生きた証

東日本大震災で犠牲となられた方々の生き様や震災時の様子などを記録した「生きた証回顧録」の第1版が発行となりました。

第1版には、545名の記録が掲載されています。



発行された回顧録

平成29年度の取組状況

- ・聴き取りの完了していないご遺族58名の方への調査を実施。
- ・聴き取り完了後、第2版の印刷製本を行ないます。

- ・発行日：平成29年3月
 - ・発行部数：1,000部
 - ・配布部数：810部 うちご遺族分 394部
- 残部につきましては、希望される方へ販売

※平成29年度で事業完了の予定

6. 生活再建と支援

(1) 地域復興協議会とコミュニティ協議会

地域復興協議会

災害復興対策を総合的かつ計画的に推進するための過程において、地域住民との合意形成を図るため、地域復興協議会を設置しています。

主に次の項目を協議します。

- 大槌町震災復興構想素案に関する事
- 地域復興計画策定に関する事
- 身近な暮らしや地域の課題に関する事



コミュニティ協議会

町内の自治会組織、NPO及び企業などの代表が集まり、被災者支援やコミュニティ形成、観光、地域活性化など共有の課題解決について議論するとともに、各団体間の交流を図る場として、コミュニティ協議会を設置しています。

年2回程度開催



(2) 自治会の設立状況と活動例

既設の自治会

- 吉里吉里1～4丁目、花道育成会
- 安渡町内会、沢山町内会
- 源水町内会、大ケ口団地町内会
- 桜木町町内会、花輪田町内会

震災後新設した自治会


- 赤浜自治会
- 吉里吉里町営住宅自治会
- 柁内町内会
- 大ケ口一丁目町営住宅町内会
- 大ケ口町内会
- 臼澤自治会
- 迫又町内会

29～30年度に 新設予定の自治会


- 末広町町内会
- 小枕町内会

休止中または 自治会のない地区

- 上町、本町、大町、新町、松の下、金沢、小鍬、浪板

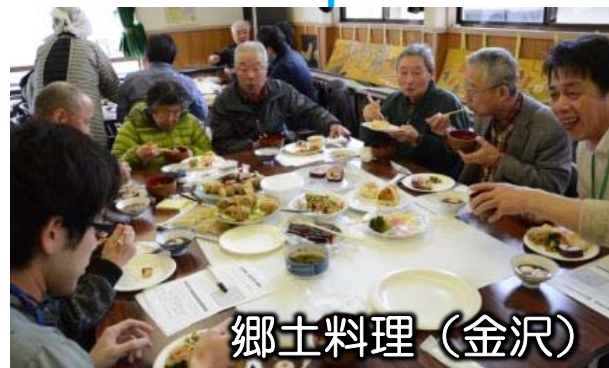

(3) ボランティア数の推移

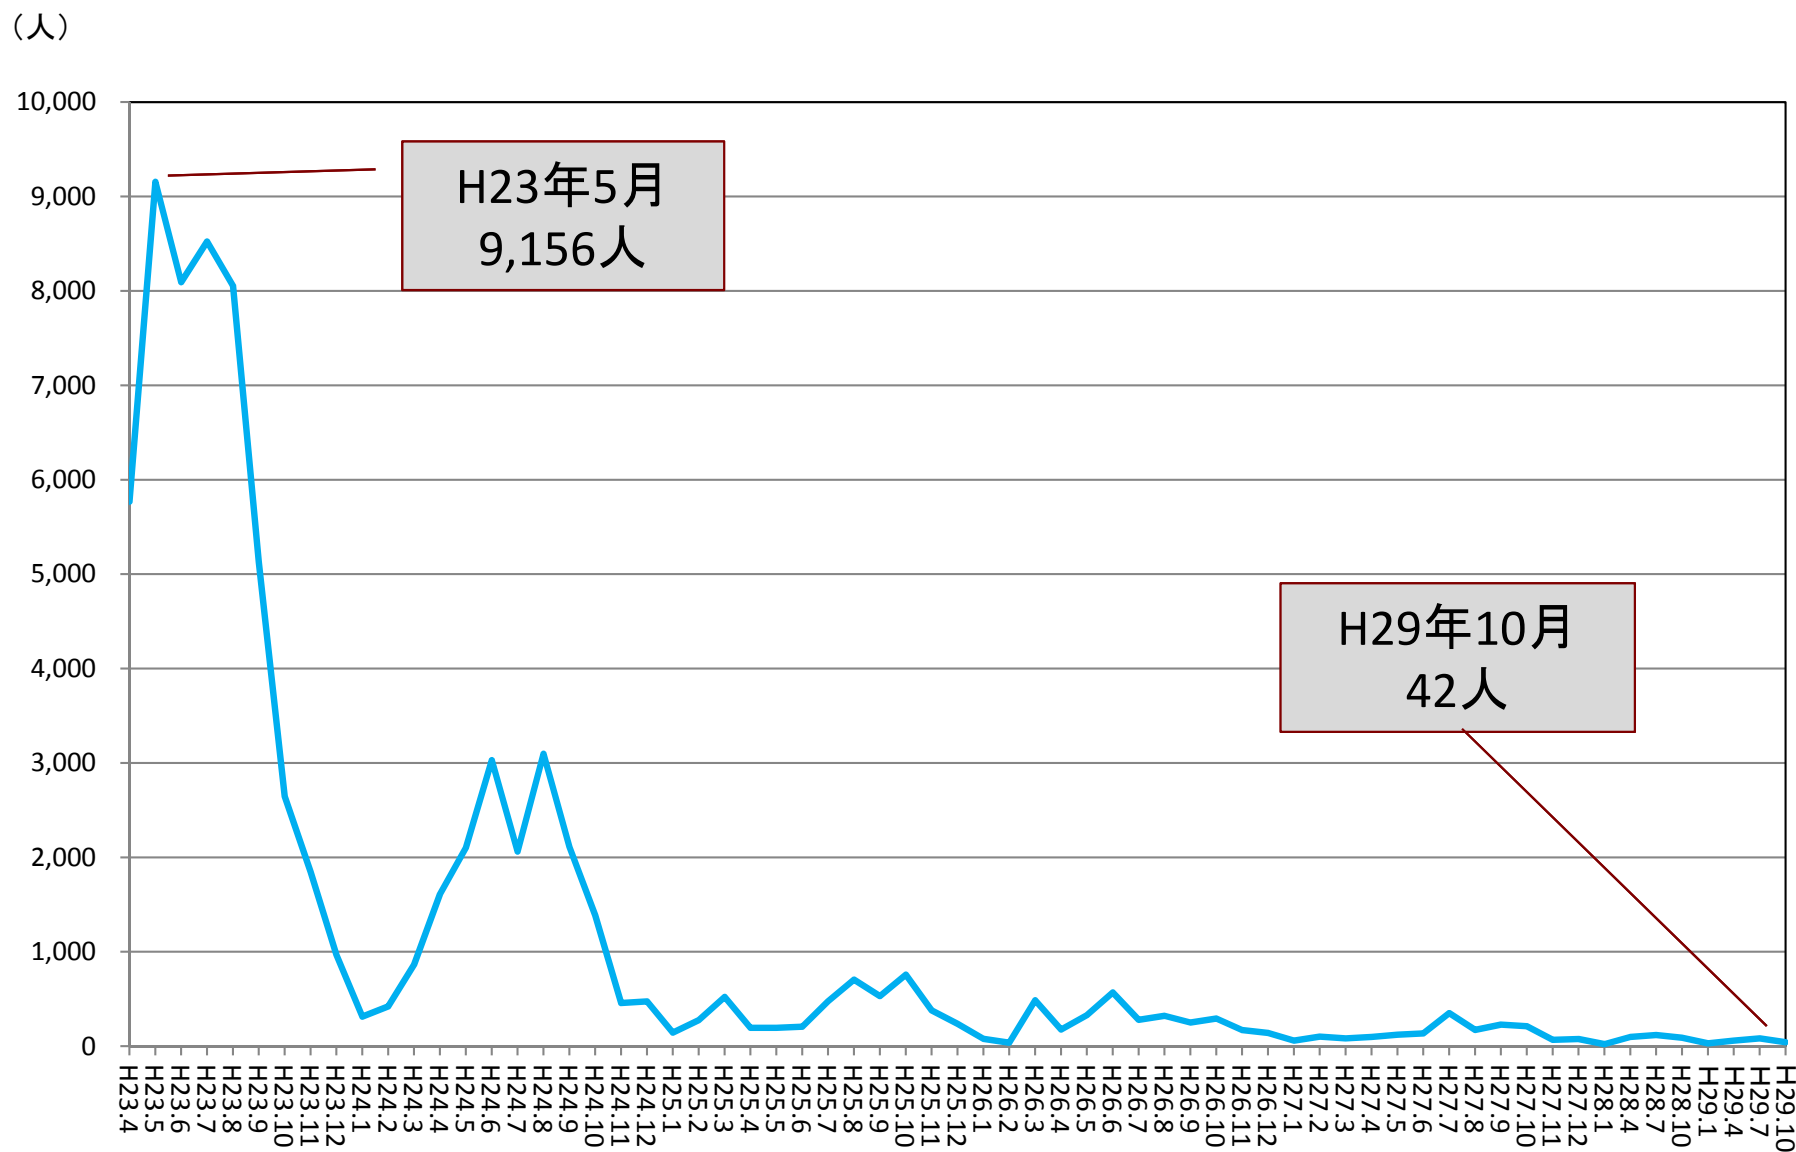


7. スケジュール (1) 面整備

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (事業復旧期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる復興への連結期間)		回復期間
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=1基	用地、設計等	★工事							
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=1基	用地、設計等	★工事							
	林野海岸	県	3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H24.10完成								
			4 吉里吉里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基	用地、設計等	★工事							
	漁港海岸	県	5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.0km、水門N=1基	用地、設計等	★工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石IC～釜石岡石IC、大槌IC～山田南IC H30供用予定 釜石北IC～大槌IC H31供用予定								
	復興関連道路	県	B (主) 大槌小国線	土坂の3	★工事								
漁港	漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=753m 他	■H28.3完成								
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、岸壁L=2,582m 他	■H28.3完成								
医療	病院	県	県立大槌病院	病院(RC造) 医師公會(RC造) 職員公會(RC造)	■H28.3完成								
教育	小学校	町	大槌小学校 安達小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	■H28.9完成								
	中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転	■H28.9完成								
復興まちづくり	まちづくり連携道路	県	1 (一)吉里吉里釜石線	赤浜	■H29.9.29供用開始								

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成29年9月30日(平成29年11月7日公表))」より



(2) 災害公営住宅

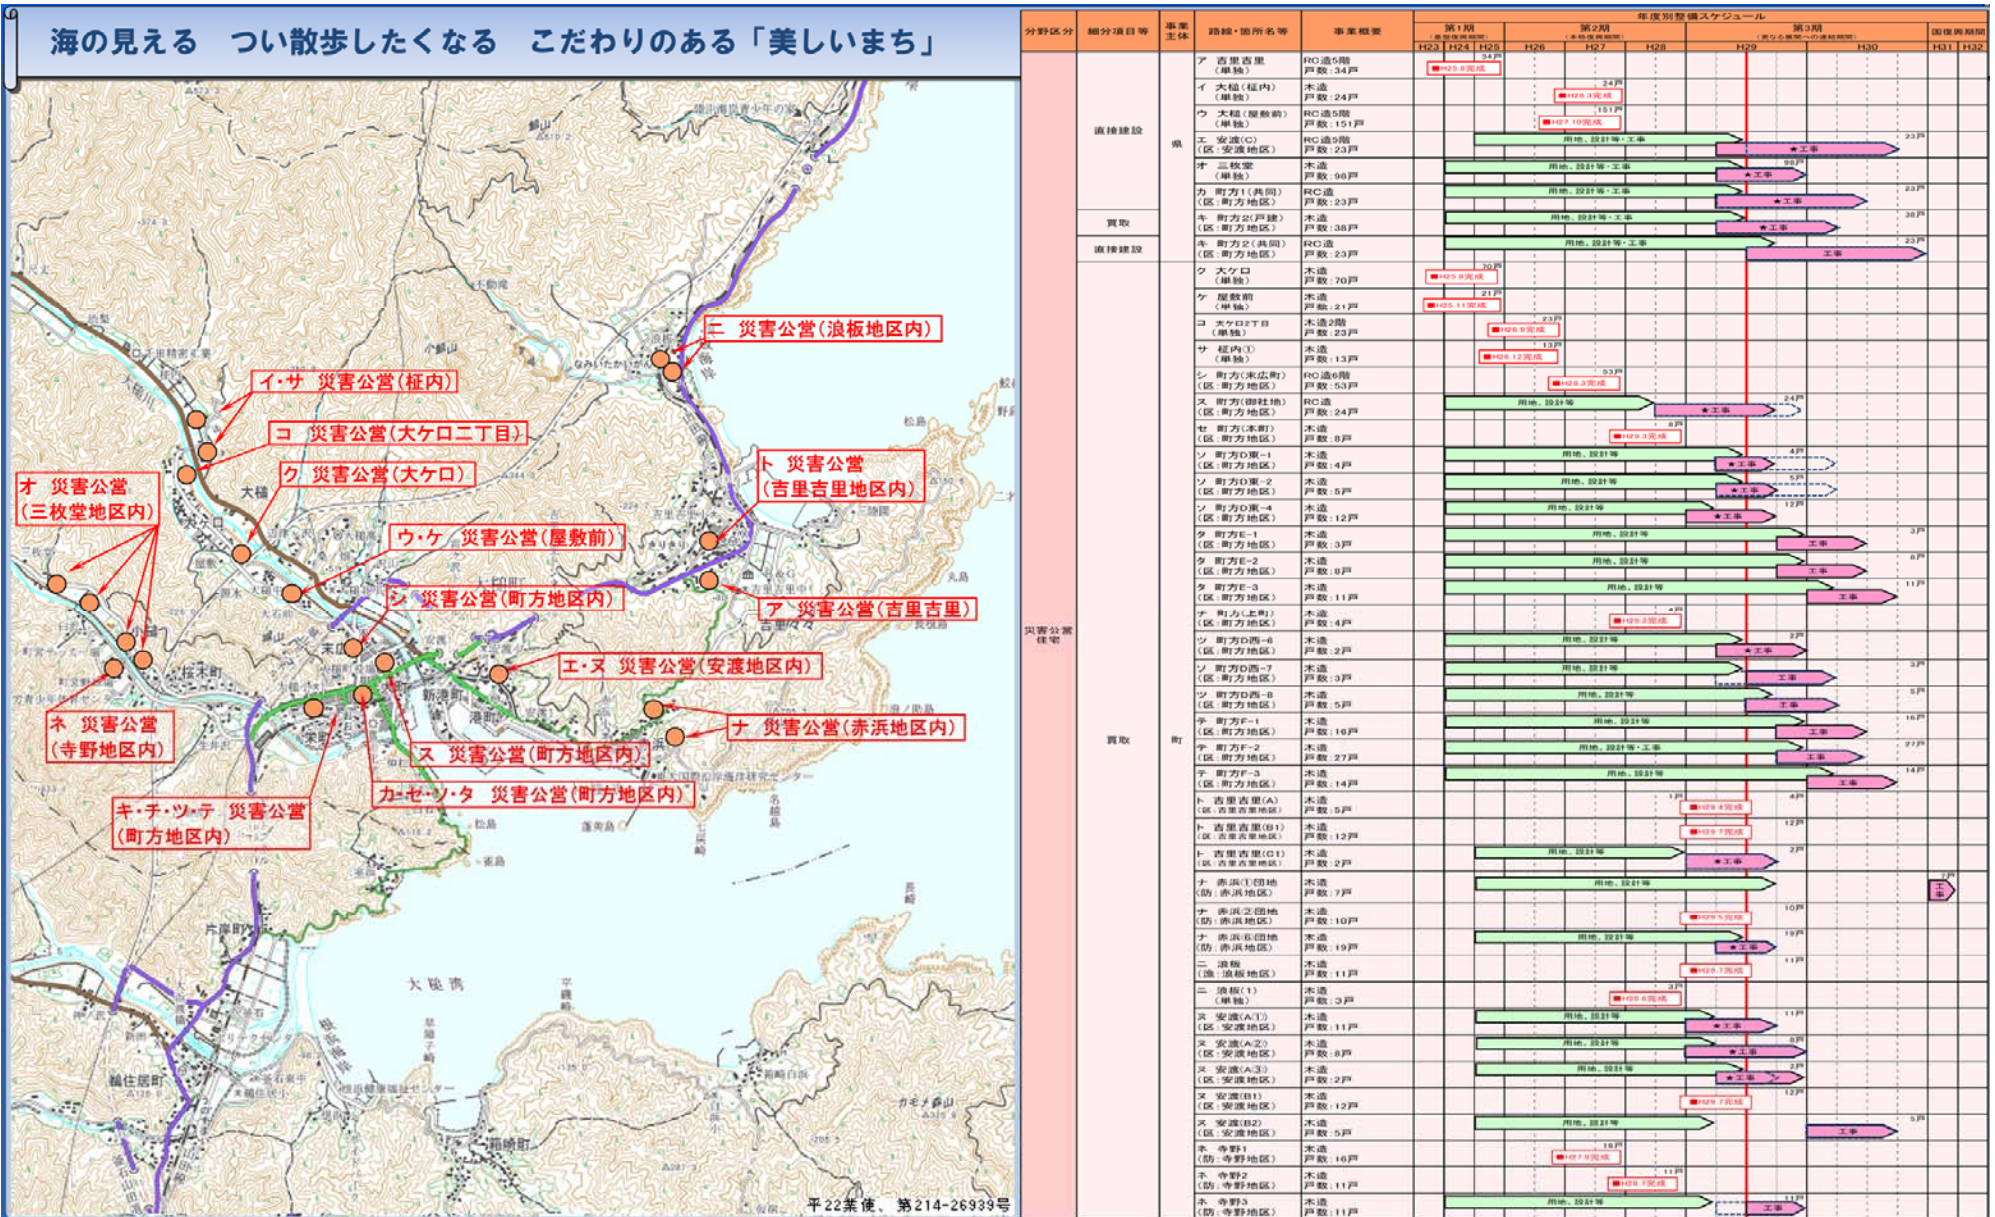

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成29年9月30日(平成29年11月7日公表))」より

IV 各地区の土地利用の状況

1. 町方地域、小枕・伸松地域

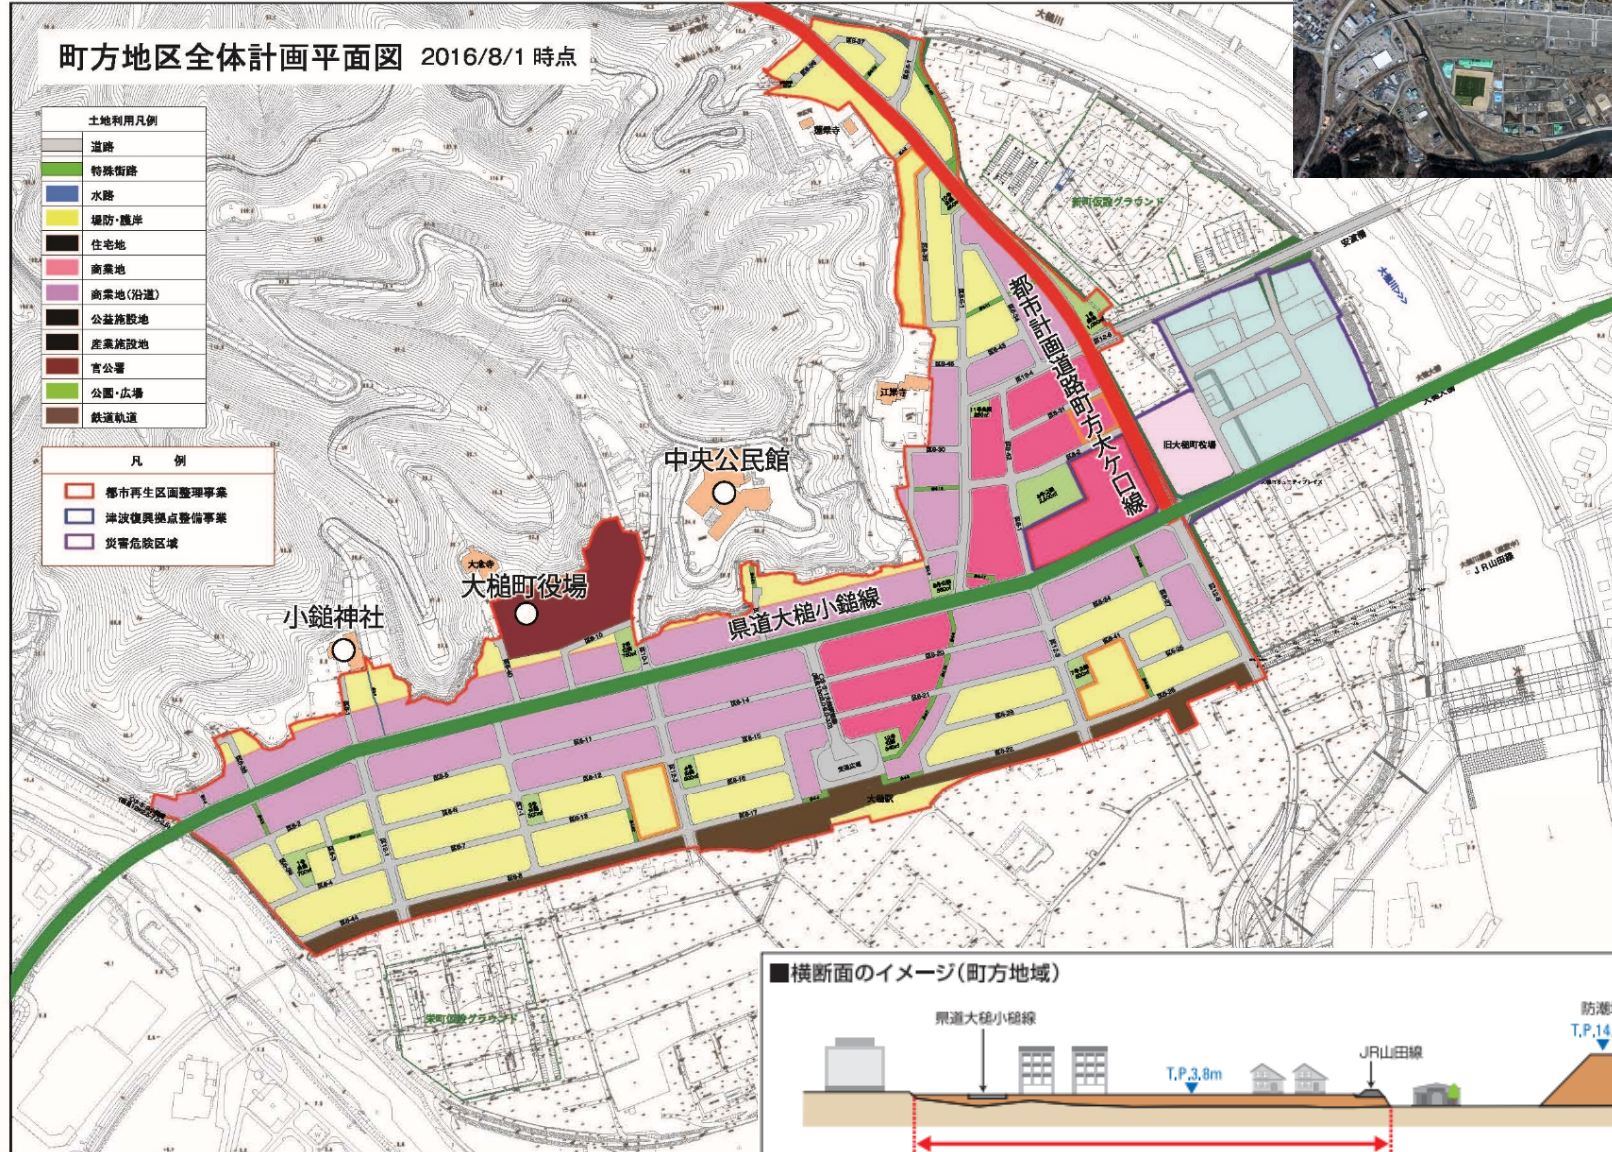


IV 各地区の土地利用の状況

1. 町方地域、小枕・伸松地域 (1) 土地区画整理事業

平成29年10月1日現在


県道北側及び南側沿道の一部完成

- ・県道南側沿道宅地の一部完成
- ・残る県道南側について整備工事を実施

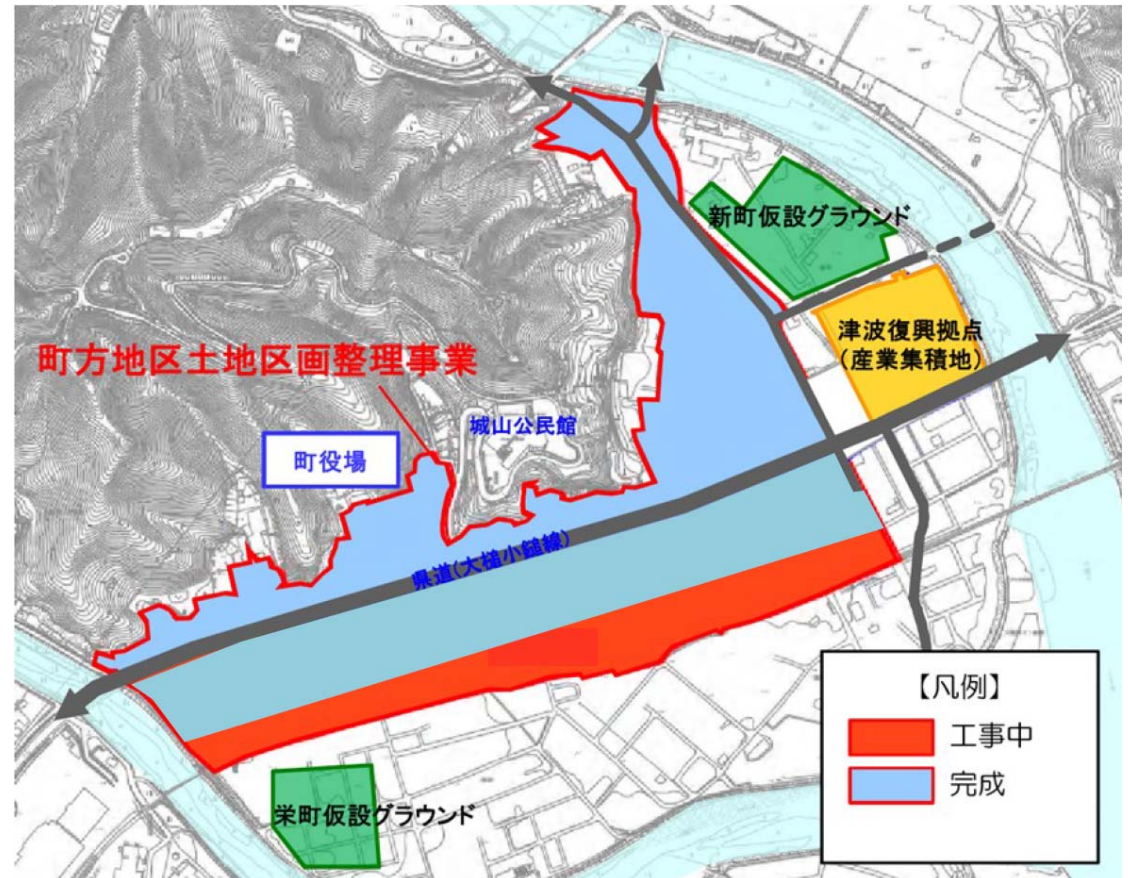


- 県道(大槌小鎚線)が完成し(平成28年7月2日開通)、県道から北側及び南側の県道沿いの一部の宅地が完成。
- 県道から南側は北から南へと宅地整備(盛土造成、上下水道工事など)を展開しており、H29年度で造成完了予定。

(2) 防災集団移転促進事業

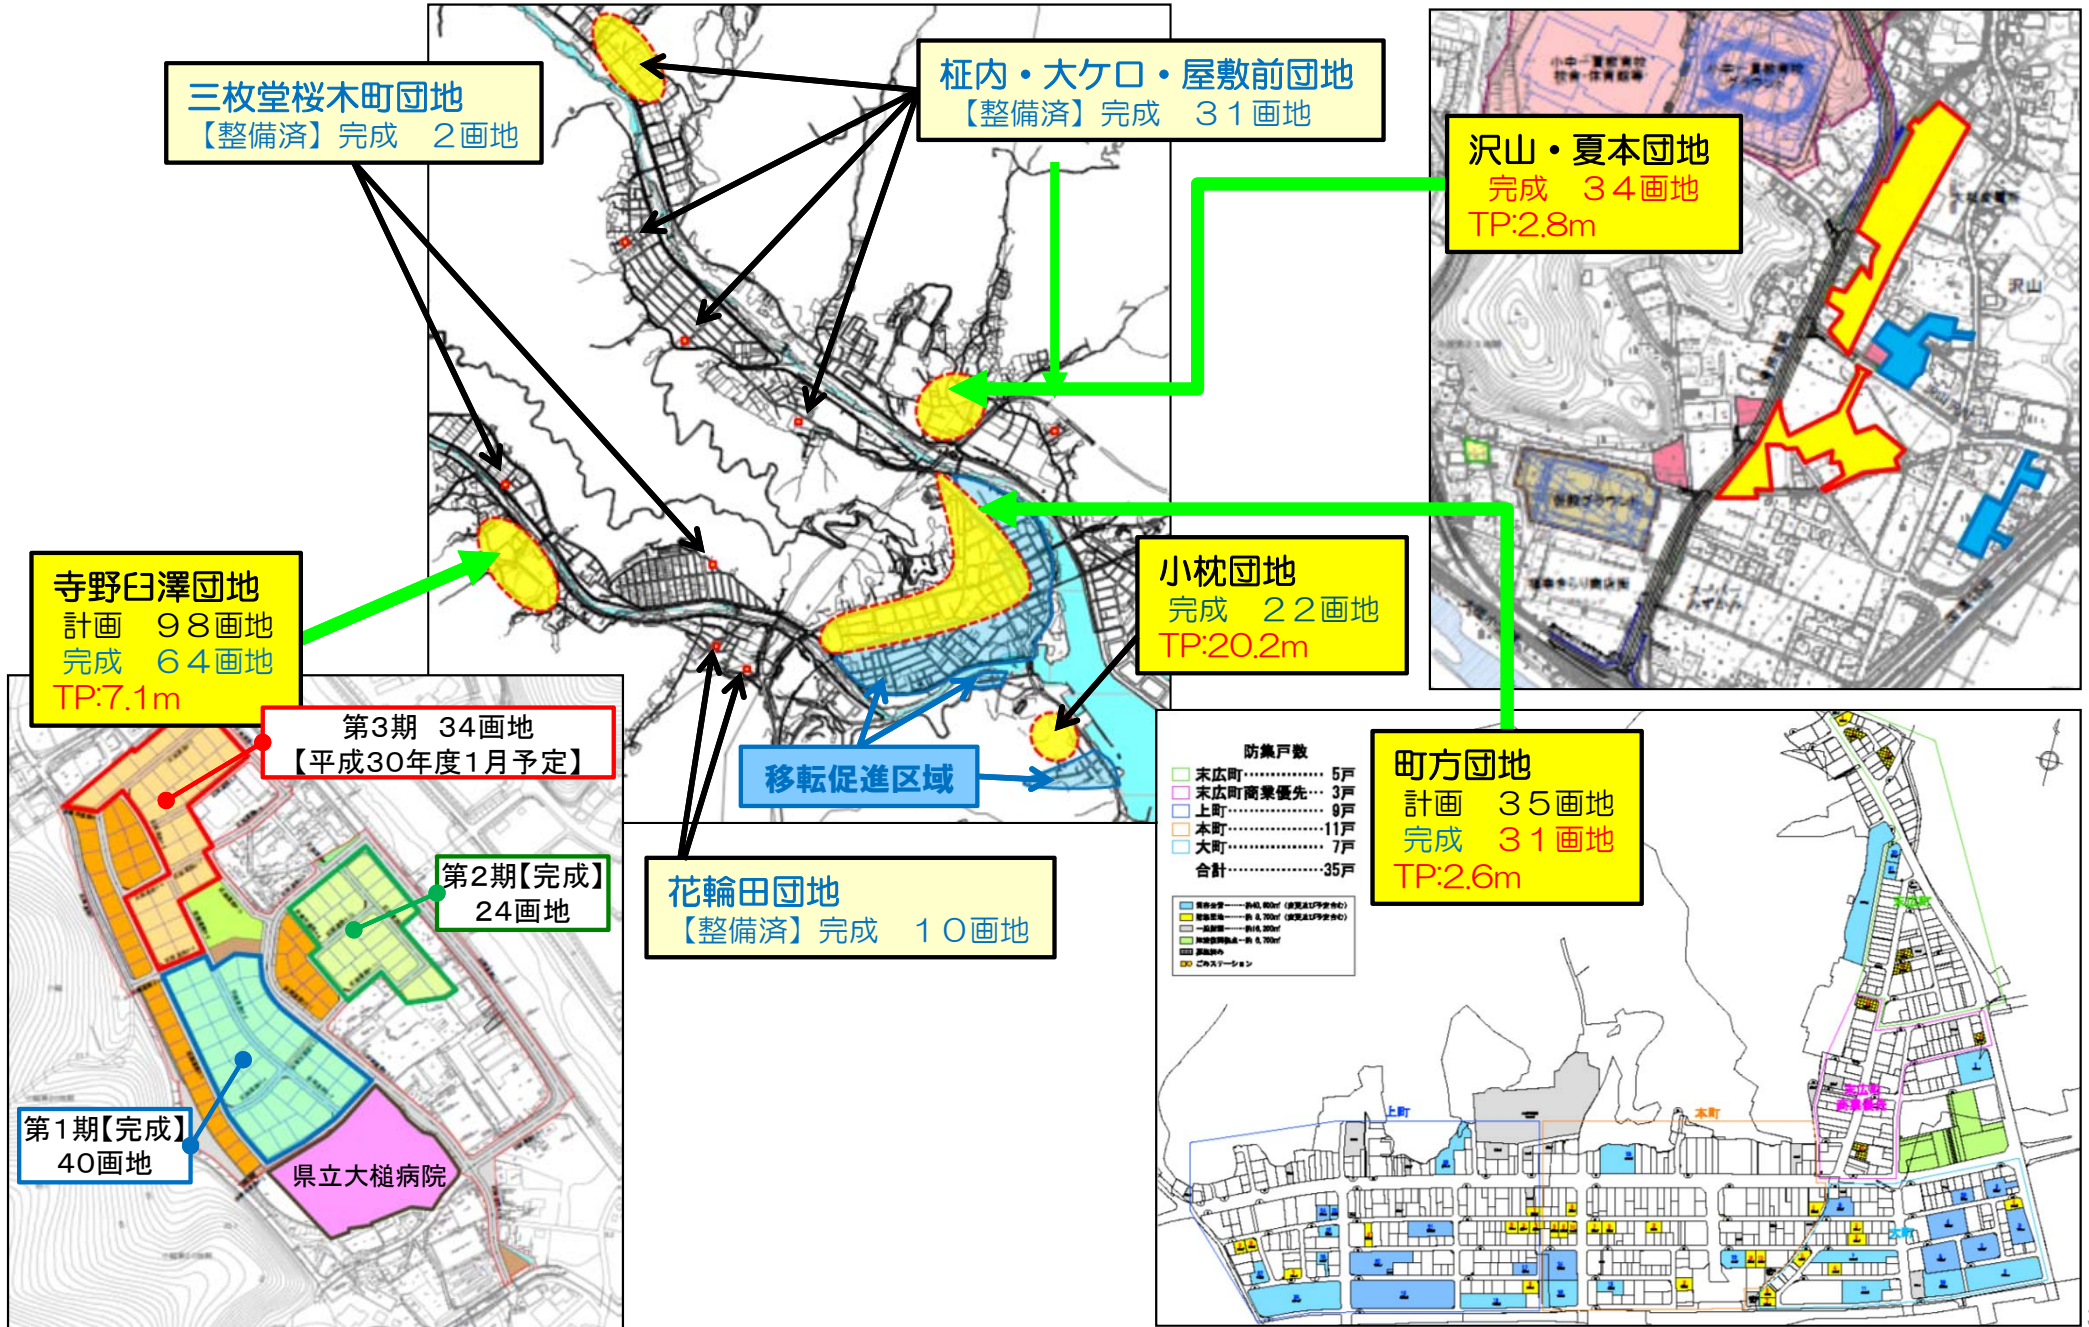

(2) 防災集団移転促進事業

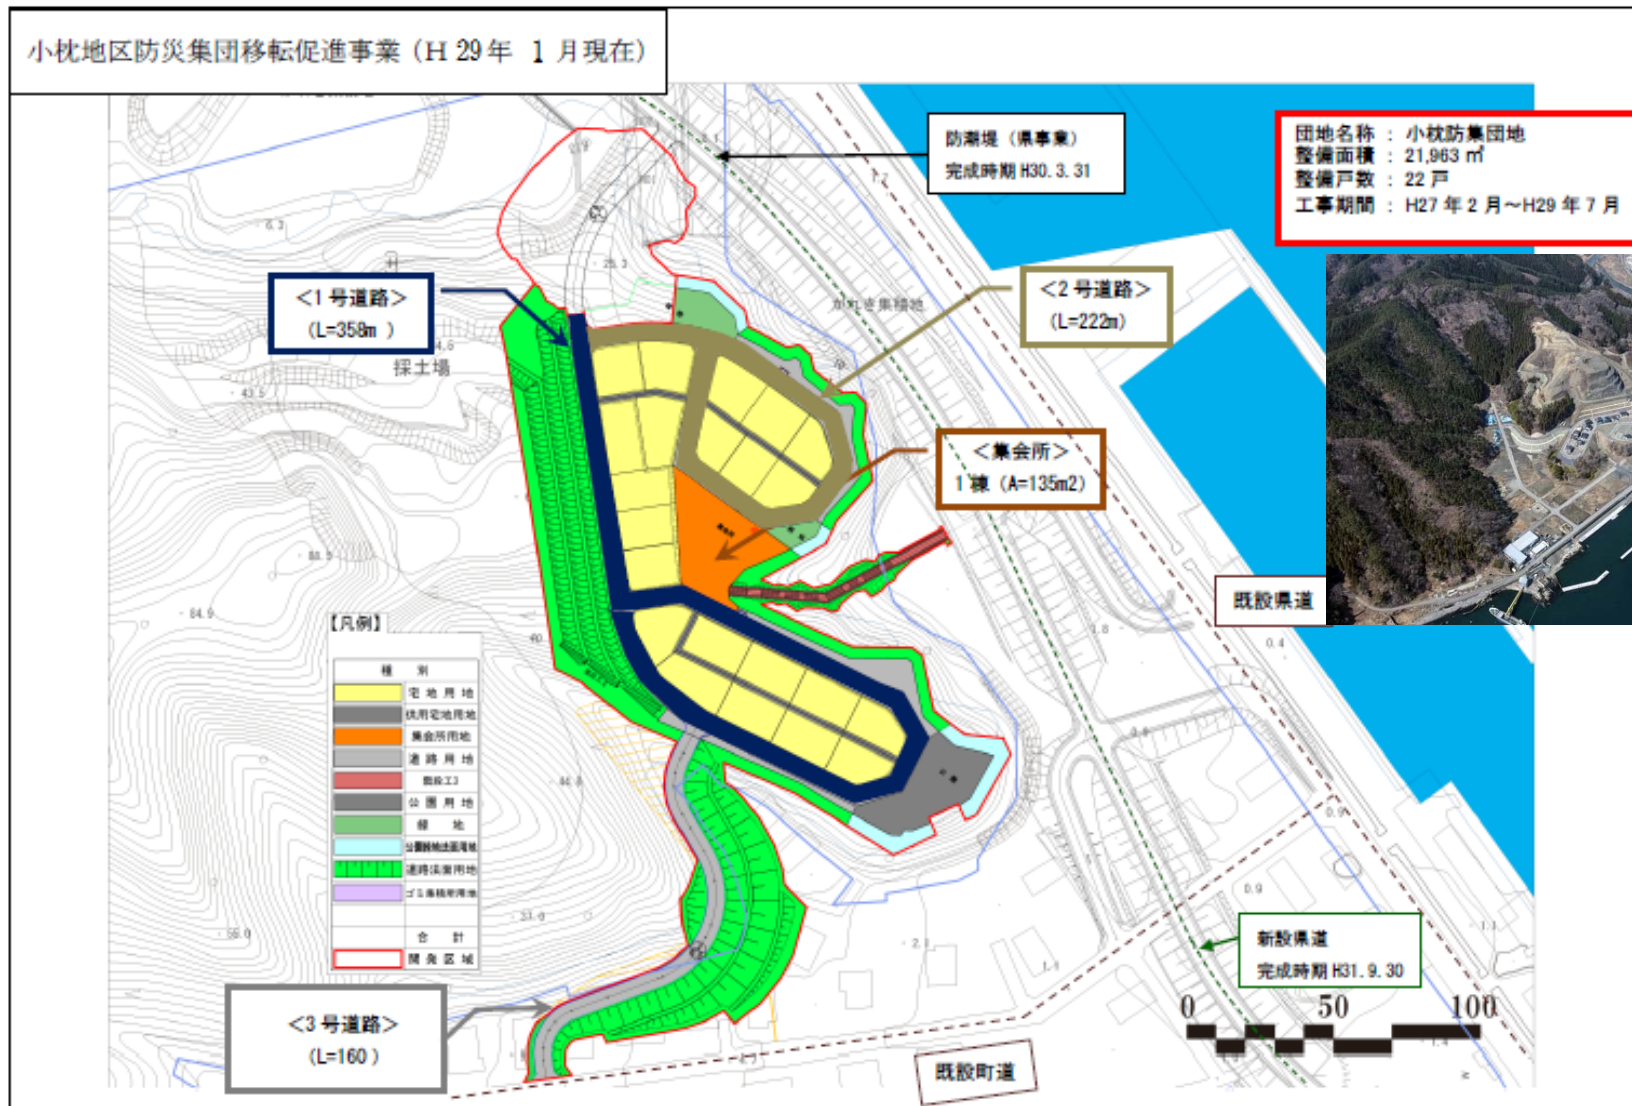


➤ 小枕団地の引渡: 平成28年12月22日

TP:20.2m

(3) 災害公営住宅

町方地区

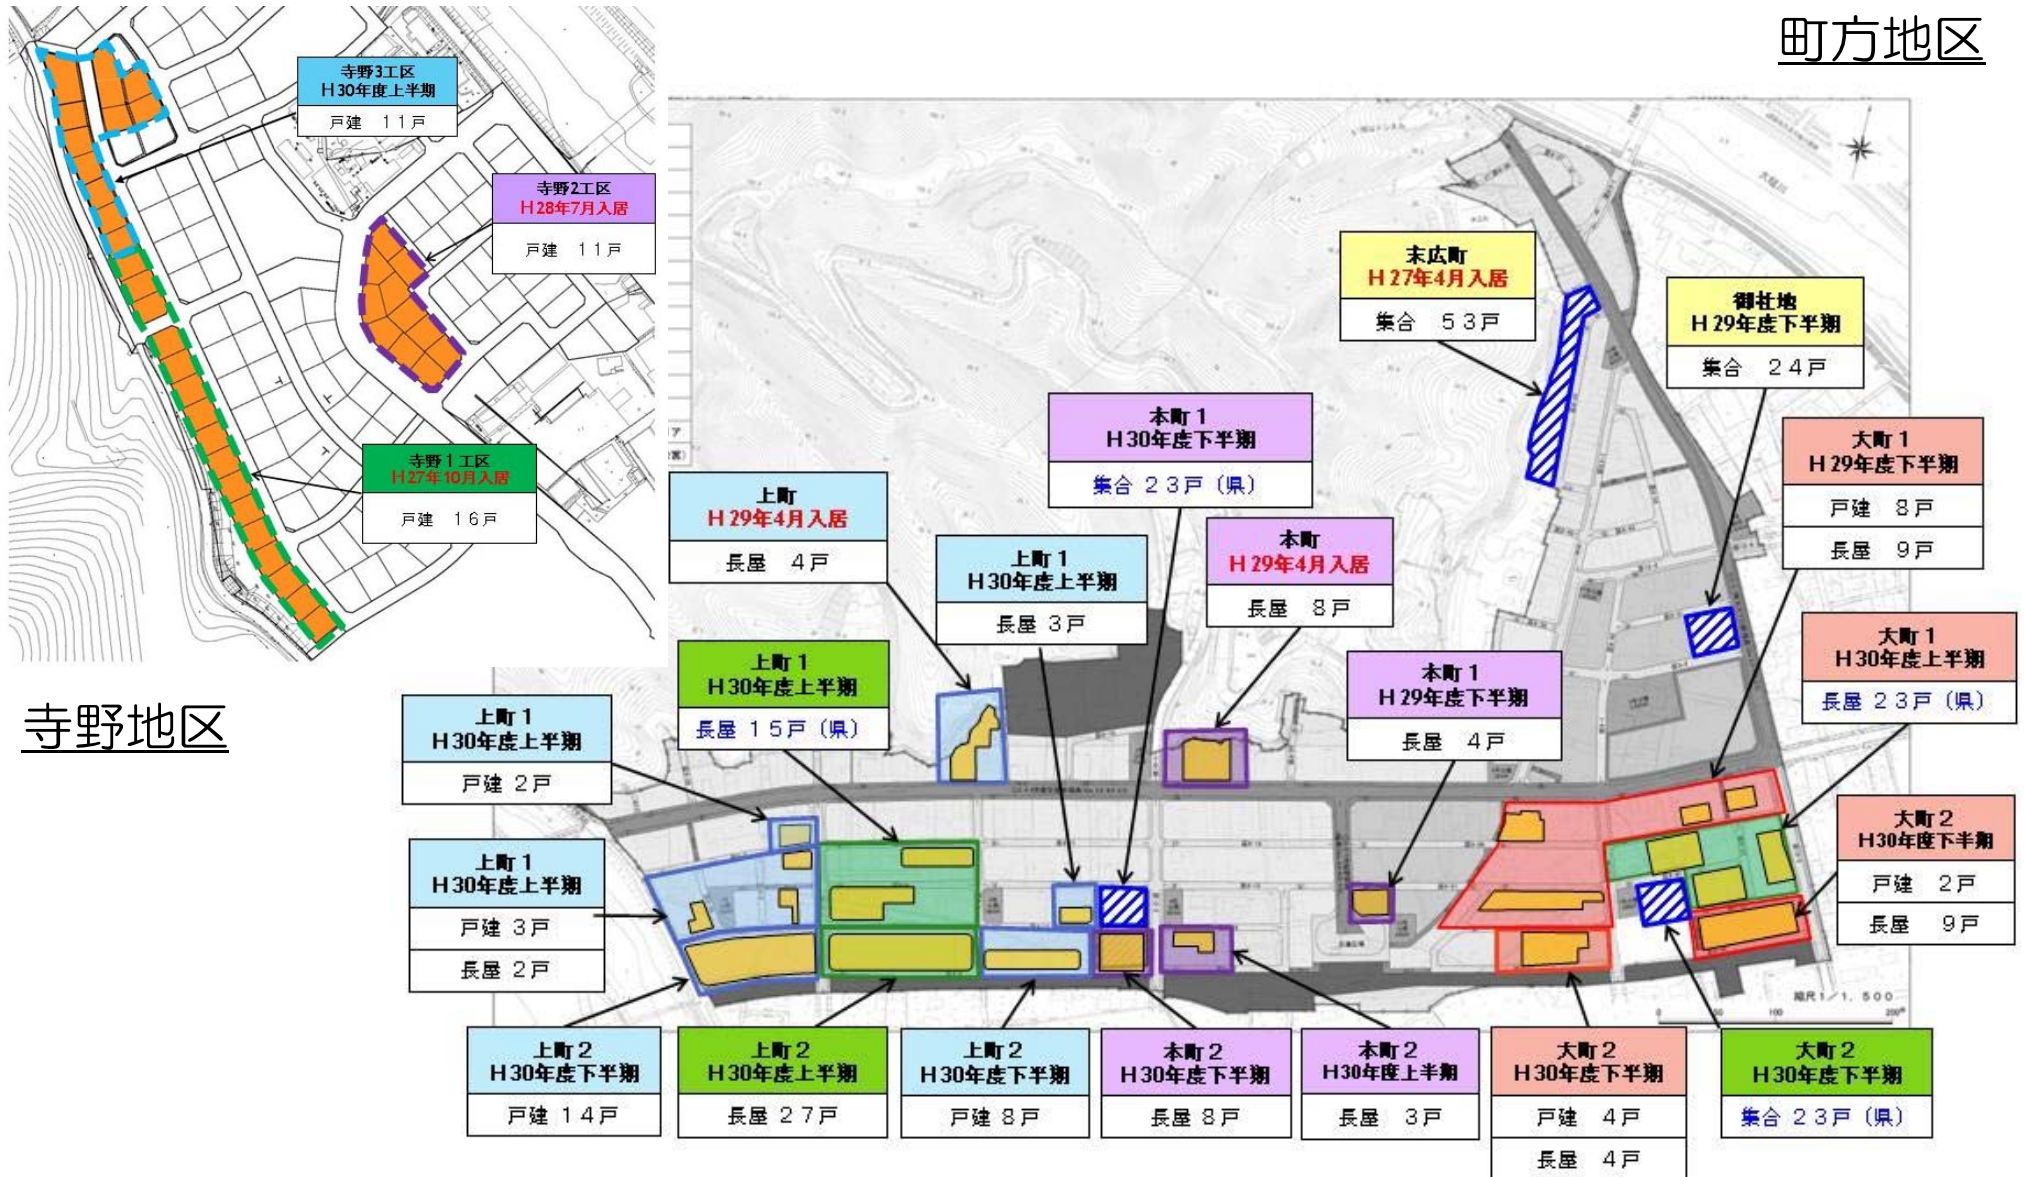

➤ 御社地エリア災害公営住宅：平成30年2月入居開始予定。



(4) 津波復興拠点整備事業




町方地区津波復興拠点整備事業(4.4ha)

- 先行街区においては、平成25年11月に造成工事が完成し、県道大槌小槌線沿いで営業していた店舗などが仮設店舗にて営業中。
- A-E区画においては、平成26年12月に造成工事が概ね完成し、23事業者の入居が決定。平成29年1月現在、11事業者が営業を開始している。


2. 安渡地域

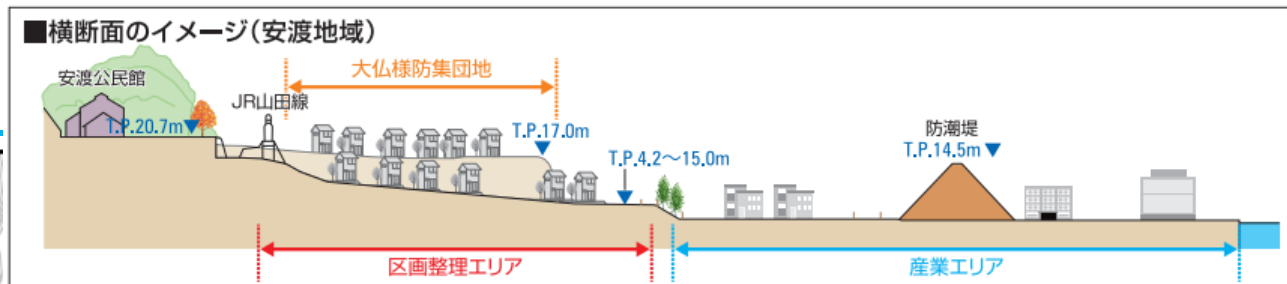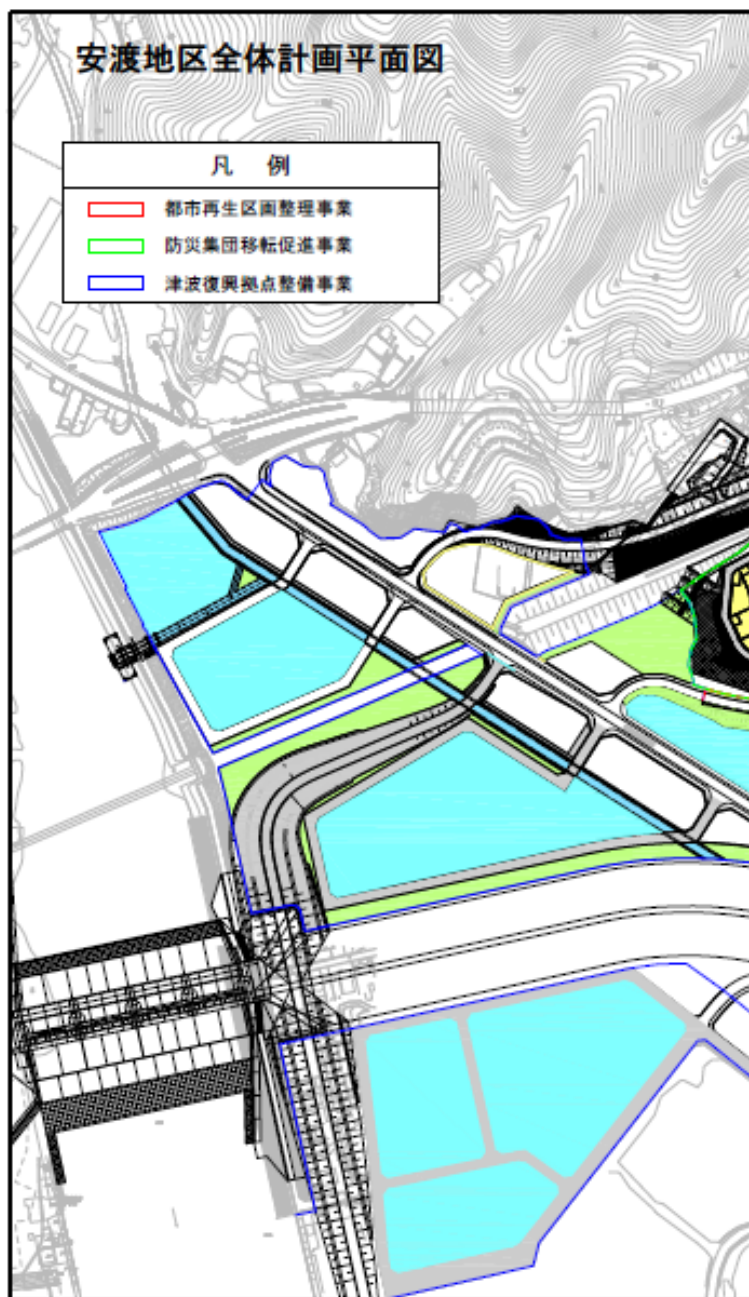


2. 安渡地域 (1) 土地区画整理事業

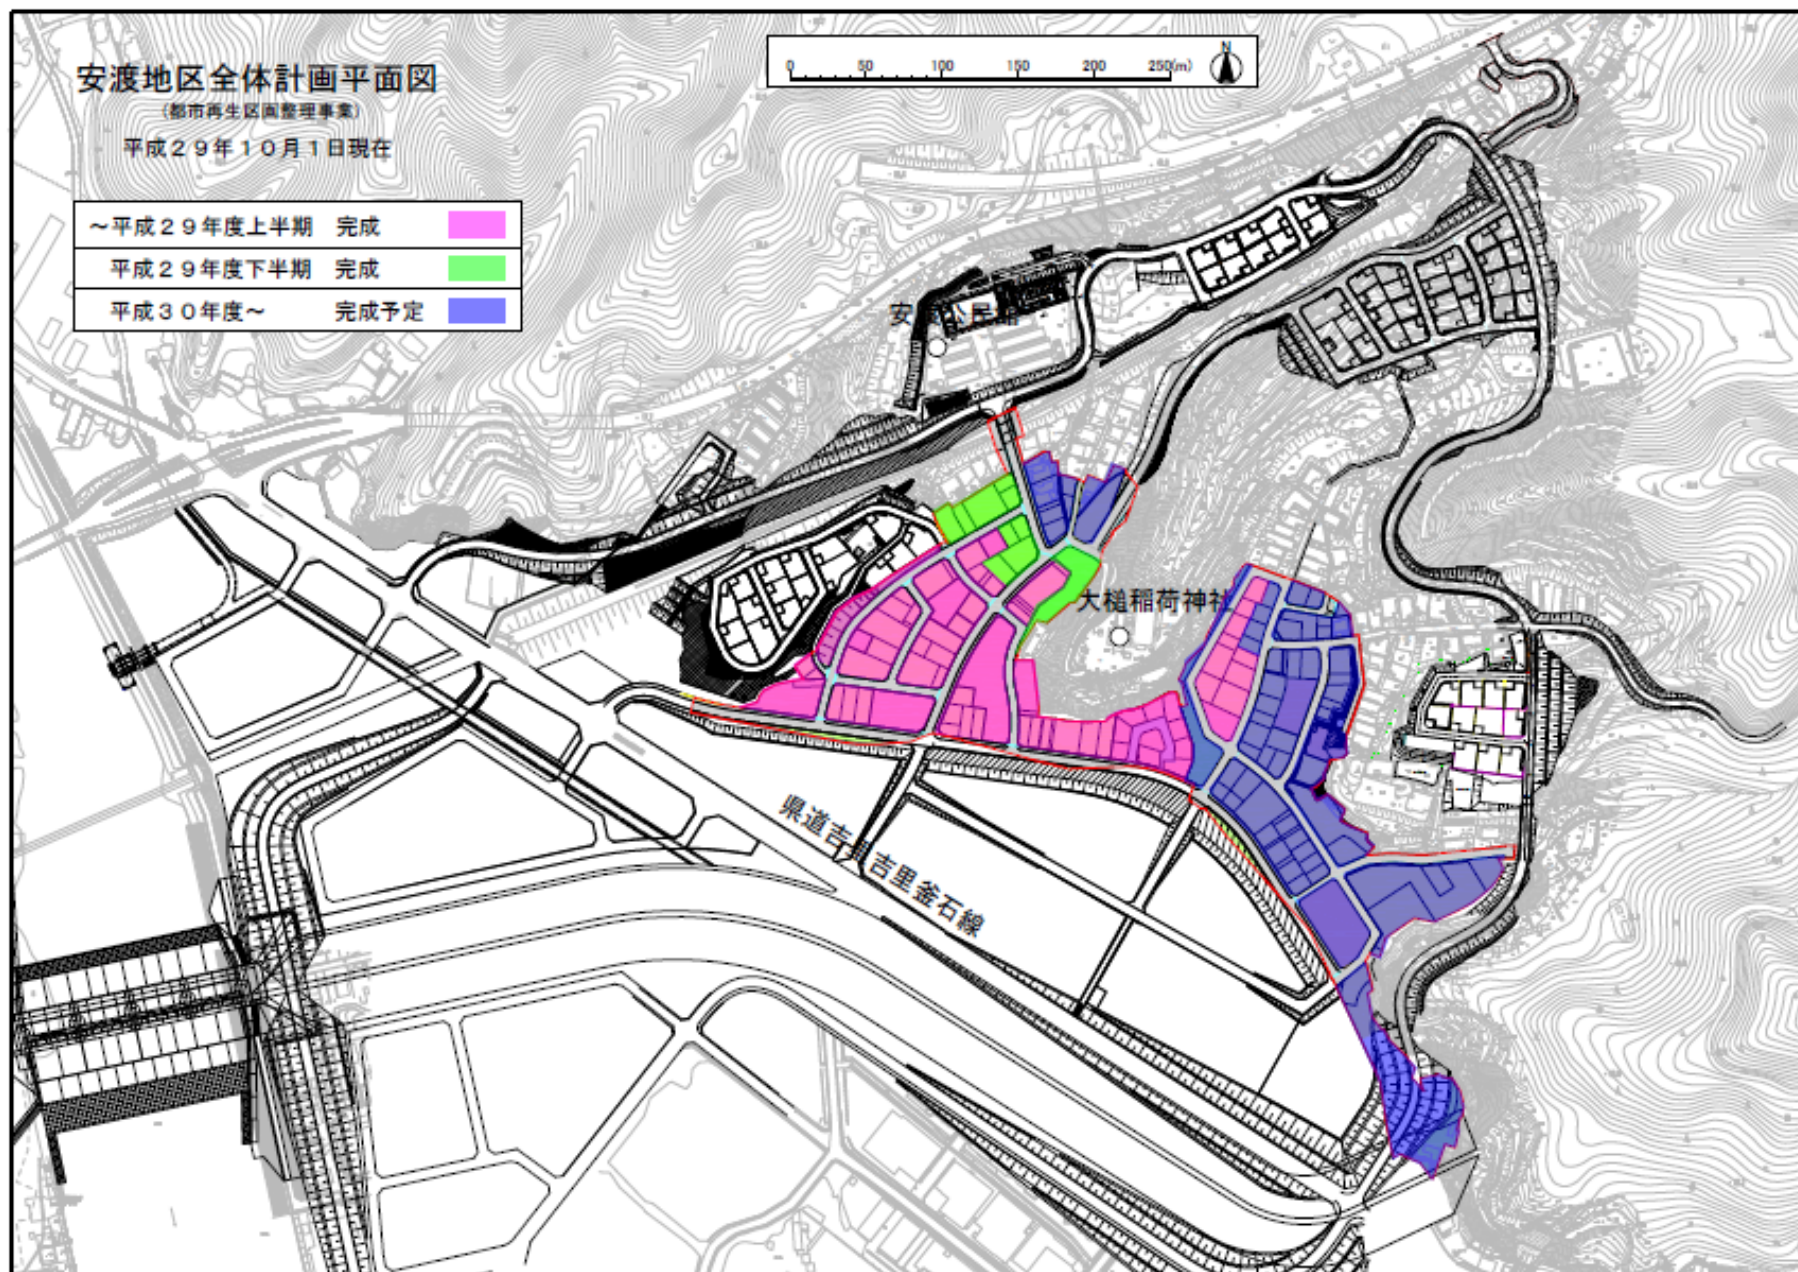

(2) 防災集団移転促進事業

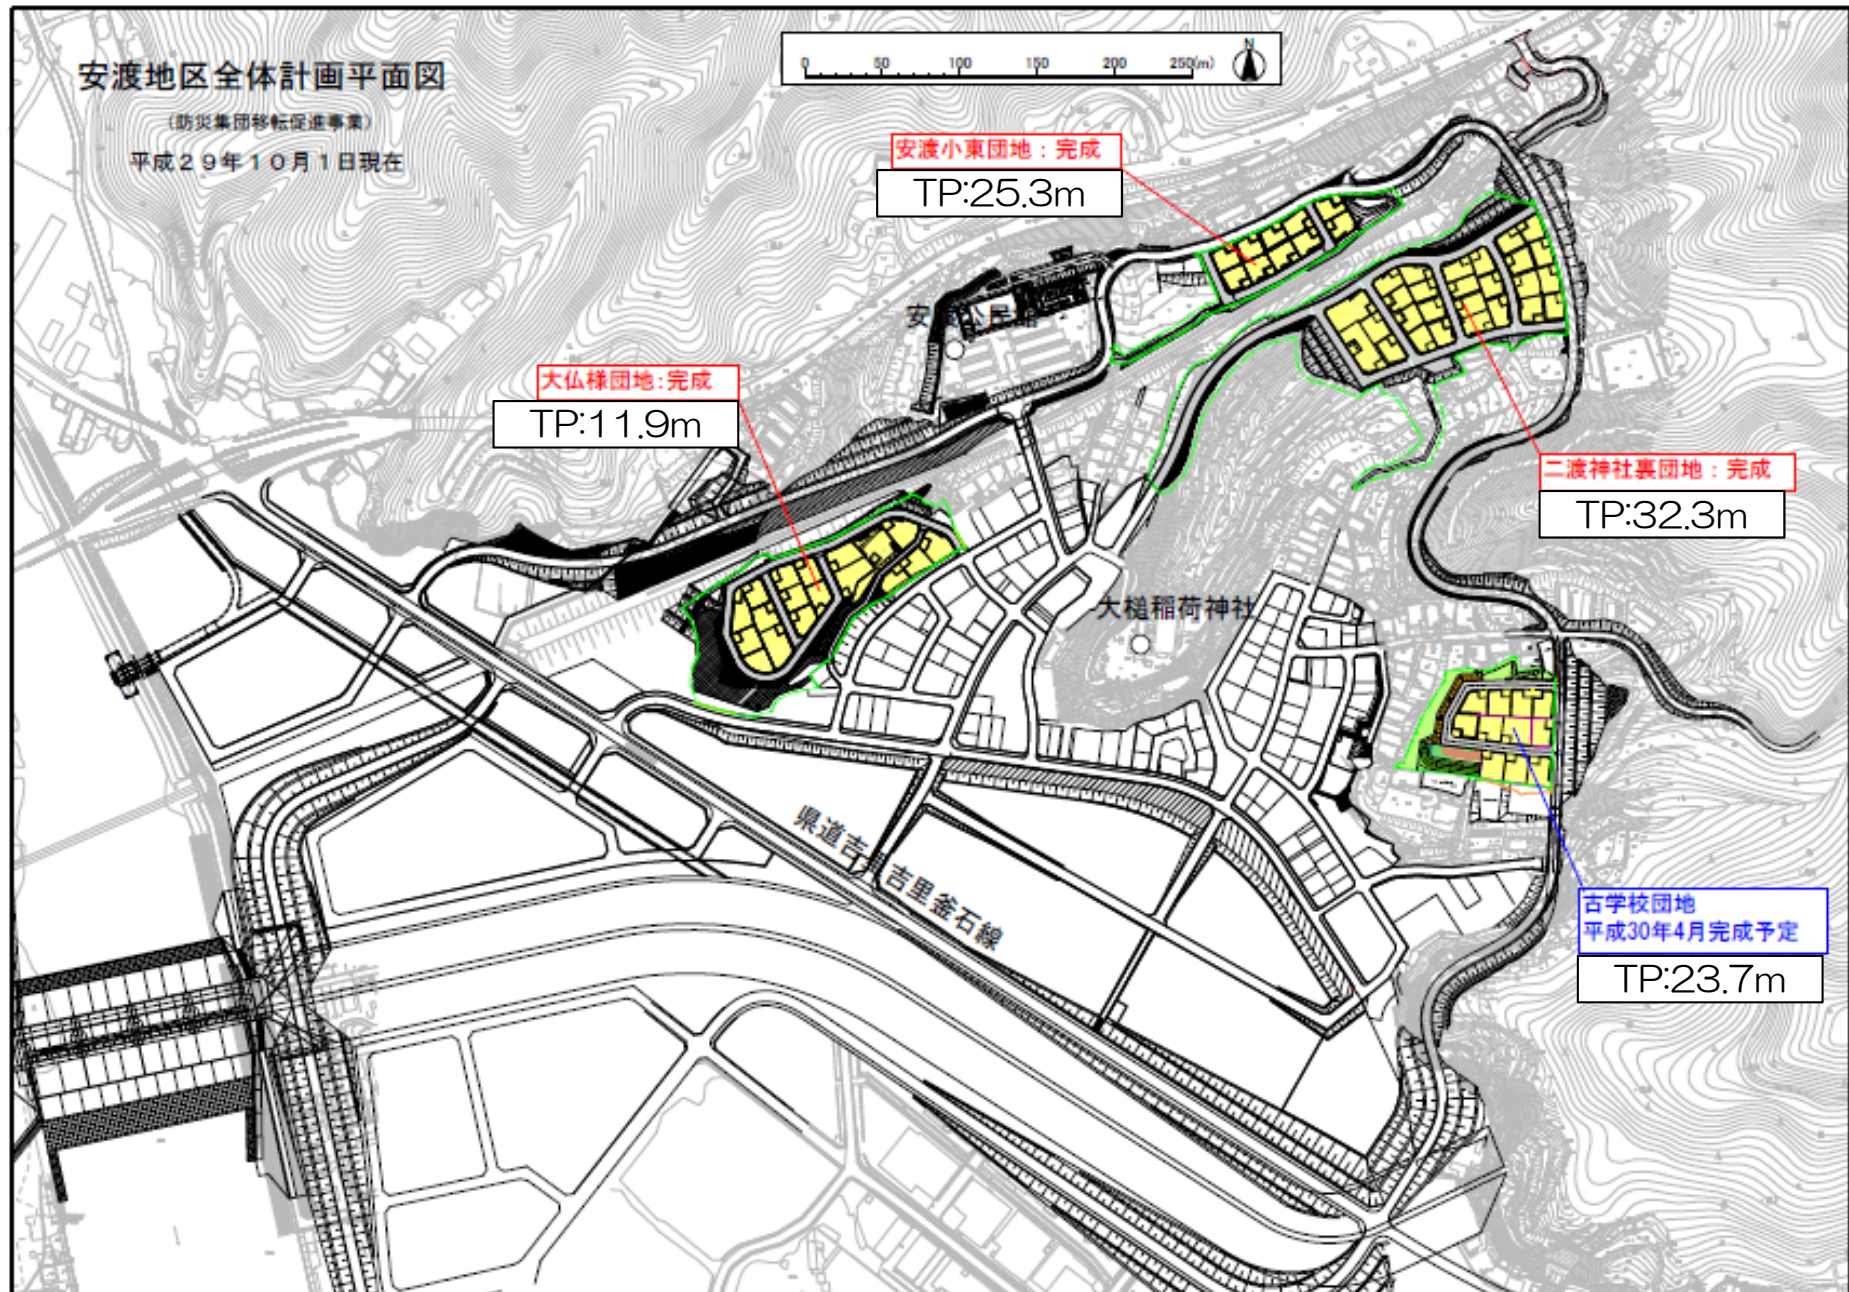


(3) 災害公営住宅

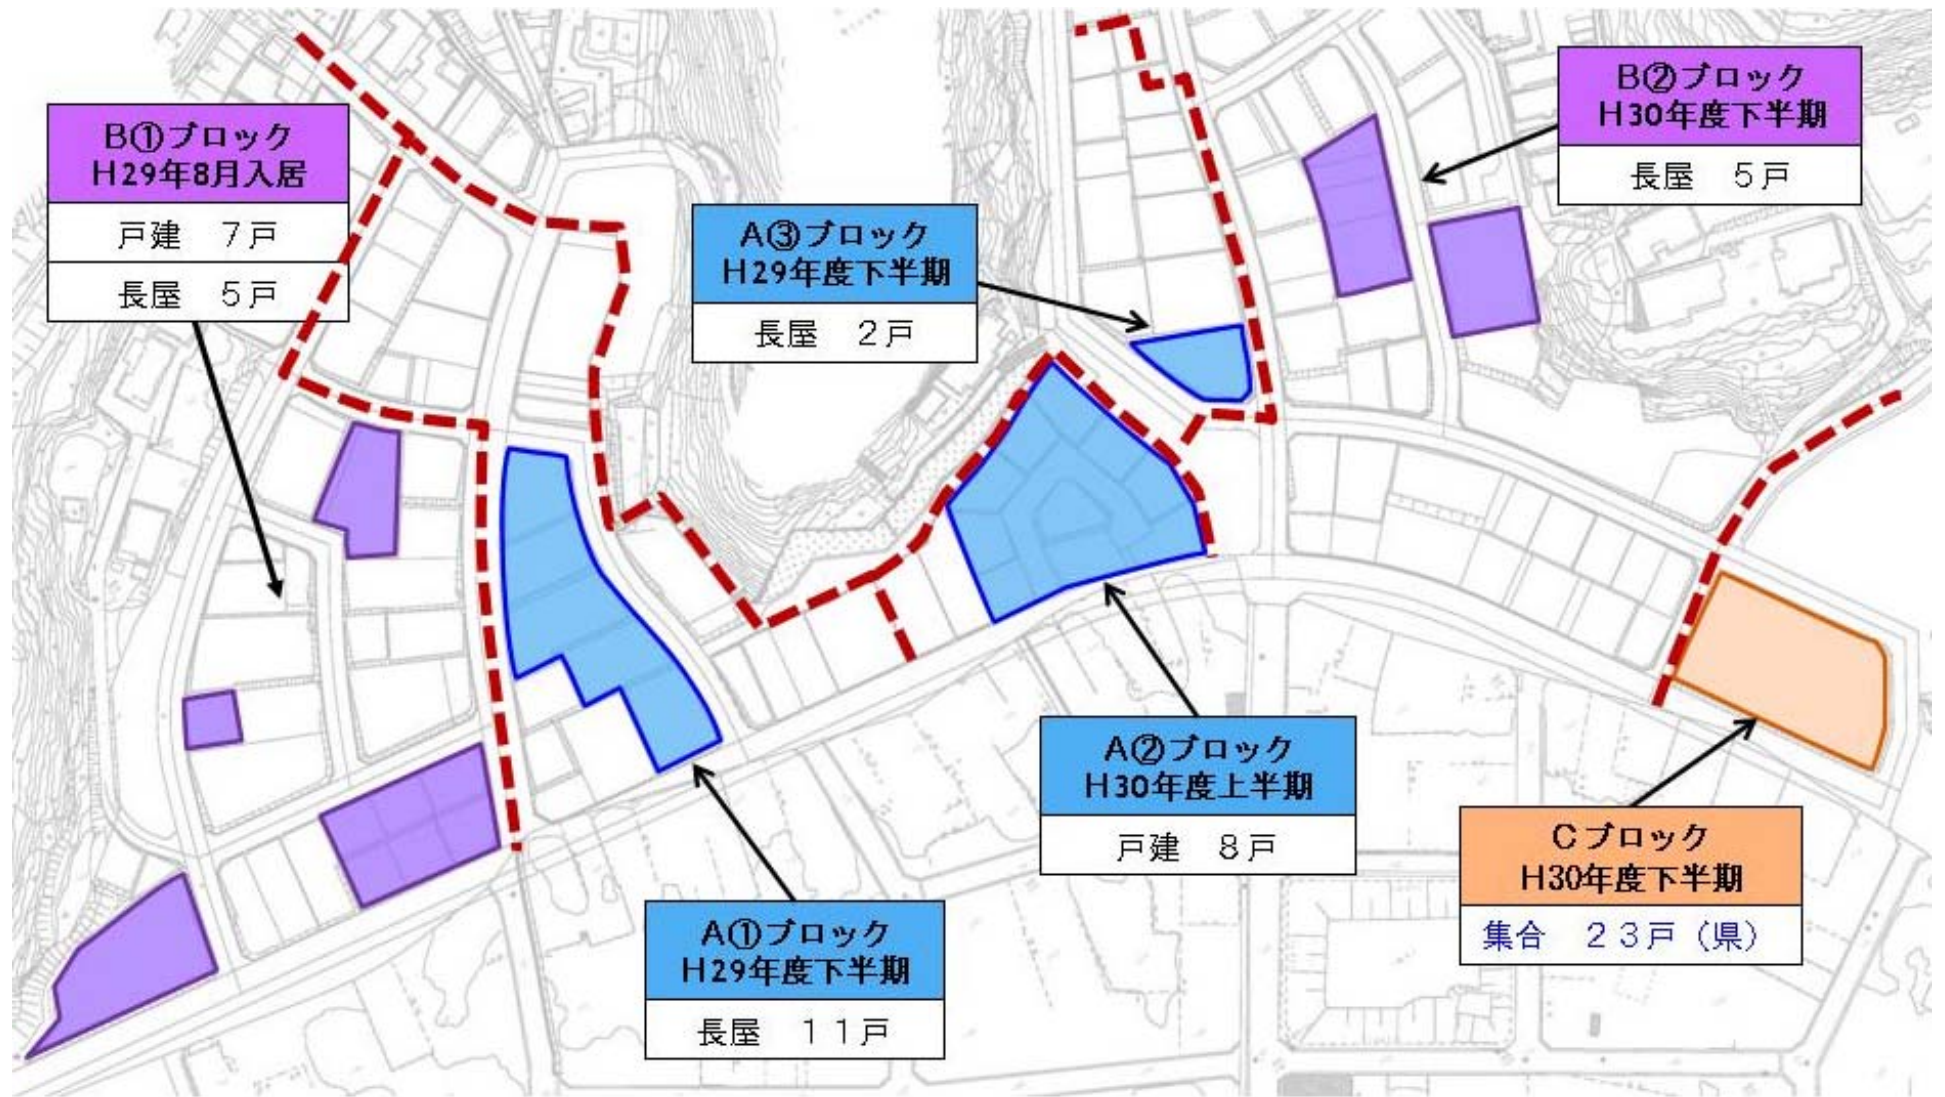

※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期


(4) 津波復興拠点整備事業

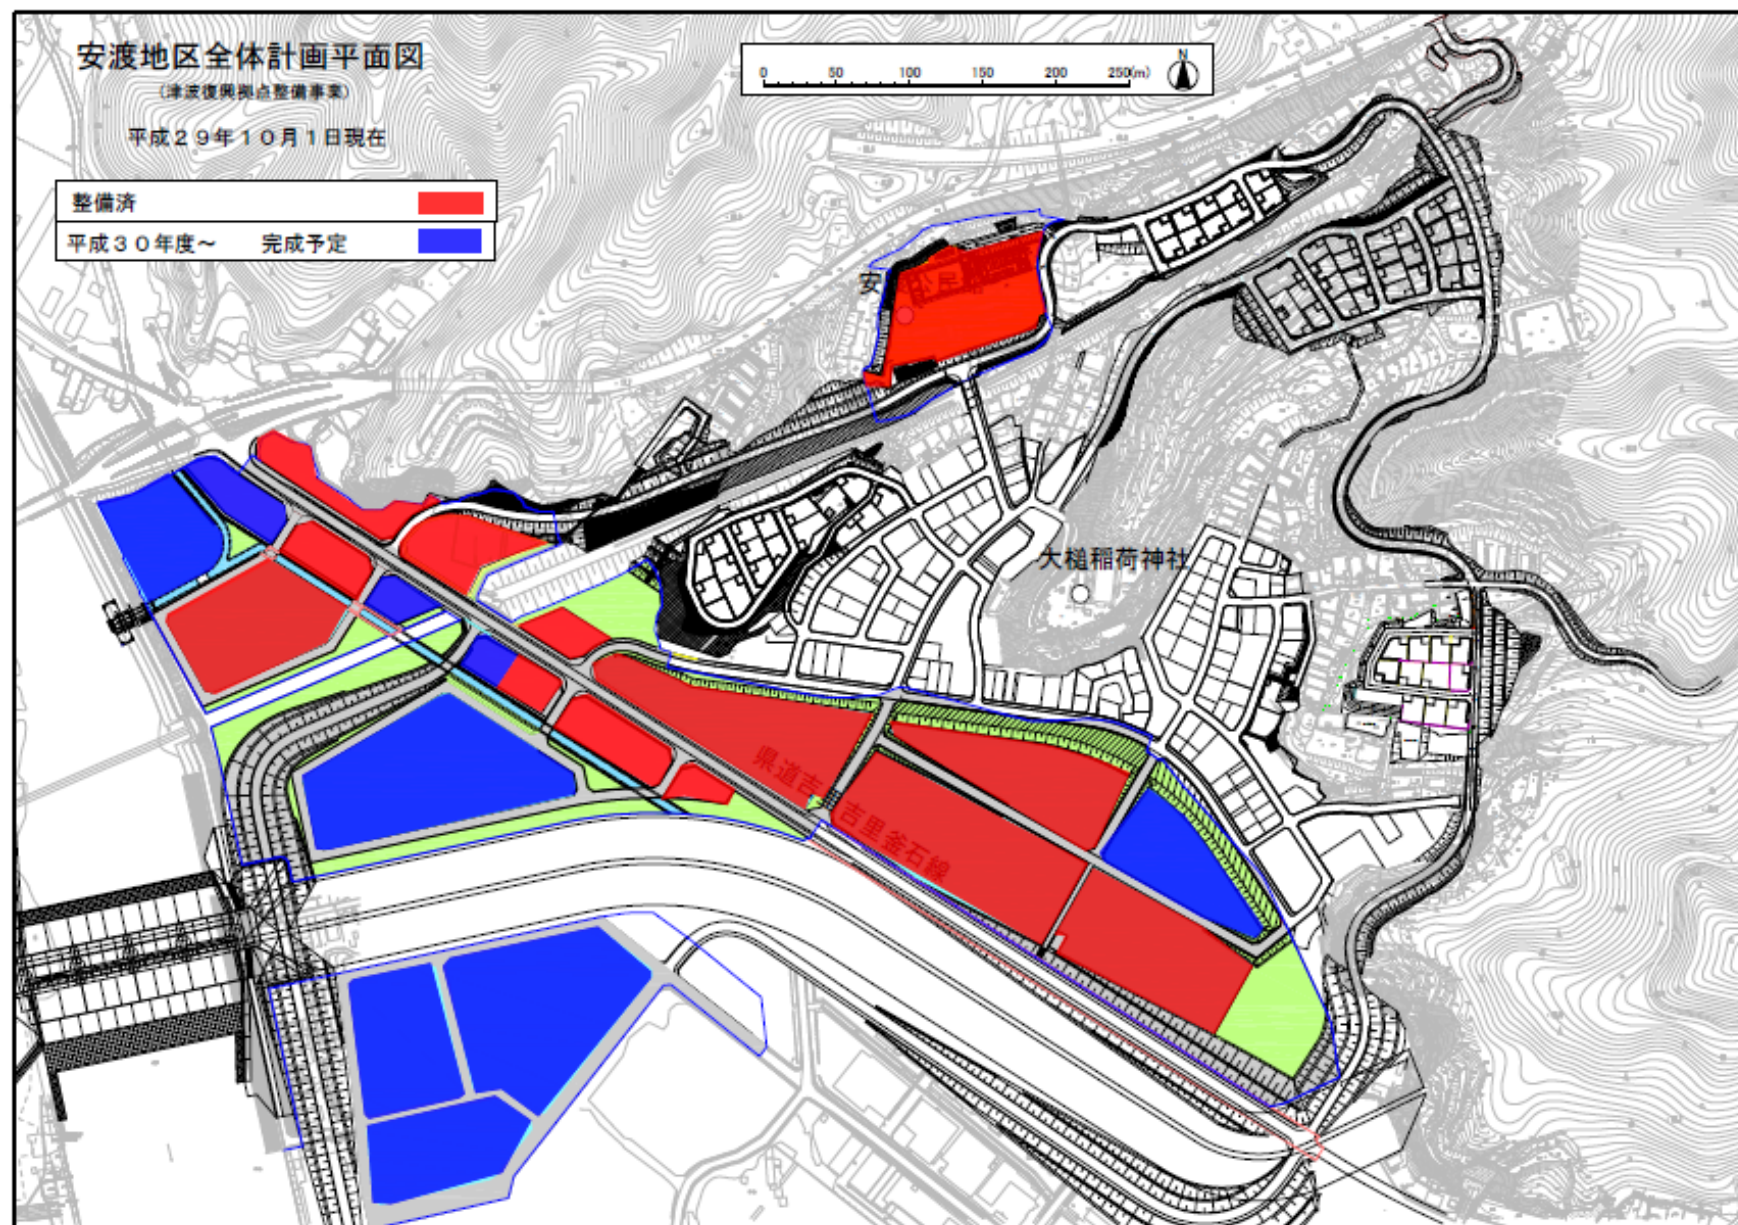


安渡地区津波復興拠点事業(19.6ha)

3. 赤浜地域 (1)土地区画整理事業 (2)防災集団移転促進事業 (3)漁業集落防災機能強化事業

赤浜地区 施工展開図
(平成29年10月1日現在)

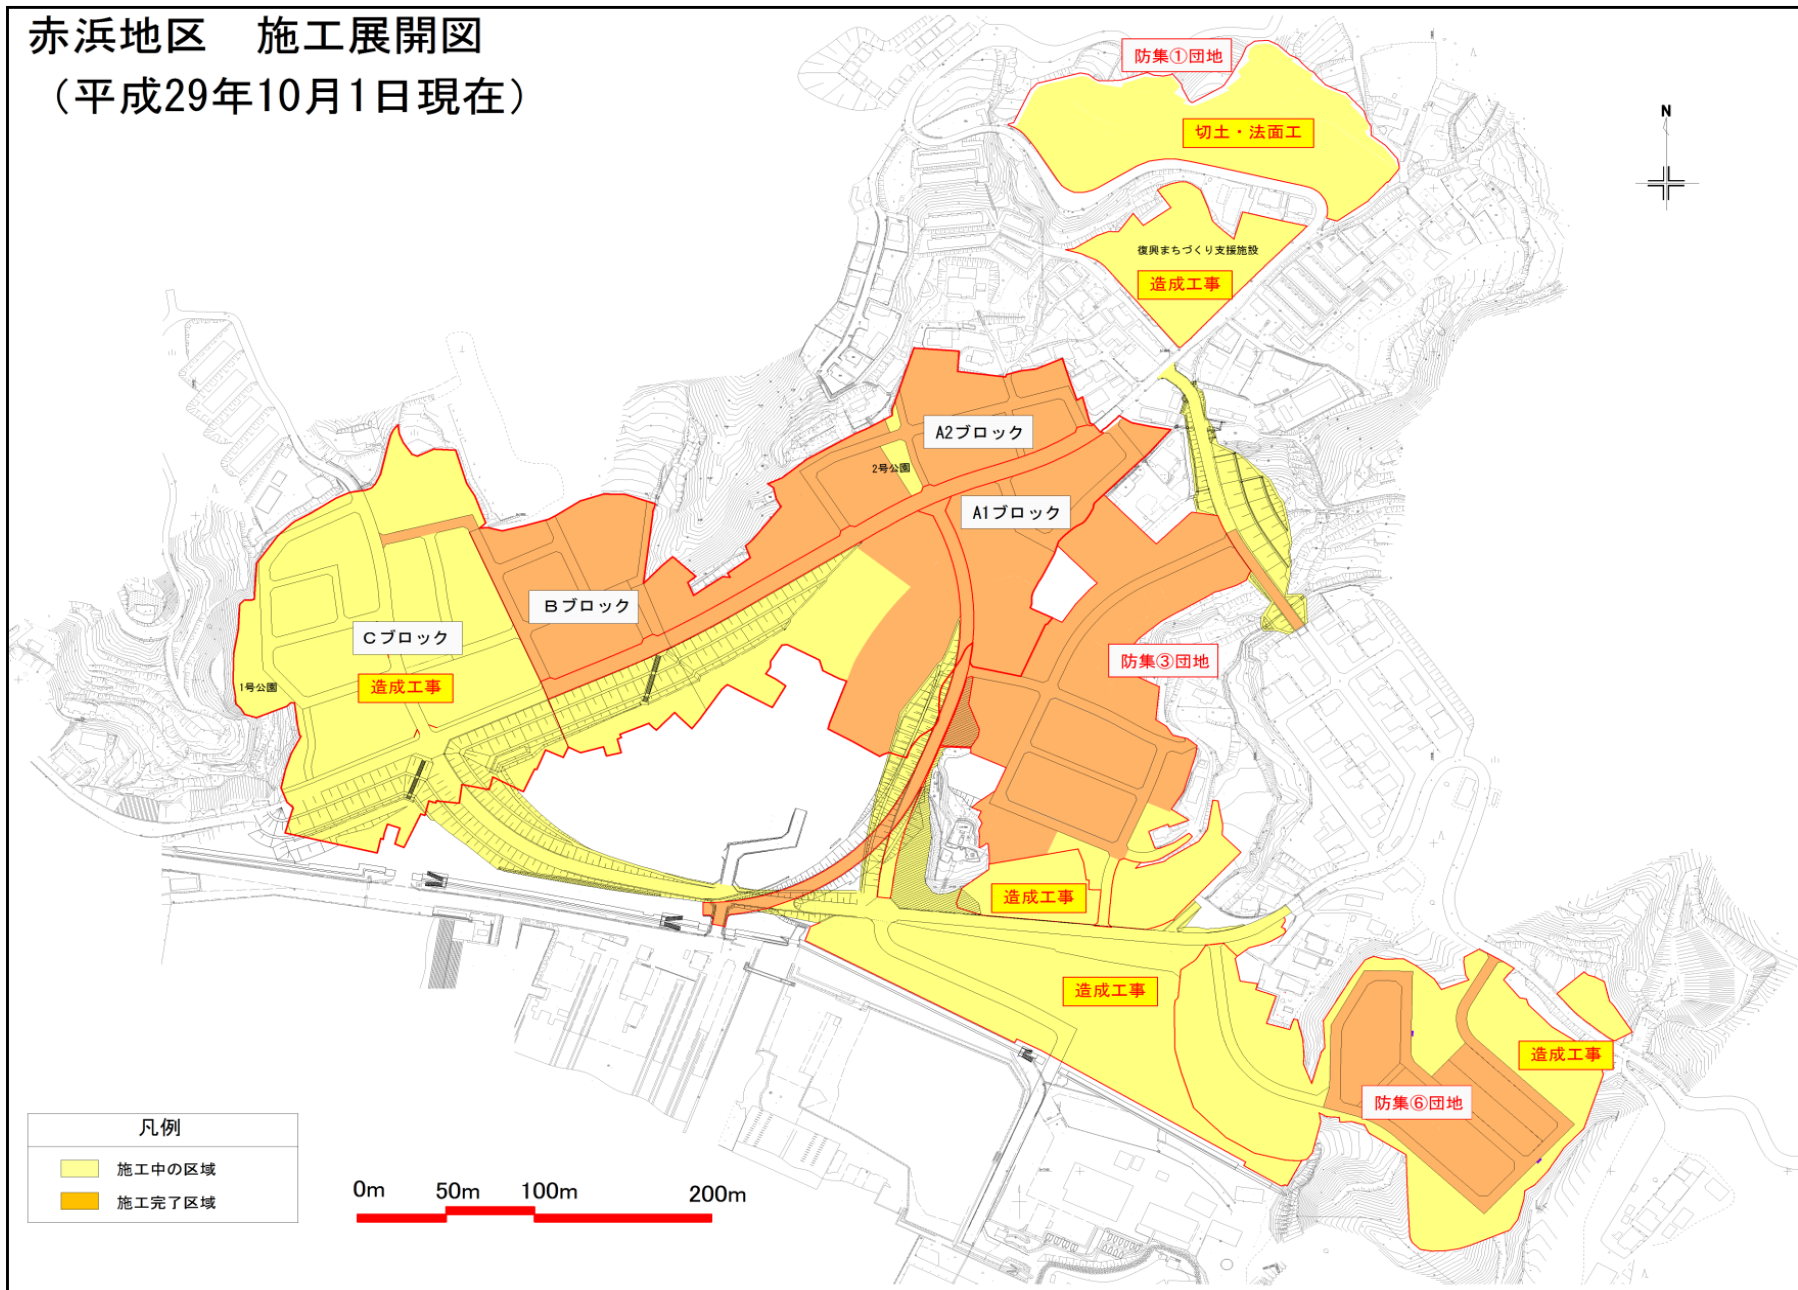


(2) 防災集団移転促進事業

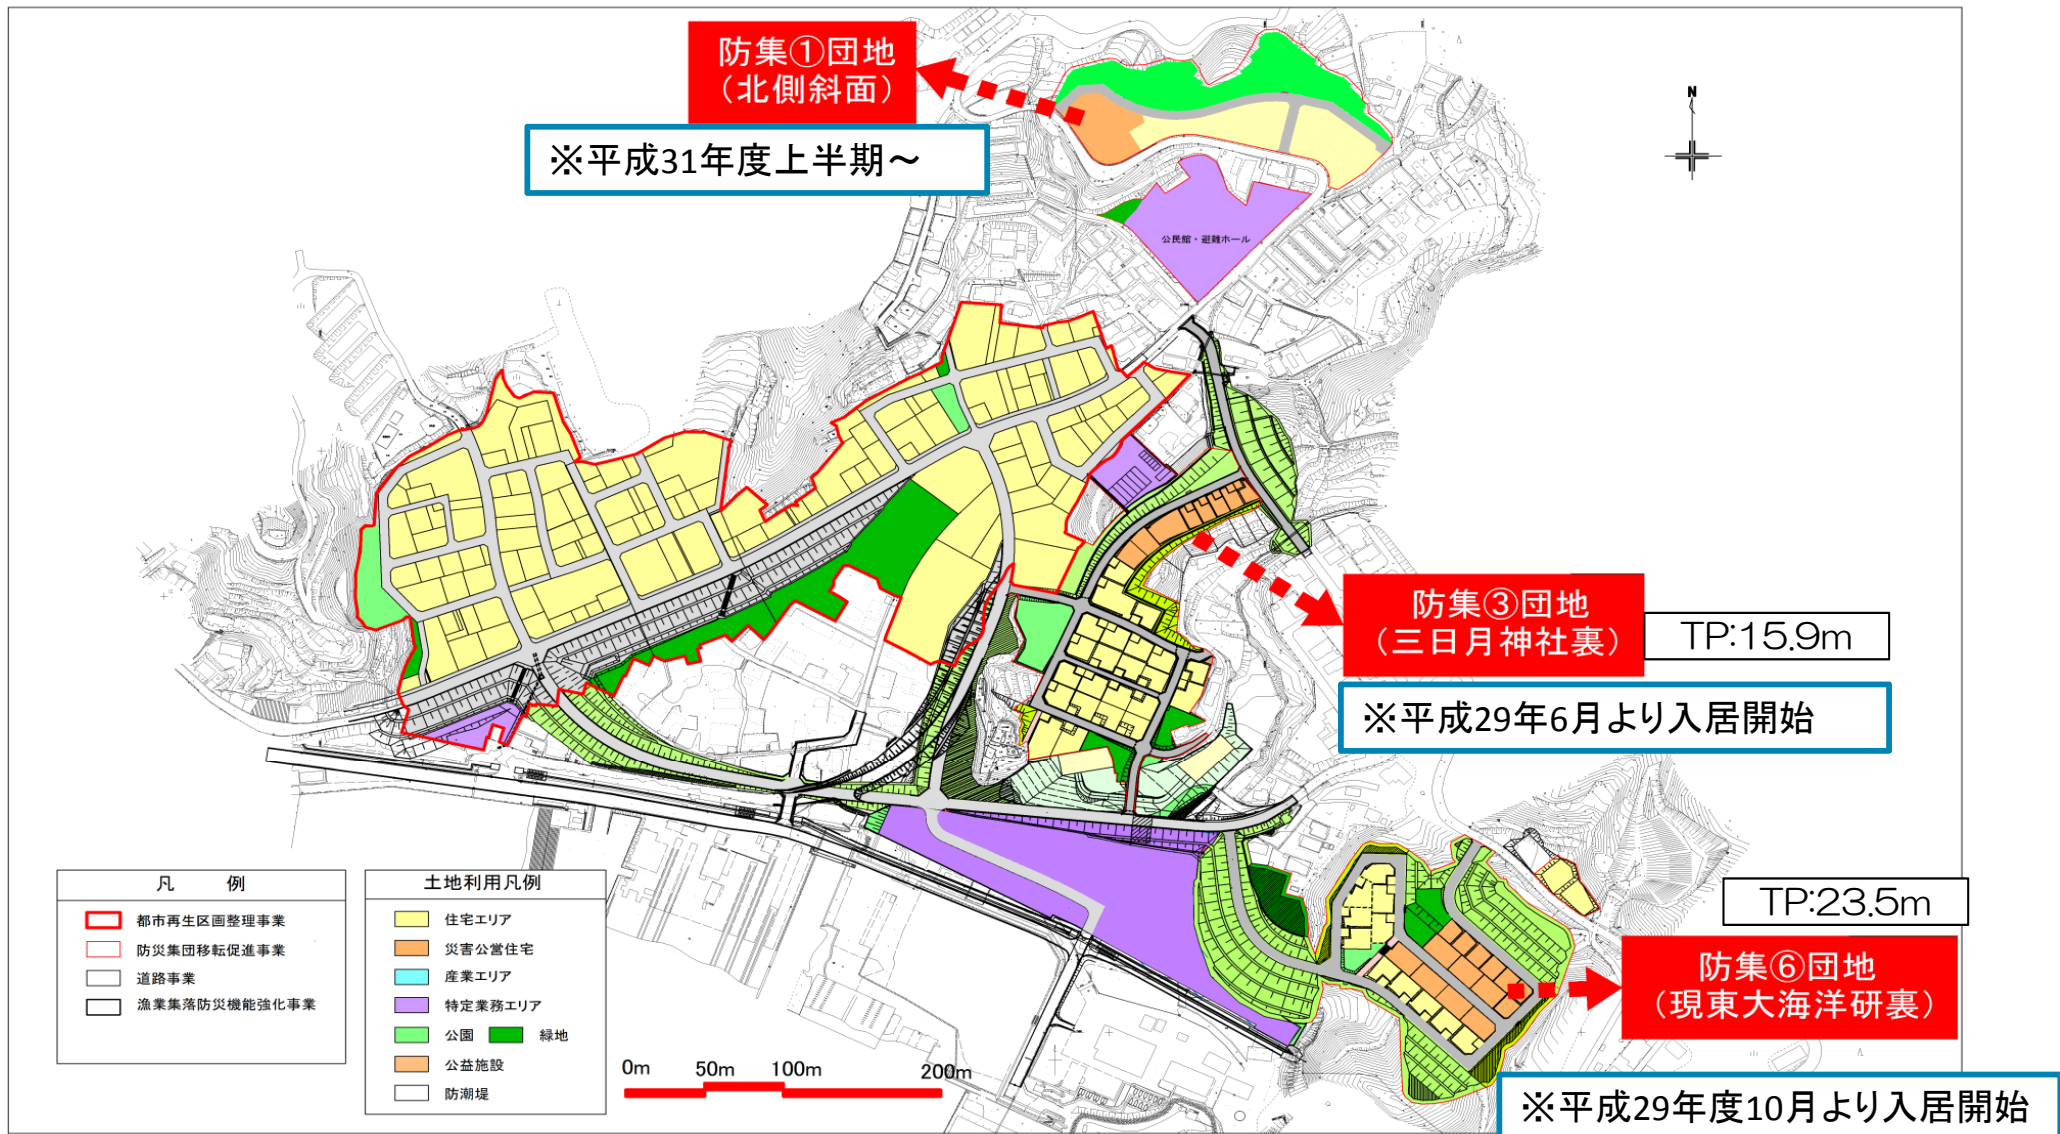

※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期


(4) 災害公営住宅

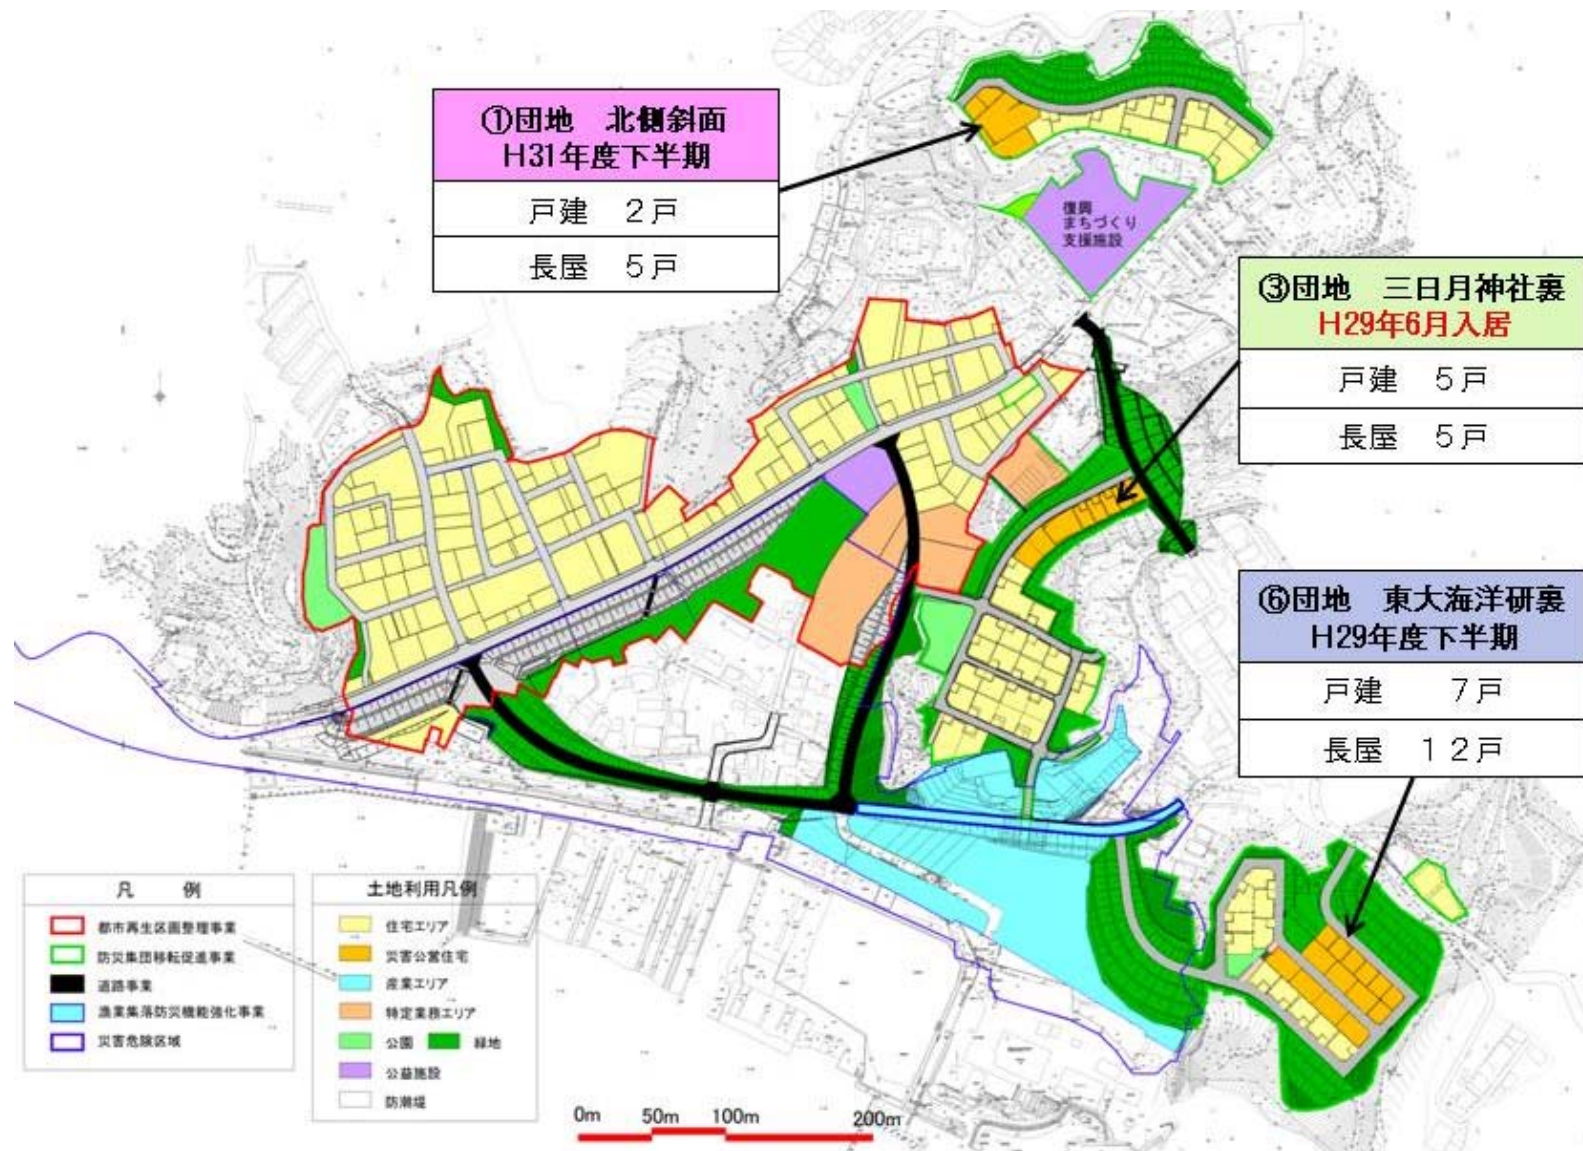

※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期


4. 吉里吉里地域

吉里吉里地区全体計画平面図 2016/8/1 時点




凡 例	
	都市再生区画整理事業
	防災集団移転促進事業
	災害危険区域

土地利用凡例	
	住宅エリア
	災害公営住宅
	産業エリア
	特定業務エリア
	公園・緑地
	公益施設

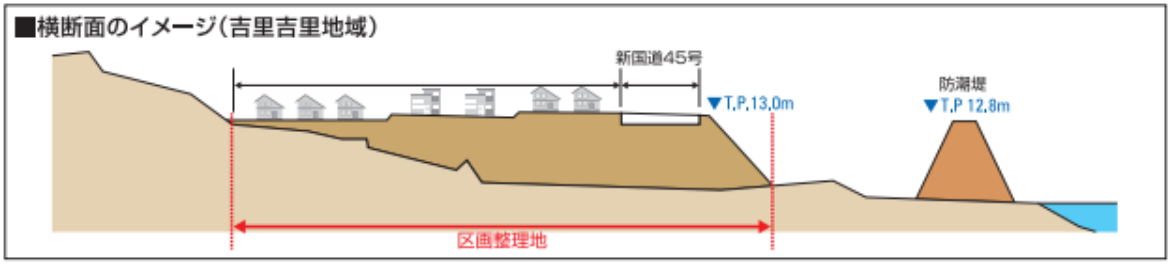


4. 吉里吉里地域 (1) 土地区画整理事業

平成29年10月1日現在

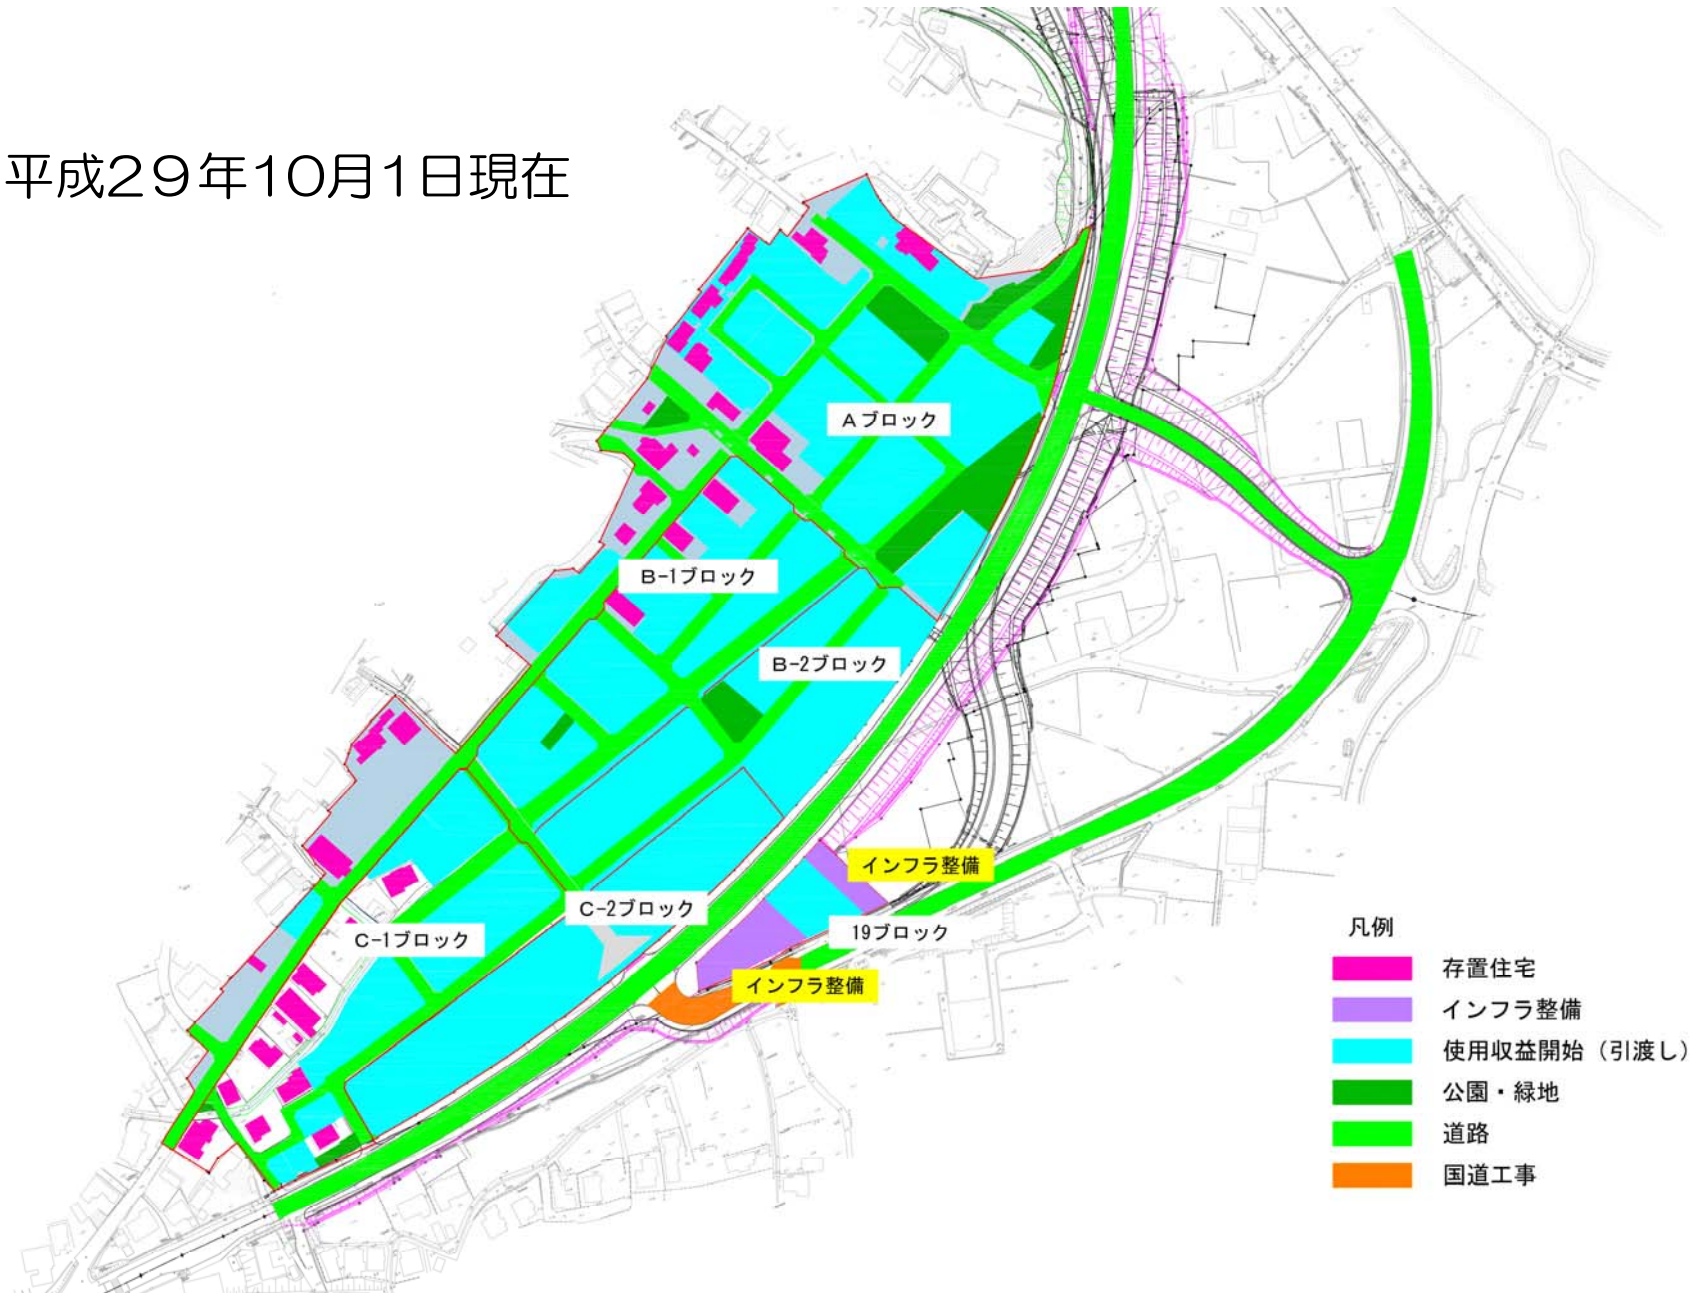


➤ 引き続き整備完了したブロック(仮換地)より使用収益開始(引渡し)予定

(2) 防災集団移転促進事業

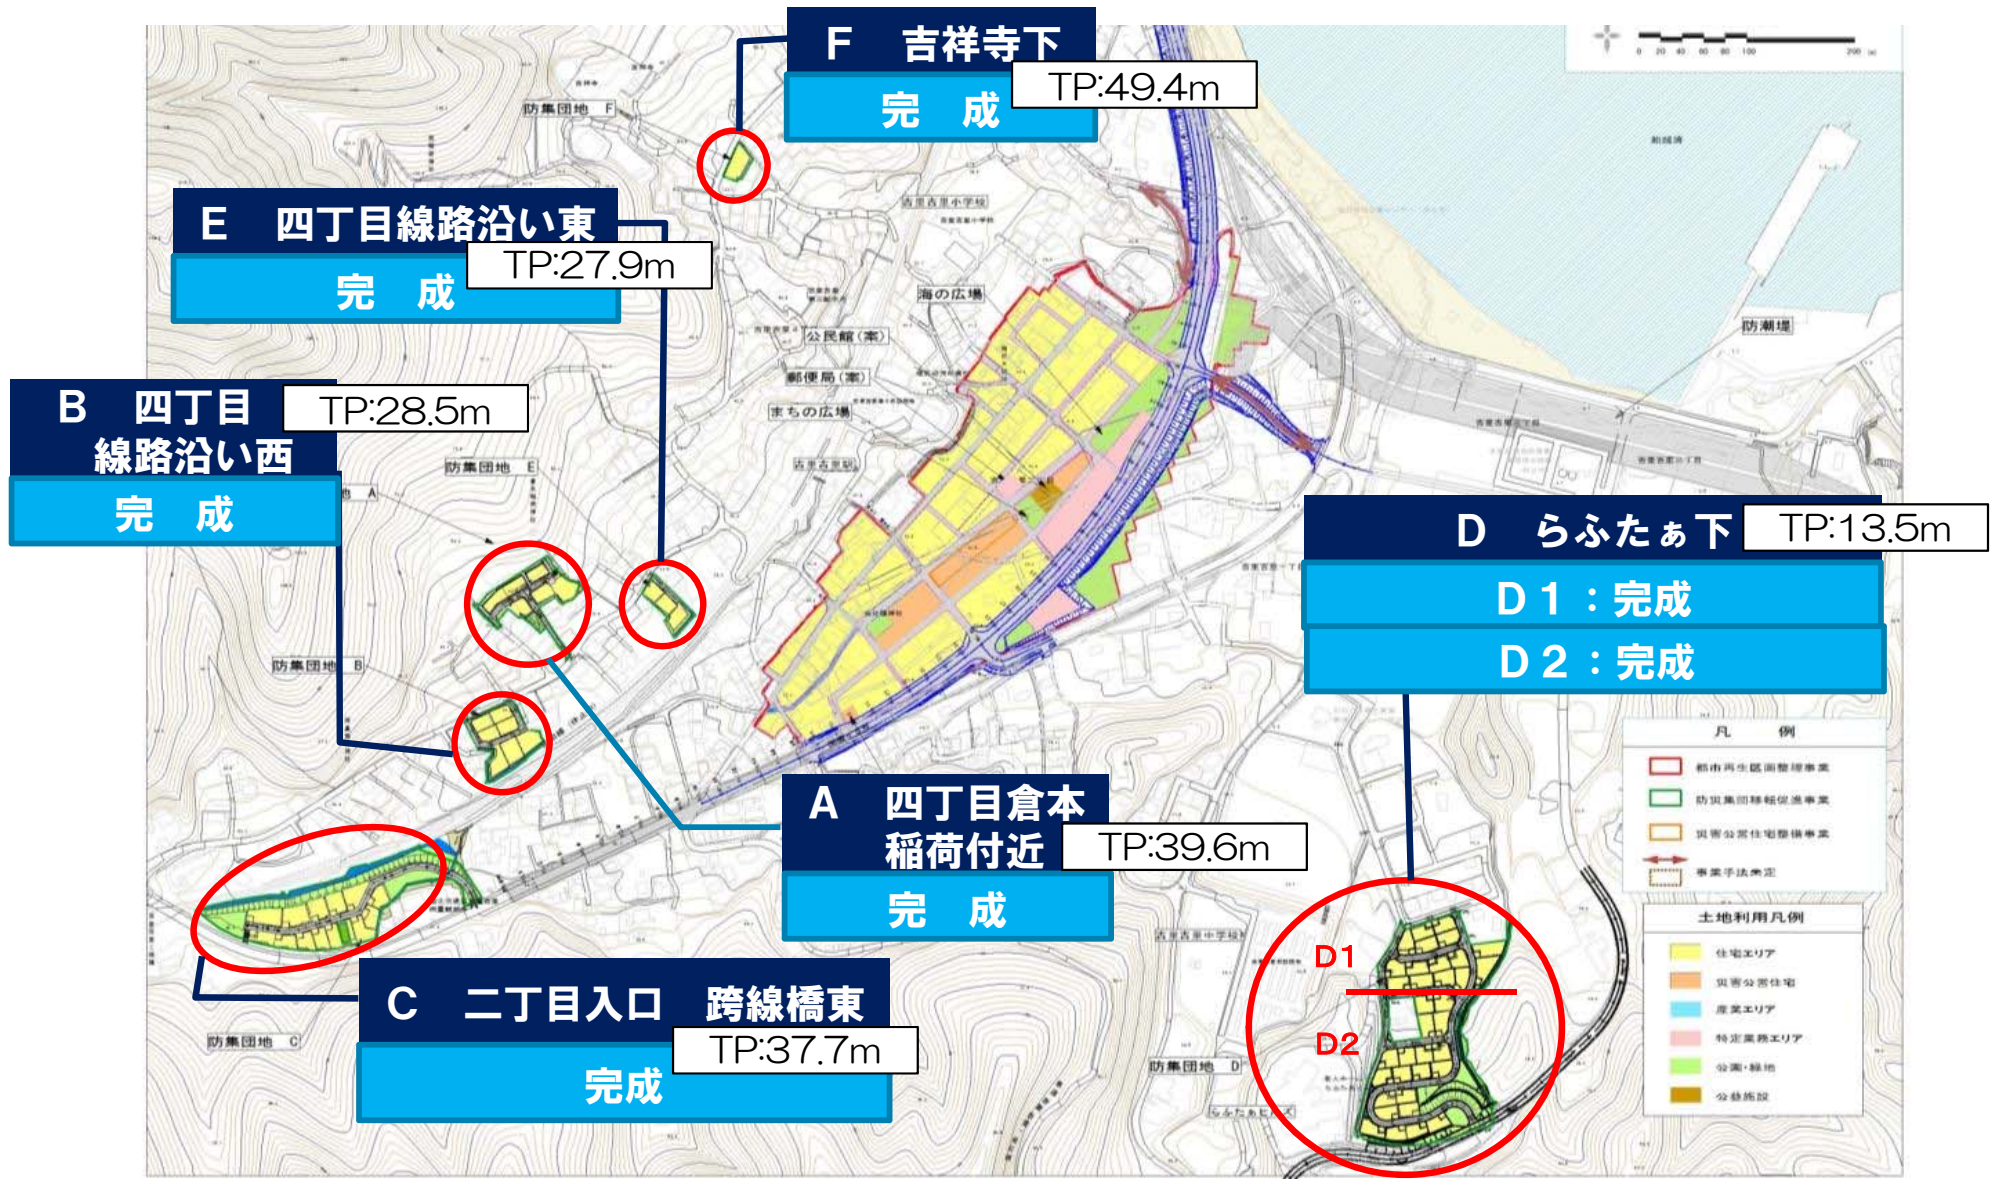


(3) 災害公営住宅

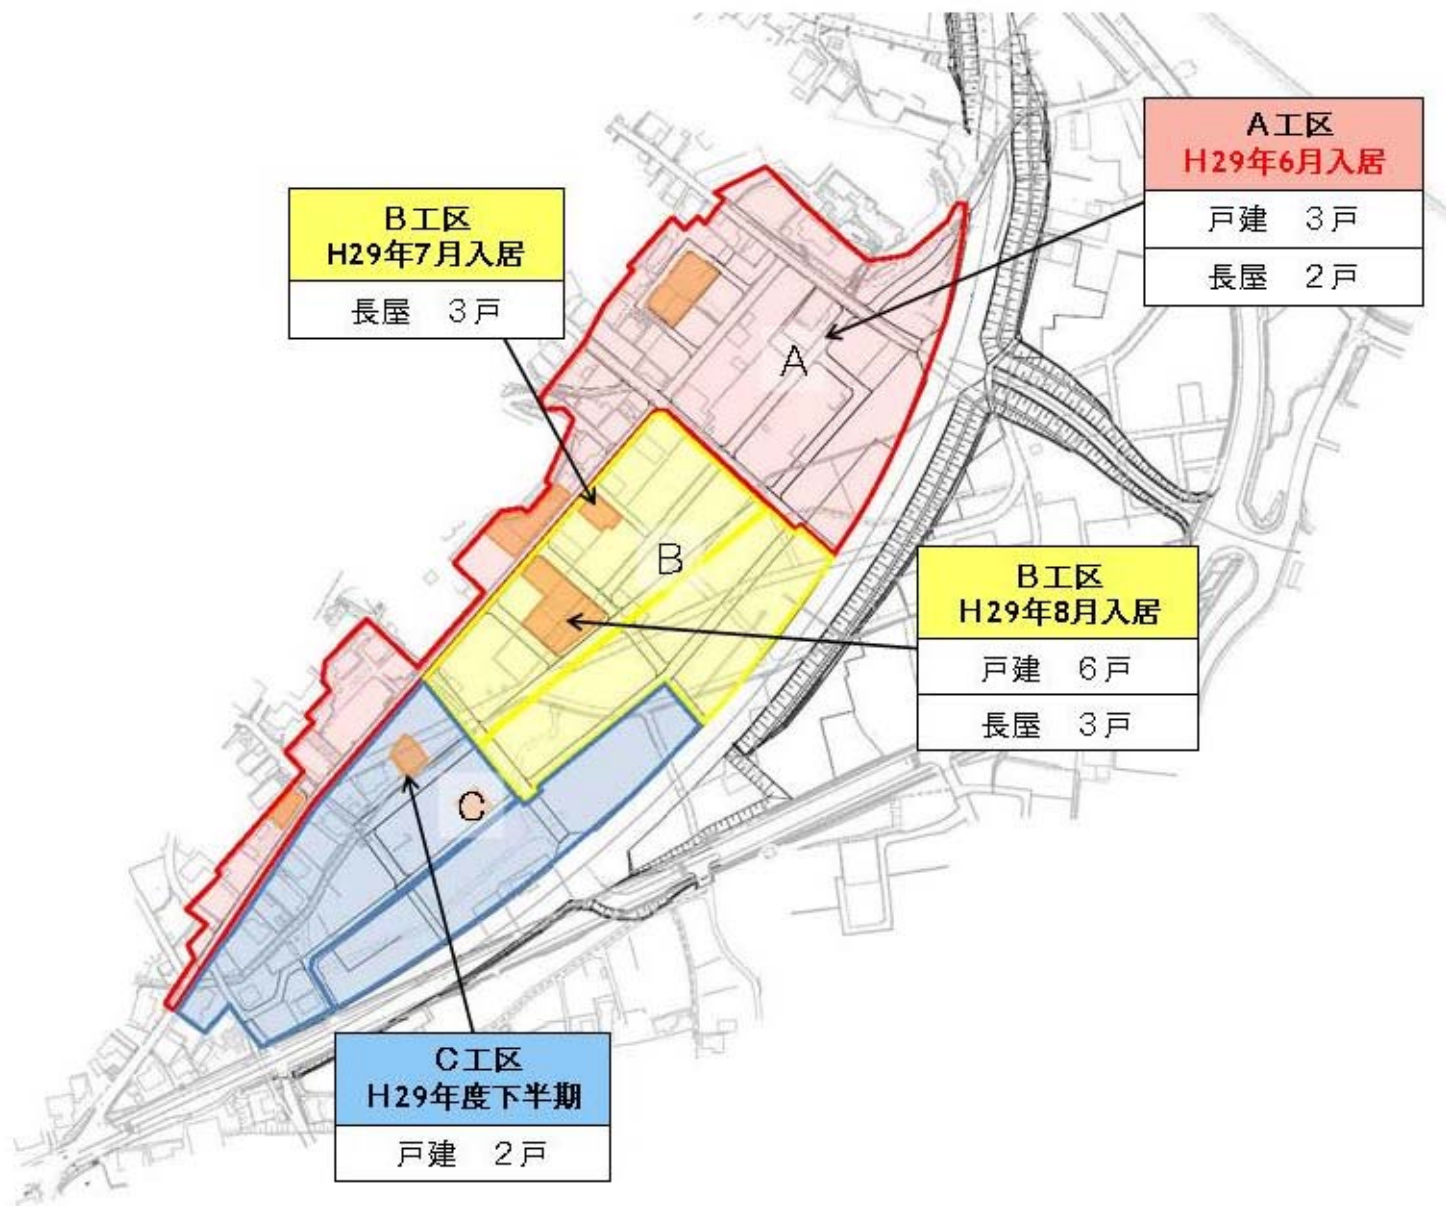


※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

5. 沢山地域 (1) 整備状況

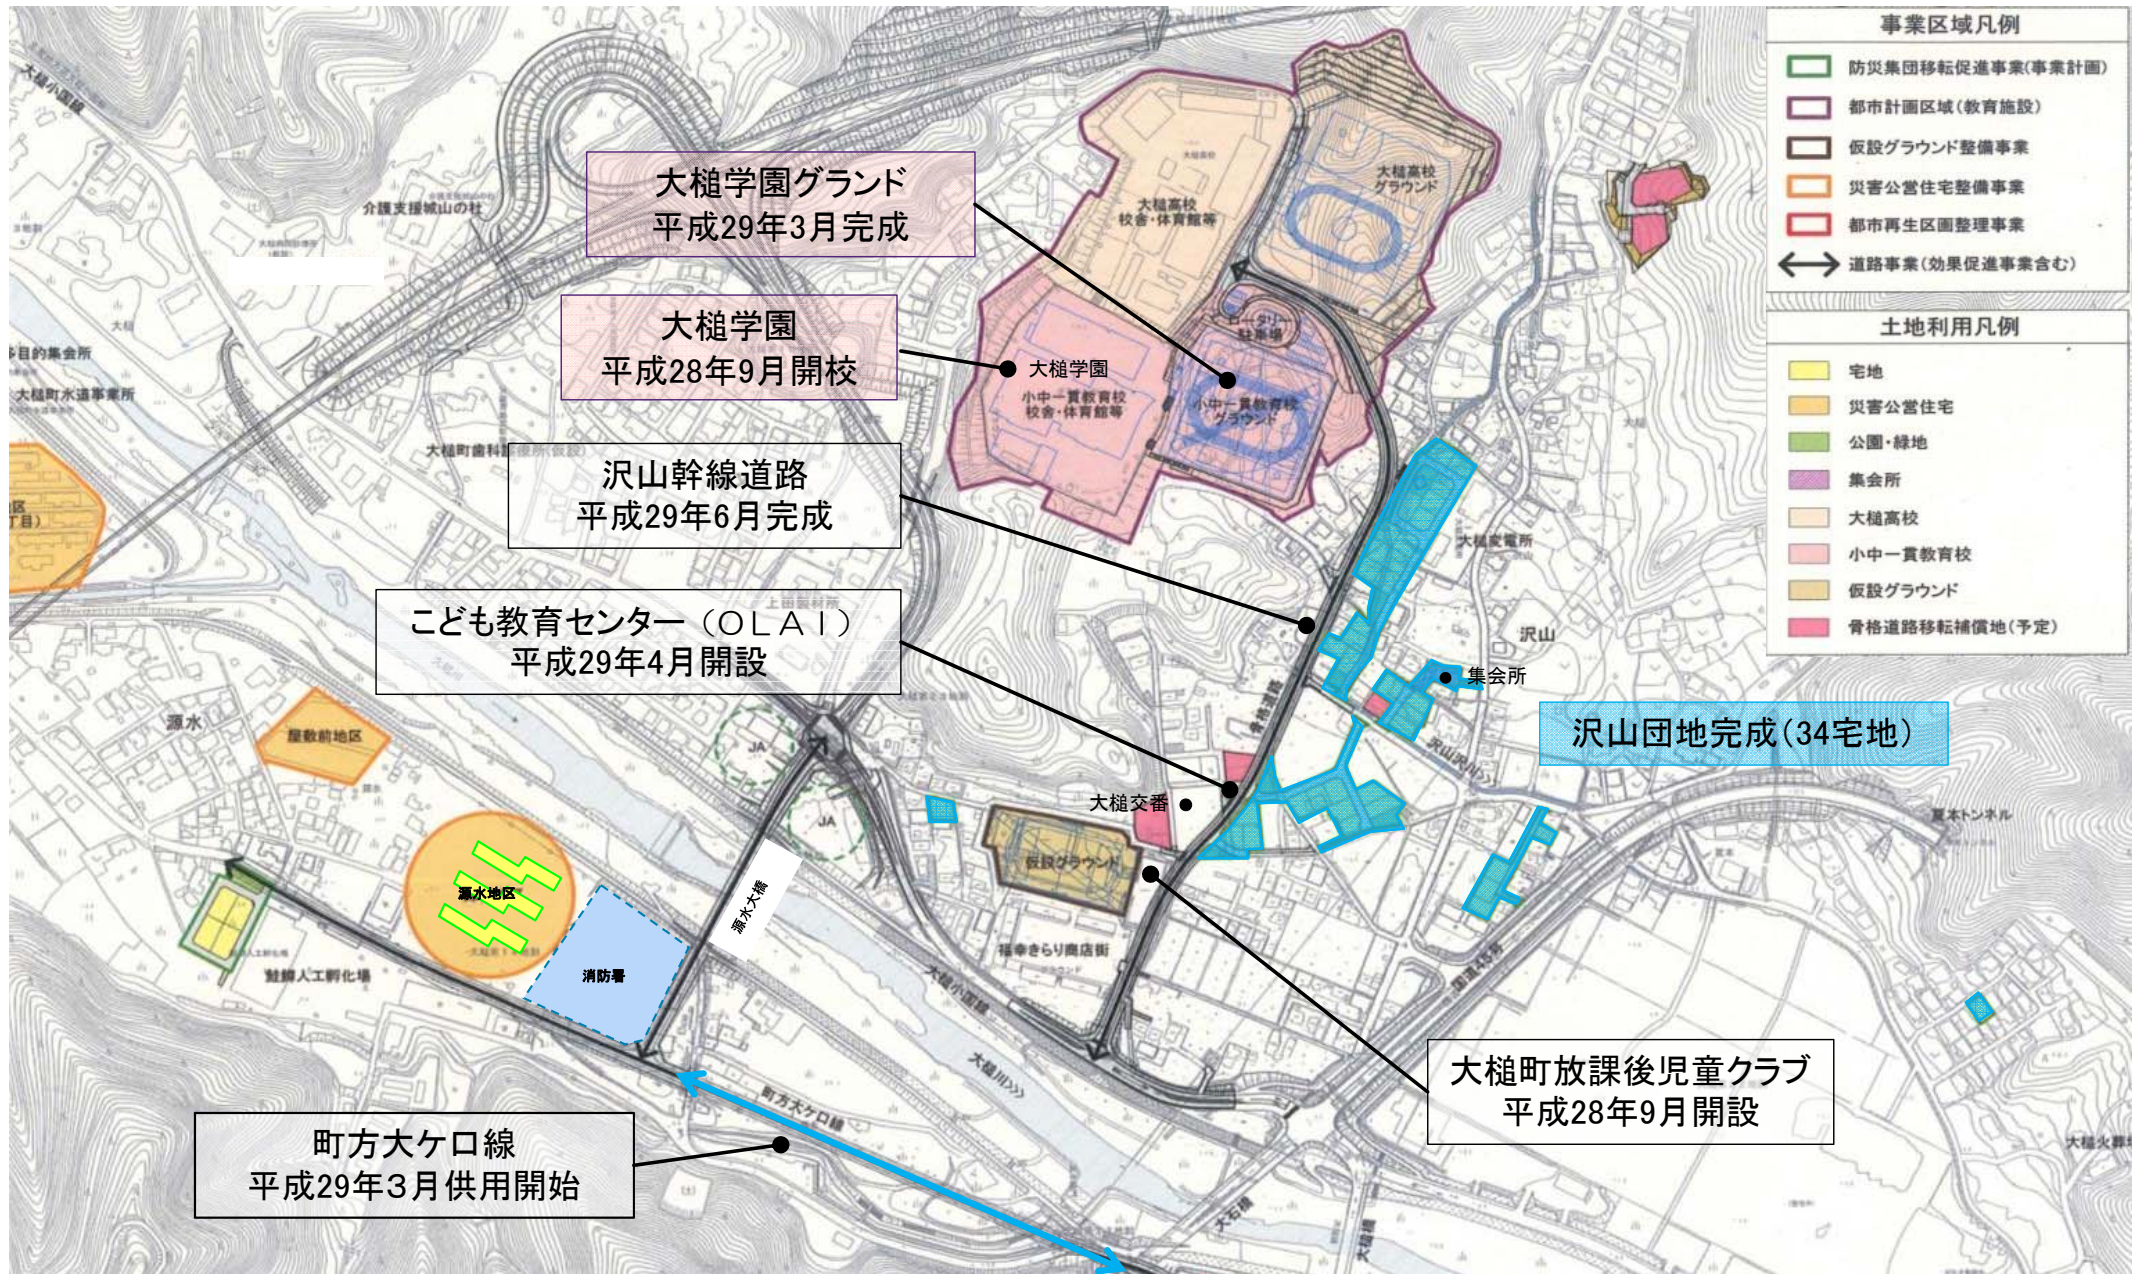

6. 浪板地域 (1) 防災集団移転促進事業 (2) 漁業集落防災機能強化事業 (3) 災害公営住宅

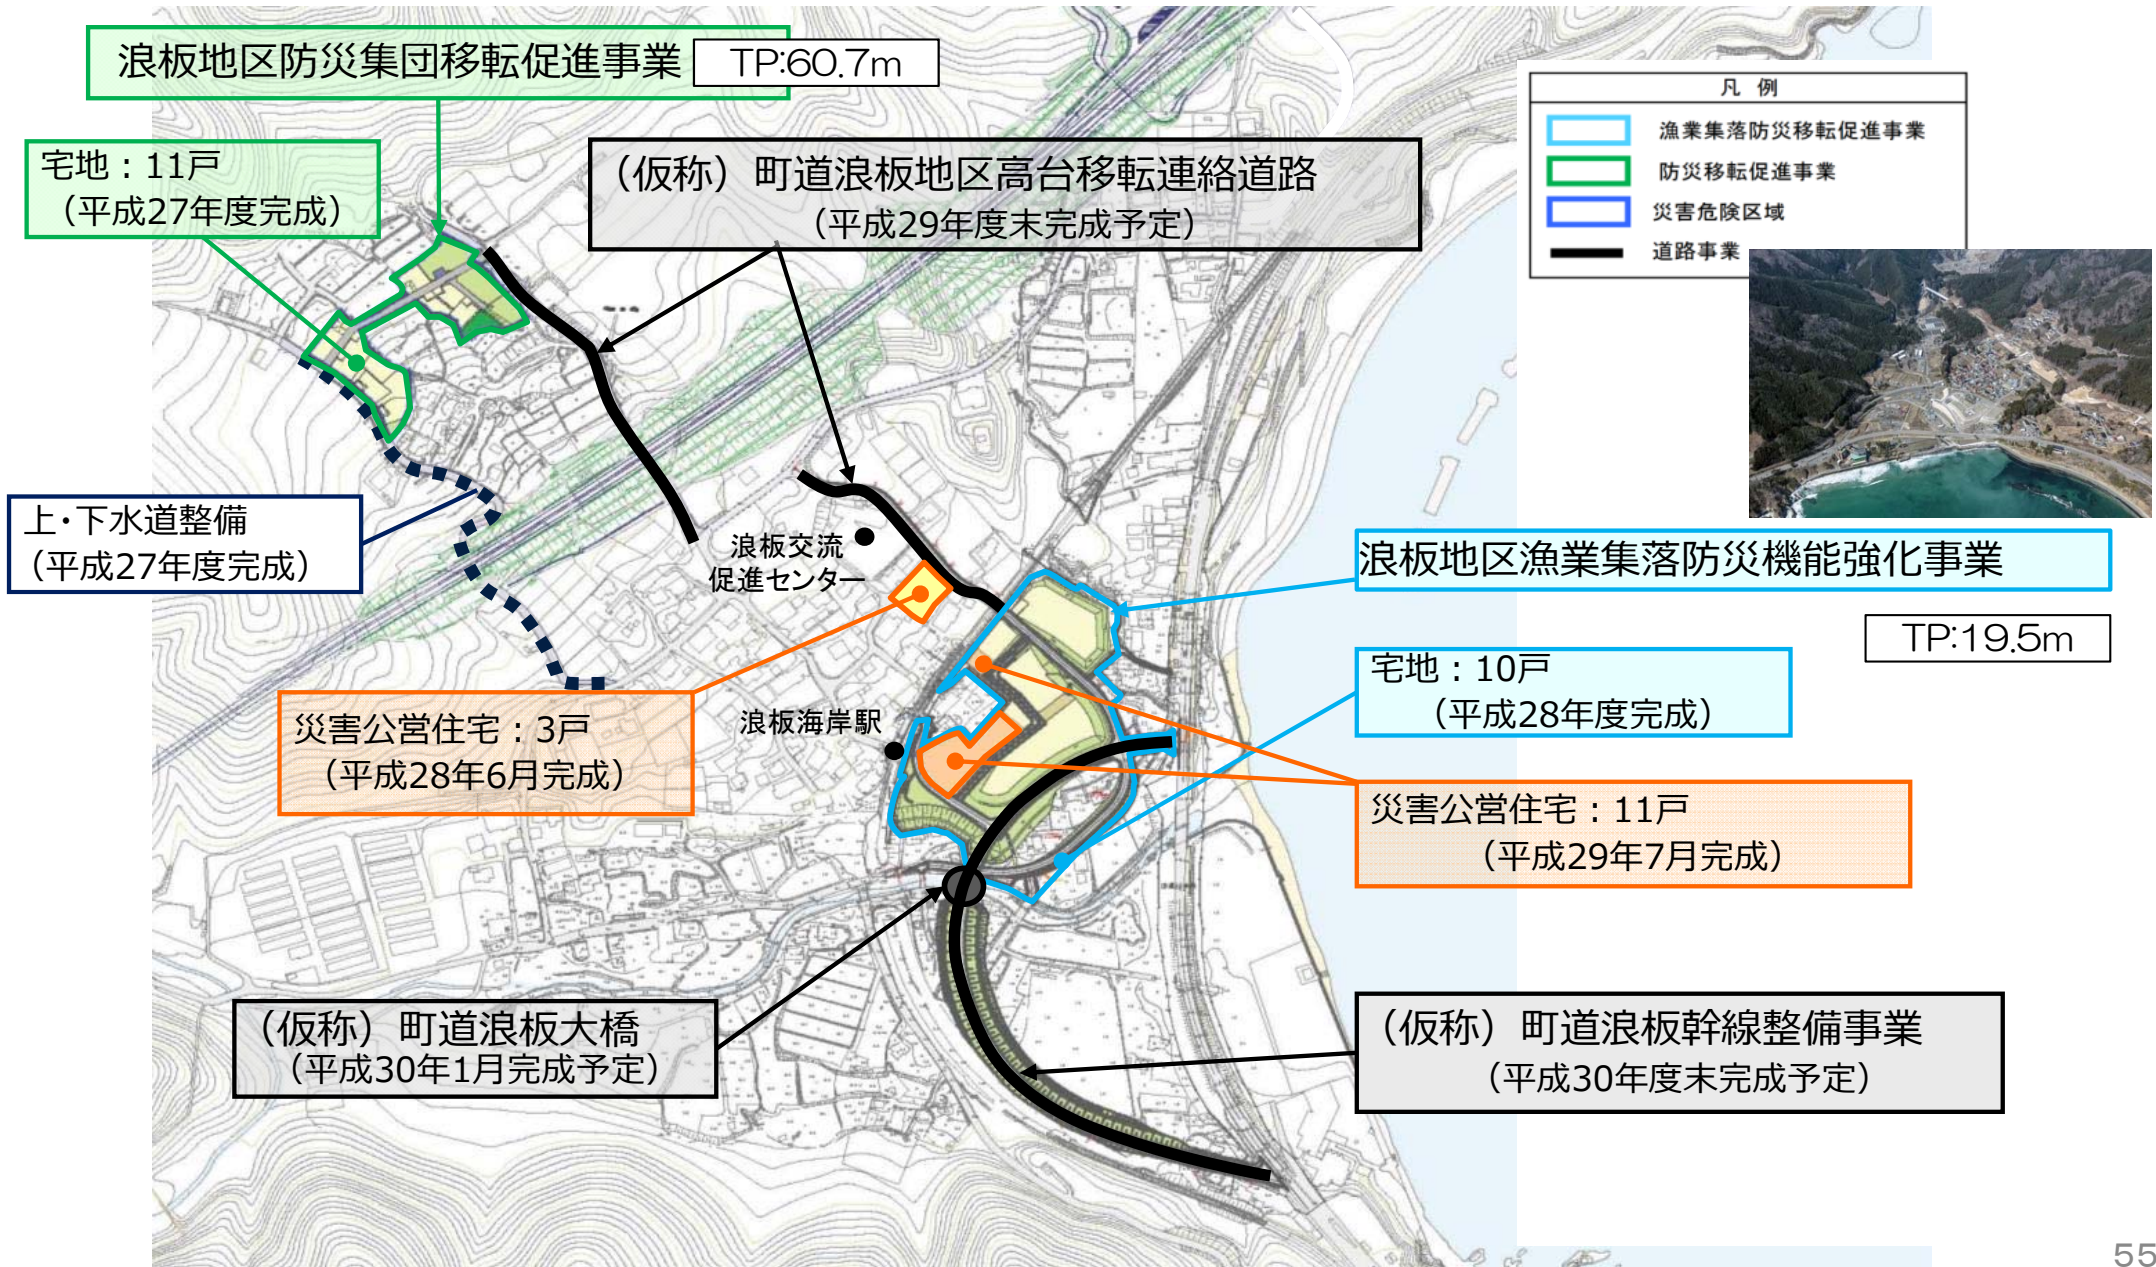

V 各事業の問い合わせ先

項目			部署	連絡先
大	中	小		
I	東日本大震災津波の概要			
1	地震及び津波の概要		総務部危機管理室	TEL 0193-42-8781
2	被害の状況等		総務部危機管理室	TEL 0193-42-8781
3	町方地区の状況		総合政策部総合政策課	TEL 0193-42-8724
II	大槌町東日本大震災津波復興計画の概要			総合政策部総合政策課 TEL 0193-42-8724
III	復旧・復興の進捗状況			復興局都市整備課 TEL 0193-42-8723
1	町民生活の状況			
(1)	人口及び世帯数の推移		民生部町民課	TEL 0193-42-8713
(2)	応急仮設住宅の設置状況		民生部コミュニティ総合支援室	TEL 0193-42-8718
(3)	町外避難者数等		民生部コミュニティ総合支援室	TEL 0193-42-8718
	児童生徒数		教育委員会事務局学務課	TEL 0193-42-6100
	生活保護受給者数		民生部保健福祉課	TEL 0193-42-8715
2	町の復旧・復興の状況			
(1)	予算の状況		総務部財政課	TEL 0193-42-8712
	復興交付金の推移		復興局復興推進課	TEL 0193-42-8714
(2)	復興事業の進捗状況～職員数の推移～		総務部総務課	TEL 0193-42-8710
(3)	復旧事業の進捗状況		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(4)	復興事業の進捗状況		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(5)	復興事業の進捗状況～災害公営住宅～		復興局住宅課	TEL 0193-42-8719
3	産業の状況			
(1)	生業の状況		産業振興部商工観光課	TEL 0193-42-8725
(2)	水産業の状況		産業振興部農林水産課	TEL 0193-42-8717
4	公共施設の再建状況			
(1)	消防署		総務部消防課（大槌消防署）	TEL 0193-42-3121
(2)	県立大槌病院		民生部保健福祉課	TEL 0193-42-8715
(3)	大槌学園		教育委員会事務局学務課	TEL 0193-42-6100
(4)	放課後こども教育センター		教育委員会事務局学務課	TEL 0193-42-6100
(5)	公民館		教育委員会事務局生涯学習課	TEL 0193-42-2300
(6)	集会所		総合政策部震災伝承推進室	TEL 0193-27-8168
(7)	避難路		総務部危機管理室	TEL 0193-42-8781
(8)	御社地エリア復興拠点施設		総合政策部震災伝承推進室	TEL 0193-27-8168
5	震災伝承			
(1)	納骨堂		民生部町民課	TEL 0193-42-8713
(2)	デジタルアーカイブ		総合政策部震災伝承推進室	TEL 0193-27-8168
(3)	生きた証		総合政策部震災伝承推進室	TEL 0193-27-8168

6	生活再建と支援			
(1)	地域復興協議会とコミュニティ協議会		総合政策部総合政策課 民生部コミュニティ総合支援室	TEL 0193-42-8724 TEL 0193-42-8718
(2)	自治会の設立状況と活動例		民生部コミュニティ総合支援室	TEL 0193-42-8718
(3)	ボランティア数の推移		民生部保健福祉課	TEL 0193-42-8715
7	スケジュール			
(1)	面整備		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(2)	災害公営住宅		復興局住宅課	TEL 0193-42-8719
IV	各地区の土地利用の状況			
1	町方地域、小枕・伸松地域			
(1)	土地区画整理事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(3)	災害公営住宅		復興局住宅課	TEL 0193-42-8719
(4)	津波復興拠点整備事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
2	安渡地域			
(1)	土地区画整理事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(3)	災害公営住宅		復興局住宅課	TEL 0193-42-8719
(4)	津波復興拠点整備事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
3	赤浜地域			
(1)	土地区画整理事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(3)	漁業集落防災機能強化事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(4)	災害公営住宅		復興局住宅課	TEL 0193-42-8719
4	吉里吉里地域			
(1)	土地区画整理事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(2)	防災集団移転促進事業		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
(3)	災害公営住宅		復興局住宅課	TEL 0193-42-8719
5	沢山地域			
(1)	整備状況		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
6	浪板地域			
(1)	整備状況		復興局都市整備課	TEL 0193-42-8723
V	各事業の問い合わせ先			総合政策部総合政策課 TEL 0193-42-8724
