

大槌町復興レポート

平成29年1月1日

岩手県大槌町



目次

| | スライド番号 | スライド番号 |
|------------------------------|--------|--------|
| I 東日本大震災津波の概要 | | |
| 1 地震及び津波の概要 | 1 | |
| 2 被害の状況等 | 3 | |
| II 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要 | 5 | |
| III 復旧・復興の進捗状況 | 7 | |
| 1 町民生活の状況 | 8 | |
| (1) 人口及び世帯数の推移 | 8 | |
| (2) 応急仮設住宅の状況 | 9 | |
| (3) 町外避難者数等 | 11 | |
| 2 町の復旧・復興の状況 | 12 | |
| (1) 予算の状況 | 12 | |
| (2) 復旧事業の進捗状況 | 13 | |
| (3) 復興事業の進捗状況 | 14 | |
| (4) 復興事業の進捗状況 ～災害公営住宅～ | 17 | |
| (5) 復興事業の進捗状況 ～職員数～ | 18 | |
| 3 産業の状況 | 19 | |
| (1) 生業の状況 | 19 | |
| (2) 水産業の状況 | 20 | |
| 4 公共施設の再建状況 | 22 | |
| (1) 消防署 | 22 | |
| (2) 県立大槌病院 | 22 | |
| (3) 小中一貫校 | 23 | |
| (4) 納骨堂 | 24 | |
| (5) 御社地エリア復興拠点施設 | 25 | |
| (6) 公民館 | 26 | |
| 5 生活再建と支援 | 27 | |
| (1) 地域復興協議会とコミュニティ協議会 | 27 | |
| (2) 自治会の設立状況と活動例 | 28 | |
| (3) ボランティア数の推移 | 29 | |
| 6 スケジュール | 30 | |
| (1) 面整備 | 30 | |
| (2) 災害公営住宅 | 32 | |
| IV 各地区の土地利用の状況 | | |
| 1 町方地域、小枕・伸松地域 | 33～37 | |
| 2 安渡地域 | 38～41 | |
| 3 赤浜地域 | 42～43 | |
| 4 吉里吉里地域 | 44～46 | |
| 5 沢山地域 | 47 | |
| 6 浪板地域 | 48 | |
| IV 各事業の問い合わせ先 | 49 | |

I 東日本大震災津波の概要

1. 地震及び津波の概要

| 項目 | 東日本大震災津波 |
|-------|---|
| 発生日時 | 平成23年3月11日(金) 14時46分頃 |
| 震央地名 | 三陸沖(北緯38.06.2度 東経142.51.6度) |
| 震源の深さ | 24km |
| 規模 | マグニチュード9.0(モーメントマグニチュード) |
| 周辺の震度 | 震度6弱(釜石市) |
| 津波 | 3月11日 14時49分 大津波警報発表 3月12日 20時20分 津波警報 3月13日 7時30分 津波注意報に切替 3月13日 17時58分 津波注意報解除 ※津波の最大波 表1-1 |
| 津波浸水高 | 表1-2 |
| 津波痕跡高 | 痕跡高最大13.7m(安渡) |
| 浸水面積 | 4平方キロメートル(住宅・市街地面積の52%) |


表1-1

| 調査地域 | 最大波 |
|------|---------------|
| 釜石 | 15時21分 4.2m以上 |
| 宮古 | 15時26分 8.5m以上 |
| 大船渡 | 15時18分 8.0m以上 |
| 久慈港 | 15時21分 8.6m以上 |

表1-2

| 調査地域 | 津波浸水高 |
|----------------|-------|
| 吉里吉里 | 16.1m |
| 吉里吉里漁港東側 | 22.2m |
| 赤浜 | 12.9m |
| 新港町 | 12.7m |
| 町役場付近 | 10.7m |
| 浪板 (※津波遡上高) | 19.1m |

1. 地震及び津波の概要

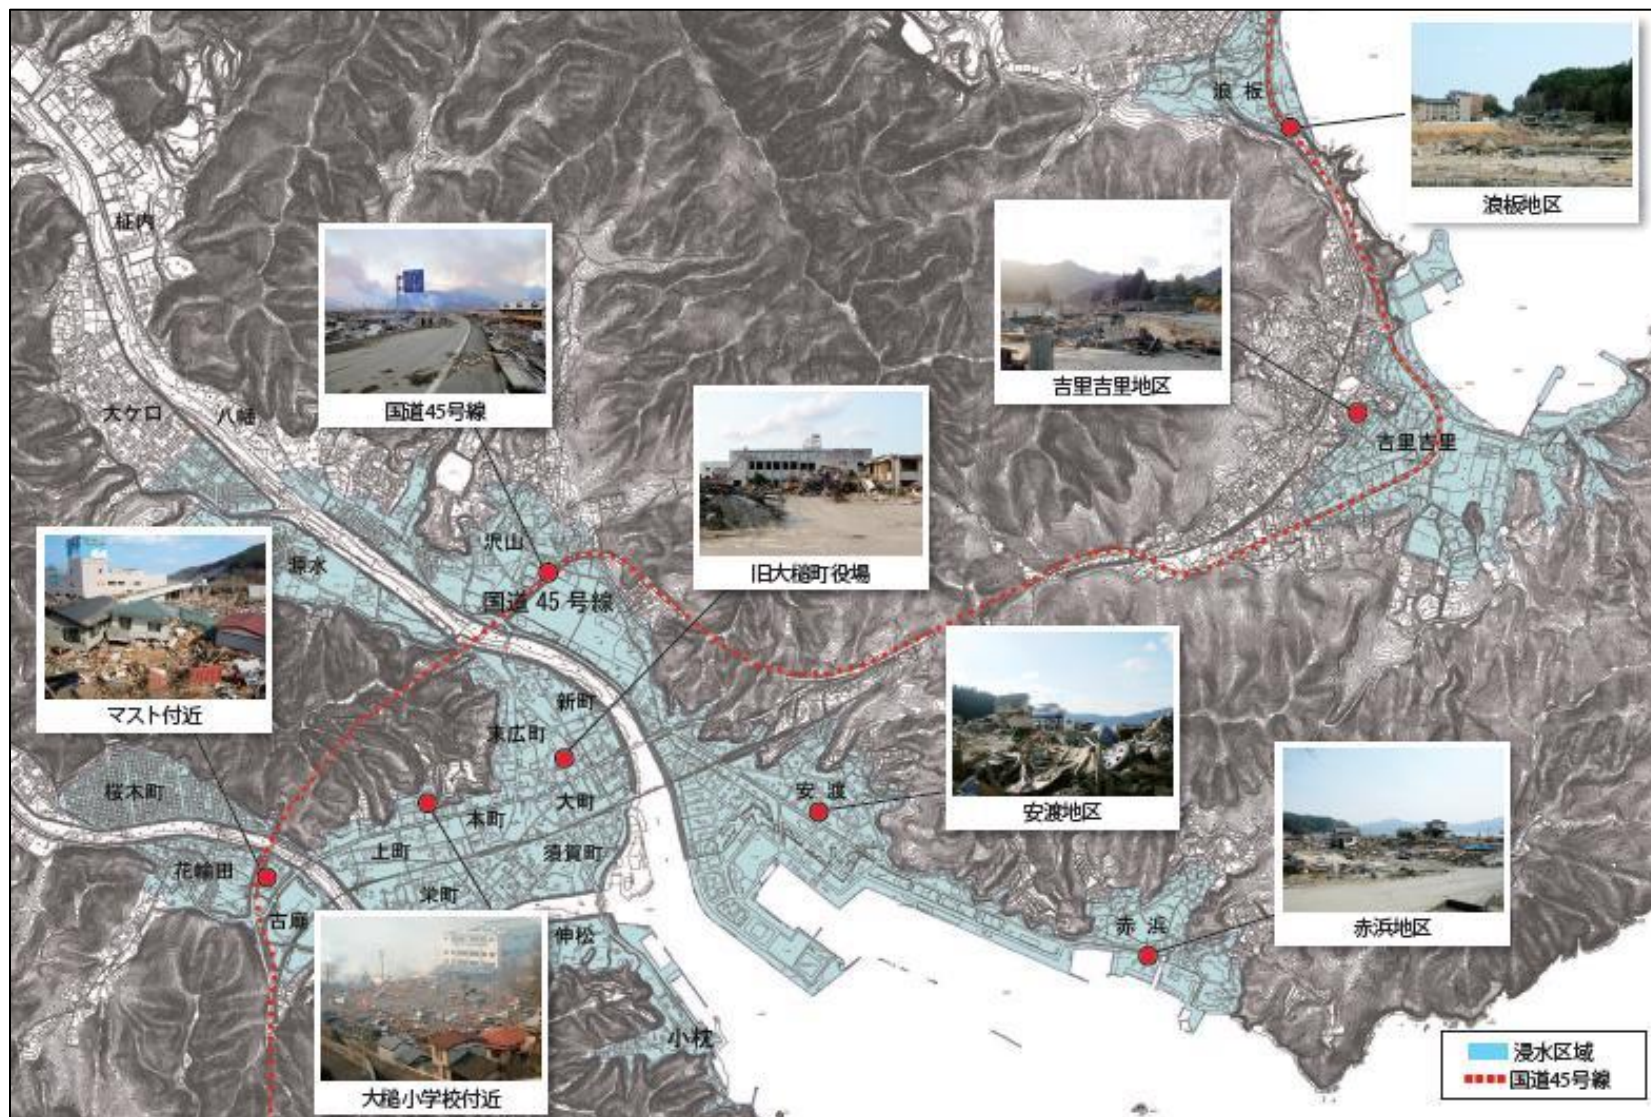

津波浸水区域

2. 被害の状況等

| 被害の区分 | | 被害 | 備考 |
|-------------------|--------|--------------|------------------|
| 人的被害 | 死者 | 813人 | |
| | 行方不明者 | 421人 | うち死亡届出数 420人 |
| | 震災関連死 | 51人 | |
| | 計 | 1,285人 | |
| 家屋被害 (H27.4確定) | 全壊・半壊 | 4,167棟 | |
| | 一部損壊 | 208棟 | |
| | 計 | 4,375棟 | |
| 産業被害 | 水産業 | 5,127,926千円 | 水産施設、漁船、養殖施設等 |
| | 農業 | 610,000千円 | 水田、畑、用水路、農道 |
| | 林業 | 271,741千円 | 林野、林道 |
| | 商工業 | 14,039,490千円 | 建物、機械設備、商品等 |
| | 観光業 | 1,684,607千円 | 観光施設、自然公園 |
| | 計 | 21,733,764千円 | |
| 公共施設 被害 | 役場庁舎等 | 9,555,102千円 | 建物、公用車等 |
| | 消防施設等 | 427,364千円 | 庁舎、機械、装備、消火栓等 |
| | 道路・海岸等 | 41,181,244千円 | 公共下水道等 |
| | 上水道施設 | 2,213,311千円 | ポンプ場等 |
| | 学校 | 3,044,796千円 | 建物、設備等 |
| | 社会教育施設 | 1,305,284千円 | 公民館、図書館、運動場等 |
| | 社会福祉施設 | 136,660千円 | 児童・障がい・高齢者・福祉施設等 |
| | 計 | 57,863,761千円 | |
| 産業・公共施設被害(合計) | | 79,597,525千円 | |

2. 被害の状況等

震災前



震災直後



現在 (H29.3.2)




城山から見た中心市街地の様子

Ⅱ 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要

○計画の目的及び構成

- 町は、東日本大震災津波が与えた被害の状況や影響、復興に向けた課題を把握し、1日も早く復興を成し遂げるための未来の設計図として「大槌町東日本大震災復興計画」を策定。
- 本計画は震災復興に向けた基本的な施策の方向を示す「基本計画」と、その内容に沿って各施策に対応した事業のあり方を示す「実施計画」の2つの計画で構成。


○計画の期間

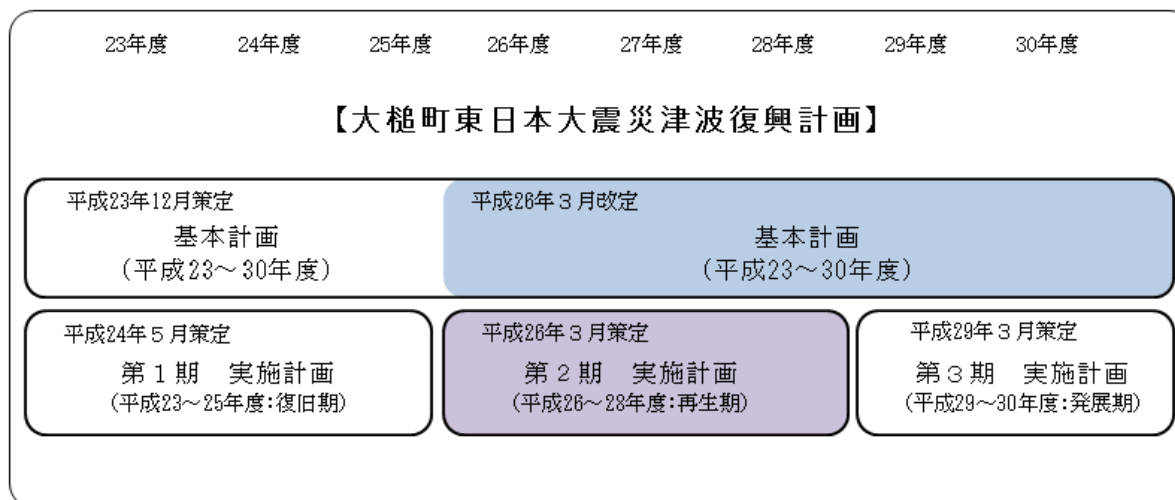

Ⅱ 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要

○復興まちづくりの体系

希望の大槌への挑戦

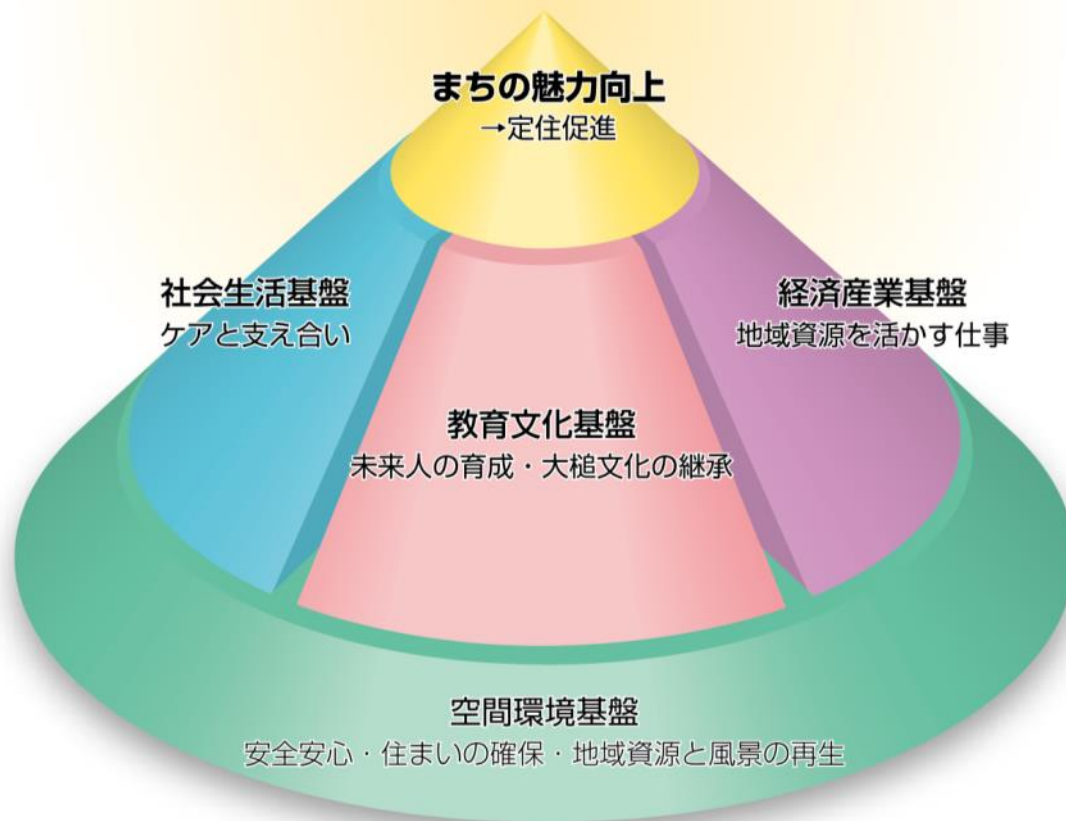


「希望の大槌への挑戦」という基本理念のもと、「空間環境基盤」の上に「社会生活基盤」、「経済産業基盤」、「教育文化基盤」の3つの基盤が三位一体となったまちづくりを進めることで、町の魅力向上による定住促進につなげ、「美しいまち」を実現します。

Ⅲ 復旧・復興の進捗状況

H28.9寺野

H28.10浪板

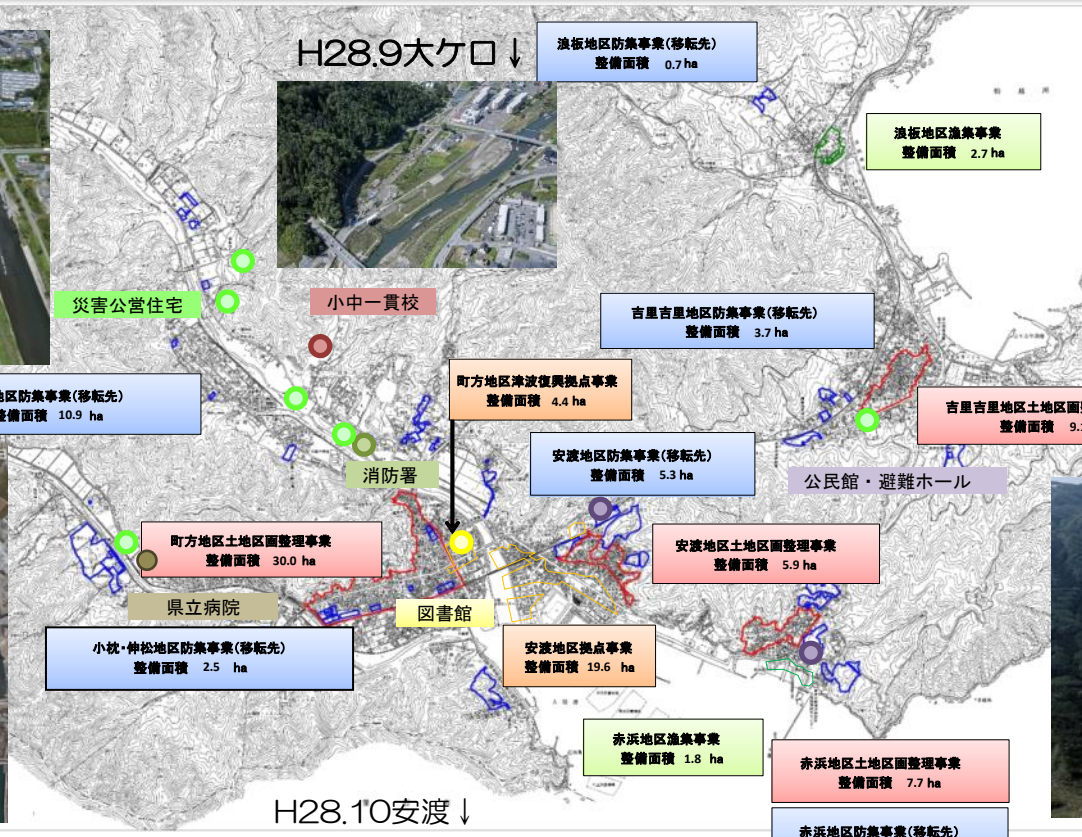

H28.10吉里吉里 ↓



H28.10赤浜 ↓



H28.10小枕・伸松 ↓




H28.10小枕・伸松 ↓

- 防集事業・・防災集団移転促進事業
- 漁集事業・・漁集集落防災機能強化事業
- 拠点事業・・津波復興拠点整備事業




1. 町民生活の状況 (1)人口及び世帯数の推移

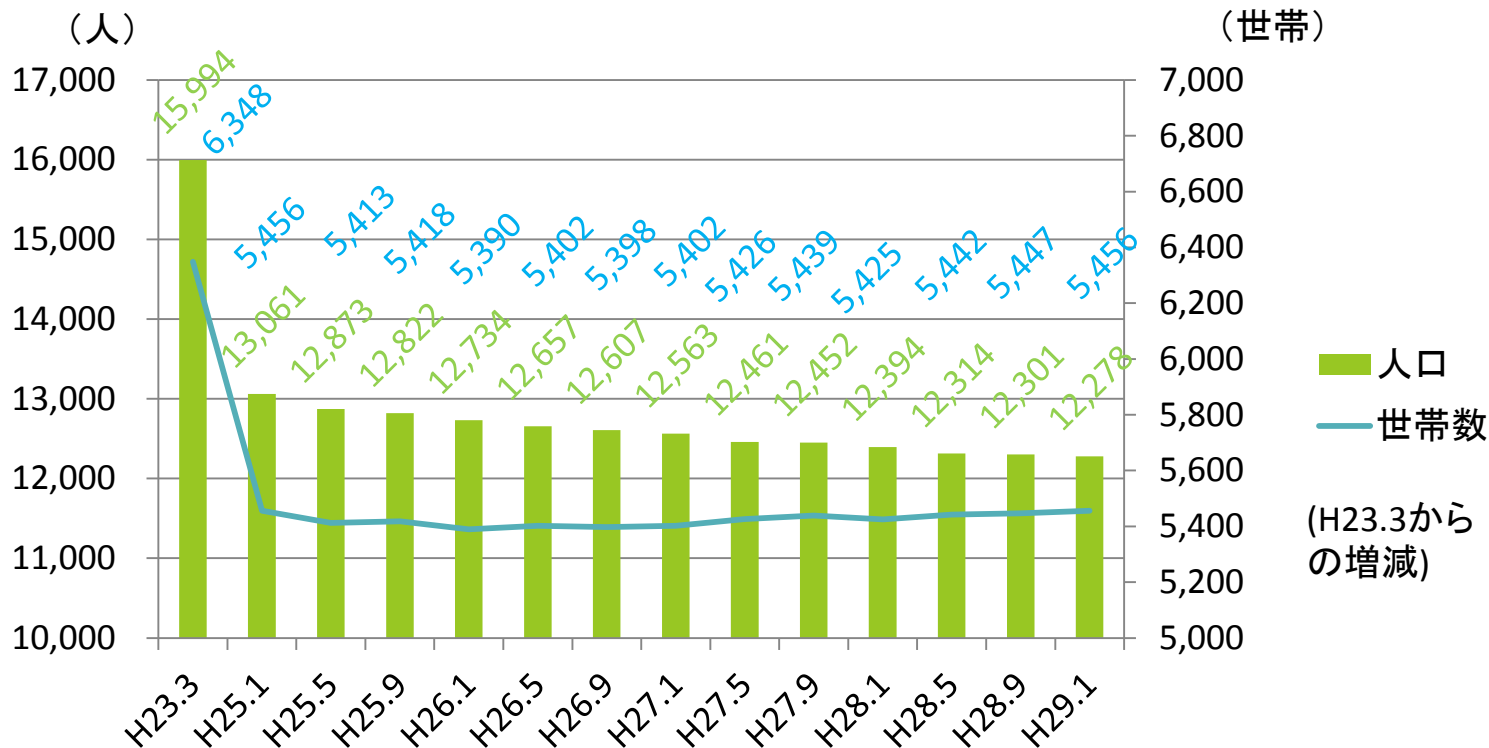

| 震災前 (H23.3.1) | 震災後 (H28.9.30) | 増 減 |
|------------------|-------------------|----------|
| 15,944 人 | 12,278 人 | ▲3,666 人 |
| 6,388世帯 | 5,456世帯 | ▲ 932 世帯 |

(2) 応急仮設住宅の状況

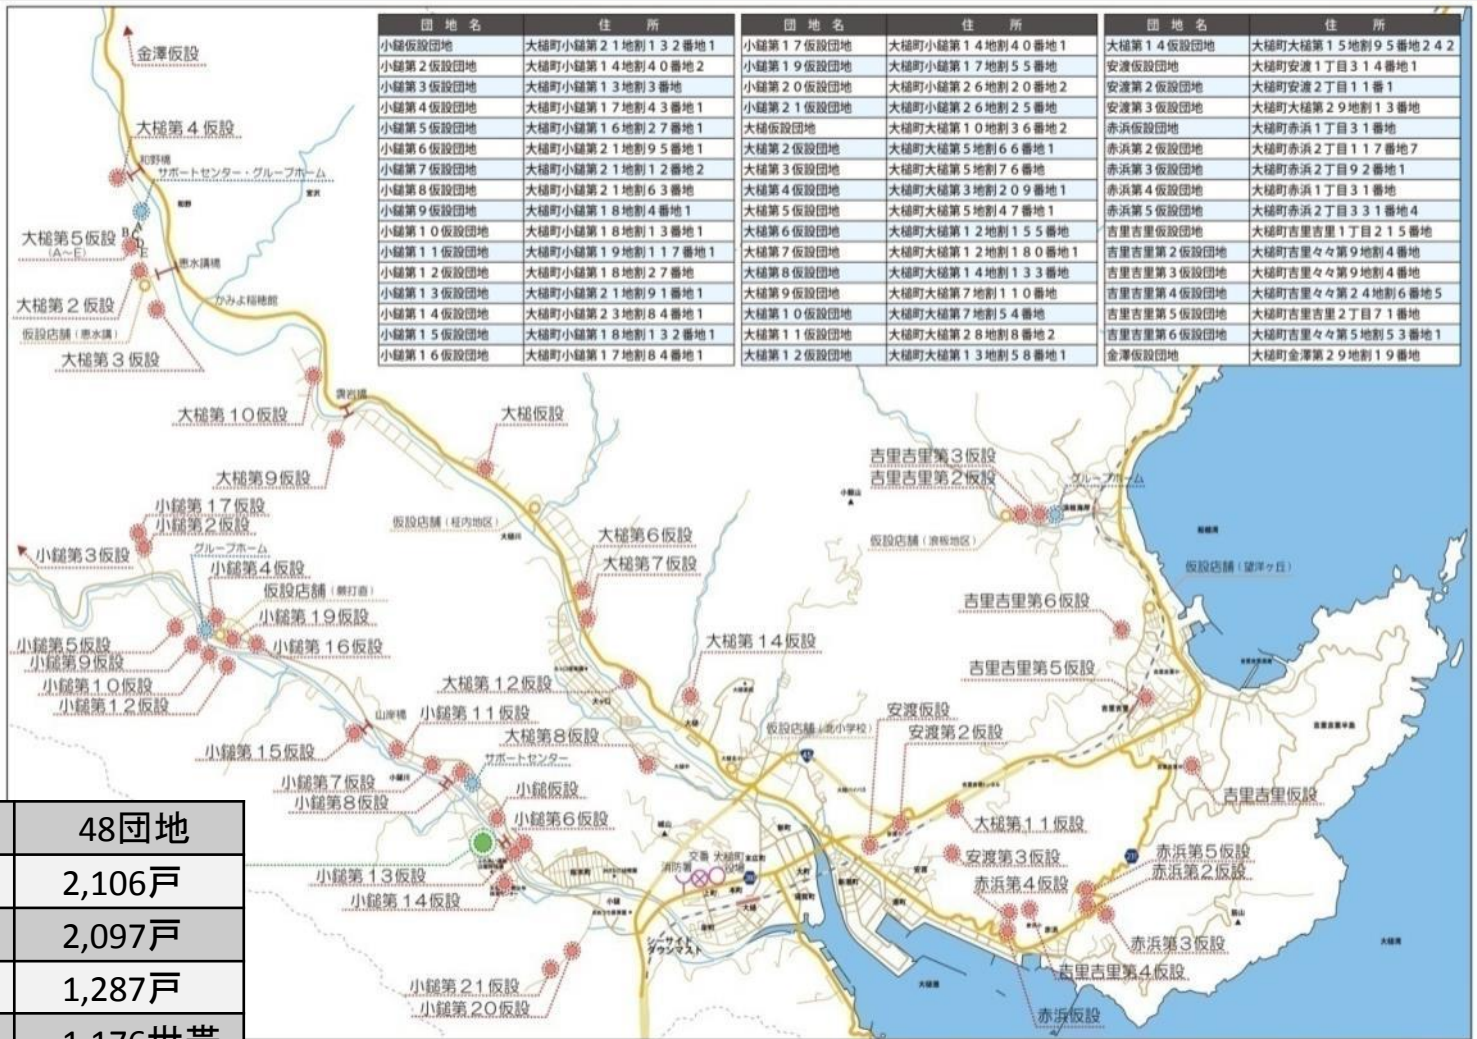


| 団地名 | 住所 | 団地名 | 住所 | 団地名 | 住所 |
|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| 小榎仮設団地 | 大榎町小榎第21地割132番地1 | 小榎第17仮設団地 | 大榎町小榎第14地割40番地1 | 大榎第14仮設団地 | 大榎町大榎第15地割95番地242 |
| 小榎第2仮設団地 | 大榎町小榎第14地割40番地2 | 小榎第19仮設団地 | 大榎町小榎第17地割55番地 | 安渡仮設団地 | 大榎町安渡1丁目314番地1 |
| 小榎第3仮設団地 | 大榎町小榎第13地割3番地 | 小榎第20仮設団地 | 大榎町小榎第26地割20番地2 | 安渡第2仮設団地 | 大榎町安渡2丁目11番1 |
| 小榎第4仮設団地 | 大榎町小榎第17地割43番地1 | 小榎第21仮設団地 | 大榎町小榎第26地割25番地 | 安渡第3仮設団地 | 大榎町大榎第29地割13番地 |
| 小榎第5仮設団地 | 大榎町小榎第16地割27番地1 | 大榎仮設団地 | 大榎町大榎第10地割36番地2 | 赤浜仮設団地 | 大榎町赤浜1丁目31番地 |
| 小榎第6仮設団地 | 大榎町小榎第21地割95番地1 | 大榎第2仮設団地 | 大榎町大榎第5地割66番地1 | 赤浜第2仮設団地 | 大榎町赤浜2丁目117番地7 |
| 小榎第7仮設団地 | 大榎町小榎第21地割12番地2 | 大榎第3仮設団地 | 大榎町大榎第5地割76番地 | 赤浜第3仮設団地 | 大榎町赤浜2丁目92番地1 |
| 小榎第8仮設団地 | 大榎町小榎第21地割63番地 | 大榎第4仮設団地 | 大榎町大榎第3地割209番地1 | 赤浜第4仮設団地 | 大榎町赤浜1丁目31番地 |
| 小榎第9仮設団地 | 大榎町小榎第18地割4番地1 | 大榎第5仮設団地 | 大榎町大榎第5地割47番地1 | 赤浜第5仮設団地 | 大榎町赤浜2丁目331番地4 |
| 小榎第10仮設団地 | 大榎町小榎第18地割13番地1 | 大榎第6仮設団地 | 大榎町大榎第12地割155番地 | 吉里吉里仮設団地 | 大榎町吉里吉里1丁目215番地 |
| 小榎第11仮設団地 | 大榎町小榎第19地割117番地1 | 大榎第7仮設団地 | 大榎町大榎第12地割180番地1 | 吉里吉里第2仮設団地 | 大榎町吉里々々第9地割4番地 |
| 小榎第12仮設団地 | 大榎町小榎第18地割27番地 | 大榎第8仮設団地 | 大榎町大榎第14地割133番地 | 吉里吉里第3仮設団地 | 大榎町吉里々々第9地割4番地 |
| 小榎第13仮設団地 | 大榎町小榎第21地割91番地1 | 大榎第9仮設団地 | 大榎町大榎第7地割110番地 | 吉里吉里第4仮設団地 | 大榎町吉里々々第24地割6番地5 |
| 小榎第14仮設団地 | 大榎町小榎第23地割84番地1 | 大榎第10仮設団地 | 大榎町大榎第7地割54番地 | 吉里吉里第5仮設団地 | 大榎町吉里吉里2丁目71番地 |
| 小榎第15仮設団地 | 大榎町小榎第18地割132番地1 | 大榎第11仮設団地 | 大榎町大榎第28地割8番地2 | 吉里吉里第6仮設団地 | 大榎町吉里々々第5地割53番地1 |
| 小榎第16仮設団地 | 大榎町小榎第17地割84番地1 | 大榎第12仮設団地 | 大榎町大榎第13地割58番地1 | 金澤仮設団地 | 大榎町金澤第29地割19番地 |

| | | |
|-------|-------|---------|
| 団地数 | | 48団地 |
| 建設戸数 | | 2,106戸 |
| 住宅戸数 | (A) | 2,097戸 |
| 入居戸数 | (B) | 1,287戸 |
| 入居世帯数 | | 1,176世帯 |
| 入居者数 | | 2,420人 |
| 入居率 | (B/A) | 61.4% |
| 空き部屋数 | (A-B) | 810戸 |

※H29.2.28現在

(2) 応急仮設住宅の状況


入居見込数(戸)

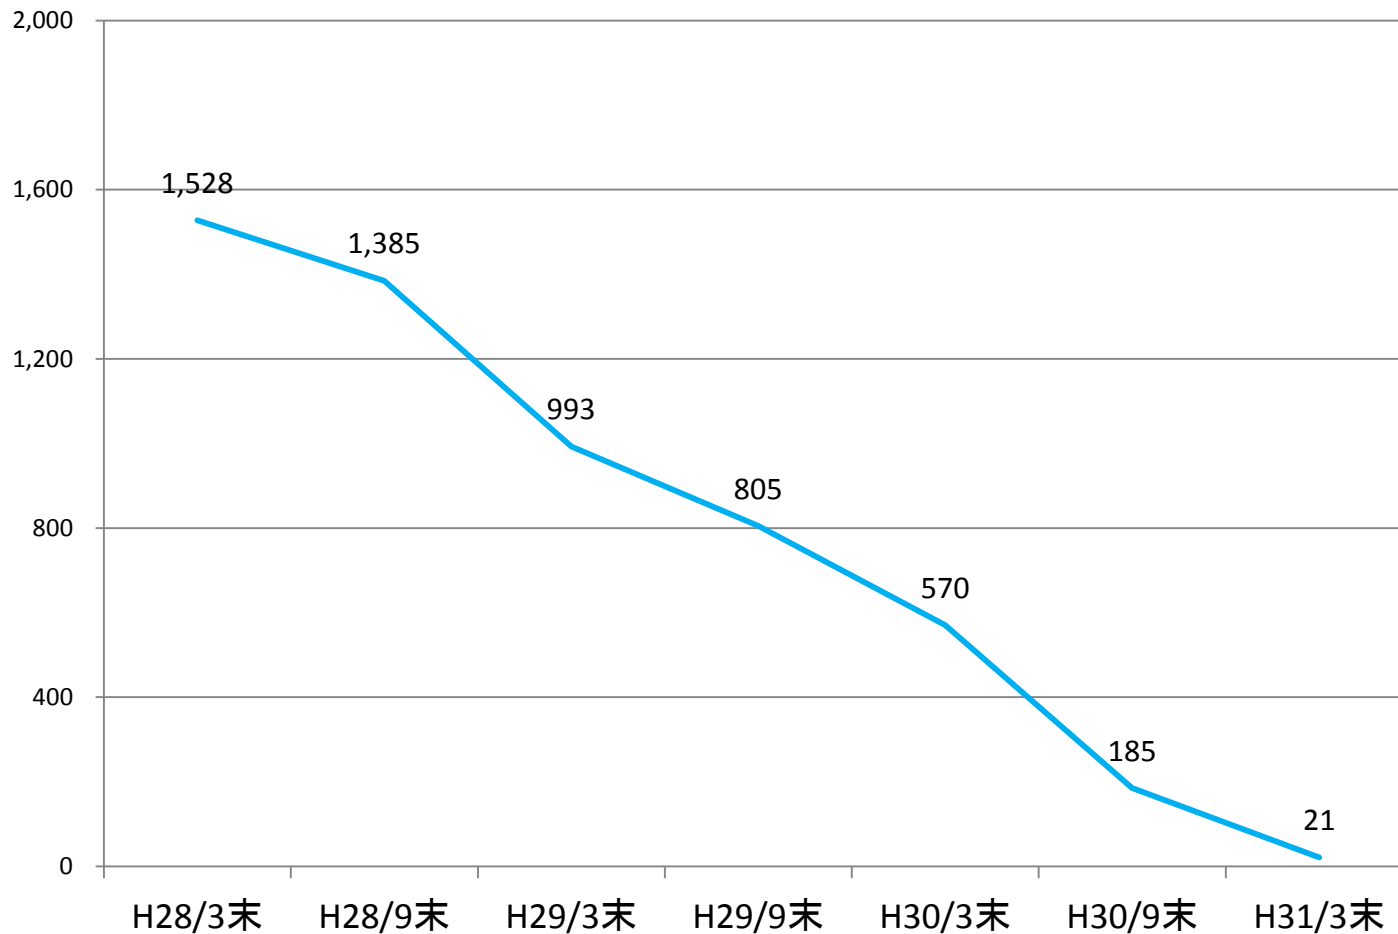

※H29.2.28現在


(3) 町外避難者数等

○町外避難者数

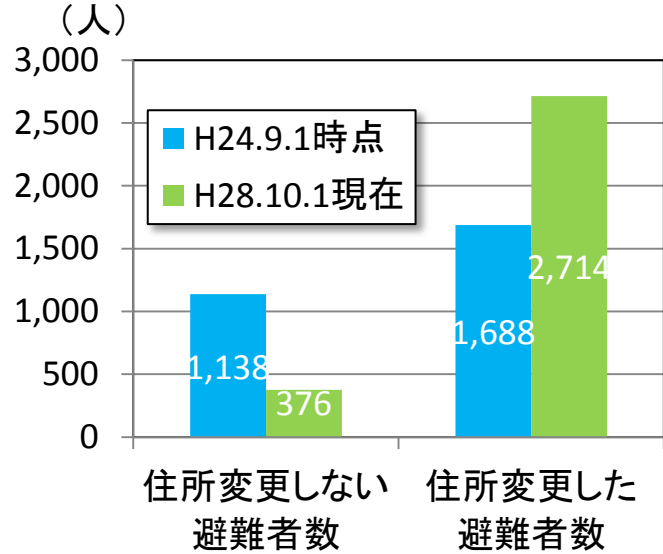



| 区 分 | H24.9.1時点 | H28.10.1現在 | 増 減 |
|-------------|-----------|------------|--------|
| 住所変更しない避難者数 | 1,138人 | 376人 | ▲762人 |
| 住所変更した避難者数 | 1,688人 | 2,714人 | 1,026人 |
| 計 | 2,826人 | 3,090人 | 264人 |

○児童生徒数




| 区 分 | 震災前 (H23.3.1) | 震災後 (H28.4.1) | 増 減 |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 児童生徒数 | 1,224人 | 777人 | ▲447人 |
| 生活保護受給者数 | 286人 | 108人 | ▲178人 |


2. 町の復旧・復興の状況 (1) 予算の状況

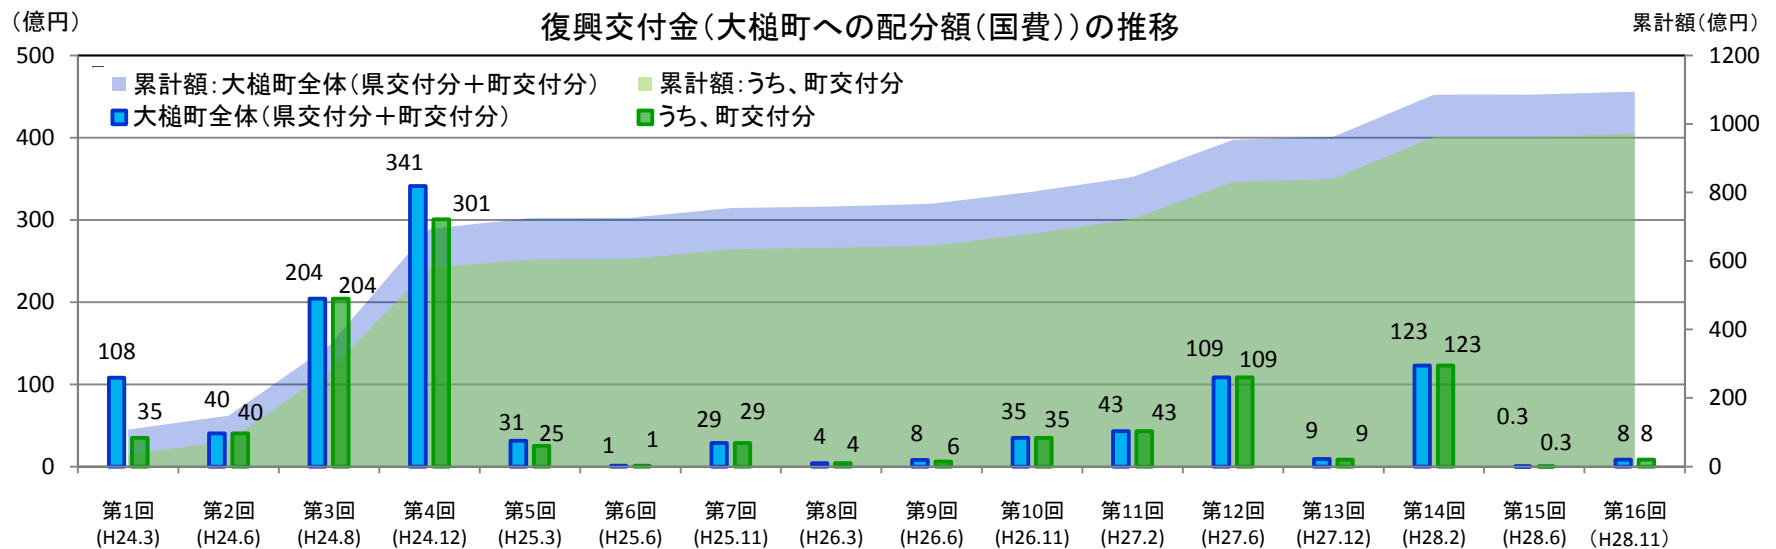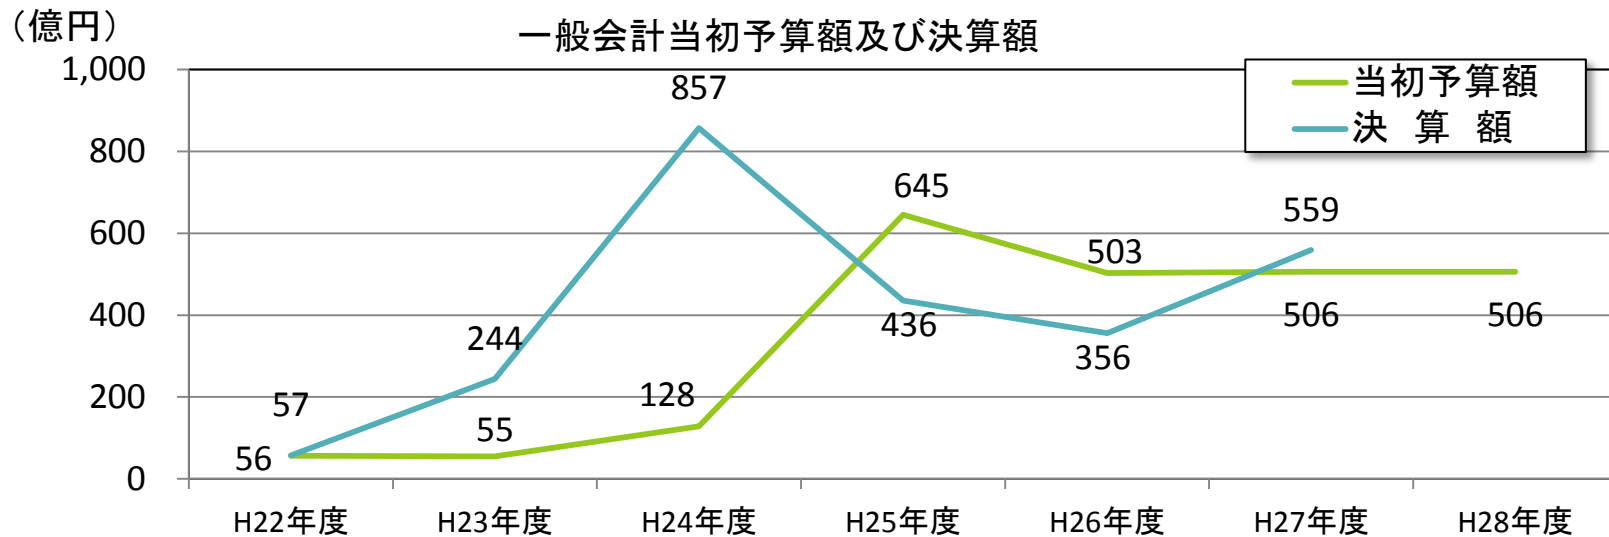


(2) 復旧事業の進捗状況




| | |
|---------|-------|
| 建物撤去総数 | 215箇所 |
| 建物撤去完了数 | 215箇所 |




| | |
|---------------------------|-------|
| 災害廃棄物等総量 (津波堆積物込み) | 656千t |
| 災害廃棄物等処理済み数量 (津波堆積物込み) | 656千t |




| | |
|-----------|------|
| 被災した町道箇所数 | 39箇所 |
| 復旧した町道箇所数 | 39箇所 |



| | |
|-------------|-----|
| 被災した橋りょう箇所数 | 3箇所 |
| 復旧した橋りょう箇所数 | 2箇所 |




| | |
|---------|-----|
| 被災した箇所数 | 5箇所 |
| 復旧した箇所数 | 5箇所 |



| | |
|----------|------|
| 津波冠水農地面積 | 14ha |
| 復旧農地面積 | 7ha |

(3) 復興事業の進捗状況


① 土地区画整理事業

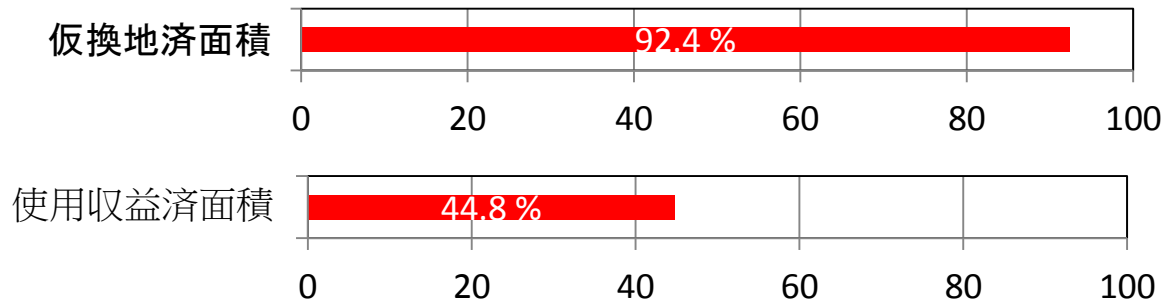

| | |
|--------|-------------------------|
| 換地計画面積 | 346,258.4m ² |
| 仮換地済面積 | 319,831.5m ² |


| | |
|---------|-------------------------|
| 換地計画面積 | 346,258.4m ² |
| 使用収益済面積 | 155,171.0m ² |

② 防災集団移転事業




| | |
|---------|------|
| 計画宅地数 | 419戸 |
| 整備済宅地戸数 | 285戸 |

③ 災害公営住宅



| | |
|-------|------|
| 計画戸数 | 916戸 |
| 完成済戸数 | 419戸 |

④ 漁業集落防災機能強化事業



| | |
|---------|-----|
| 計画戸数 | 12戸 |
| 整備済宅地戸数 | 10戸 |

(3) 復興事業の進捗状況

① 土地区画整理事業


| 地区 | | | 町方 | 安渡 | 赤浜 | 吉里吉里 | 計 |
|----------|----|----|-----------|----------|----------|-----------|------|
| 面積 (ha) | | ※1 | 30.0 | 5.9 | 7.7 | 9.1 | 52.7 |
| 計画人口 (人) | | ※1 | 2100 | 400 | 360 | 550 | 3410 |
| 都市計画決定 | 当初 | ※1 | H24.9.28 | H24.9.28 | H24.9.28 | H24.9.28 | |
| | 最新 | ※1 | H27.10.26 | H27.8.19 | H26.12.8 | H27.8.19 | |
| 事業計画認可 | 当初 | ※1 | H25.3.7 | H25.3.7 | H25.3.7 | H25.3.7 | |
| | 最新 | ※1 | H28.1.7 | H28.5.23 | H28.3.2 | H27.11.24 | |
| 宅地完成年月 | | ※2 | H30.1 | H30.4 | H30.3 | H29.10 | |

② 防災集団移転促進事業

| 地区 | | | 町方・小枕・伸松 | 安渡 | 赤浜 | 吉里吉里 | 浪板 | 計 |
|----------------------|--------|----|--------------------|----------|---------|----------|----------|------|
| 移転促進区域 面積 (ha) | 地区面積 | ※1 | 28.5 | 13.6 | 6.7 | 8.3 | 3.3 | 60.4 |
| | 住宅団地面積 | ※1 | 20.3 | 11.2 | 6.5 | 5.9 | 2.3 | 46.2 |
| 被災前戸数 (戸) | | ※1 | 918 | 482 | 140 | 177 | 47 | 1764 |
| 移転先住宅団地 (戸) | | | | | | | | |
| ※団地内の災害公営 住宅戸数を含む | | ※2 | 272 | 65 | 84 | 66 | 11 | 498 |
| 移転先団地面積 (ha) | | ※1 | 13.4 | 5.3 | 7.0 | 3.7 | 0.7 | 30.1 |
| 国土交通大臣 同意・変更同意 | 当初 | ※1 | H24.9.24 | H24.9.24 | H24.9.4 | H24.9.24 | H24.9.24 | |
| | 最新 | ※1 | H28.6.17※大槌町全地区を統合 | | | | | |
| 宅地完成年月 | | ※2 | H29.12 | H30.3 | H31.2 | H28.9 | H27.6 | |

(3) 復興事業の進捗状況 ～区画整理等～

① 復興まちづくり(区画数)

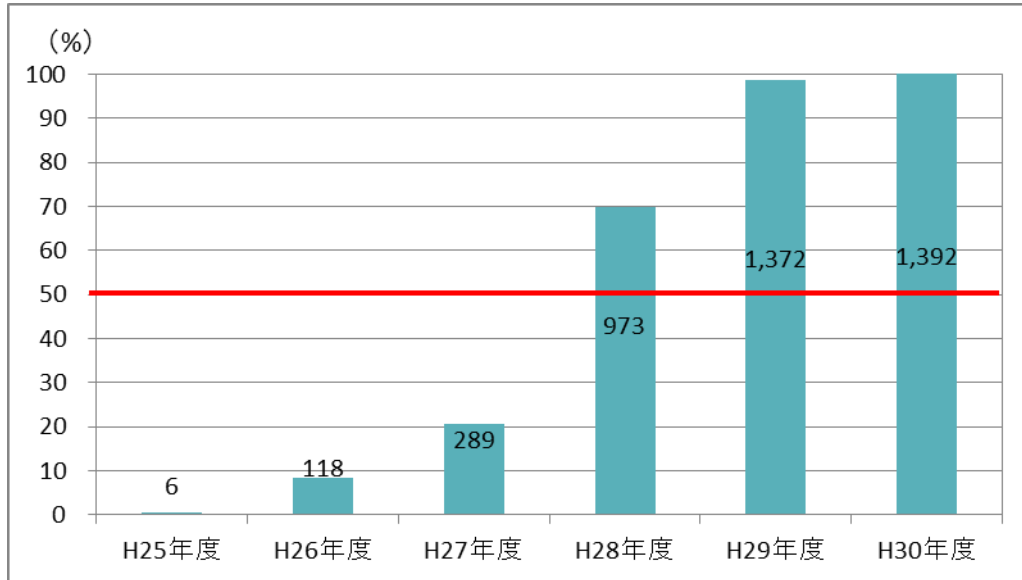


| | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 合計 |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 土地区画整理 | 0 | 23 | 100 | 531 | 298 | 9 | 961 |
| 防災集団移転 | 6 | 89 | 71 | 141 | 101 | 11 | 419 |
| 漁業集落防災機能強化 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 区画合計 | 6 | 112 | 171 | 684 | 399 | 20 | 1,392 |
| 割合(%) | 0 | 8 | 21 | 70 | 99 | 100.0 | |
| 累計 | 6 | 118 | 289 | 973 | 1,372 | 1,392 | |



※撮影場所: 町方地区

(4) 復興事業の進捗状況 ～災害公営住宅～

災害公営住宅戸数

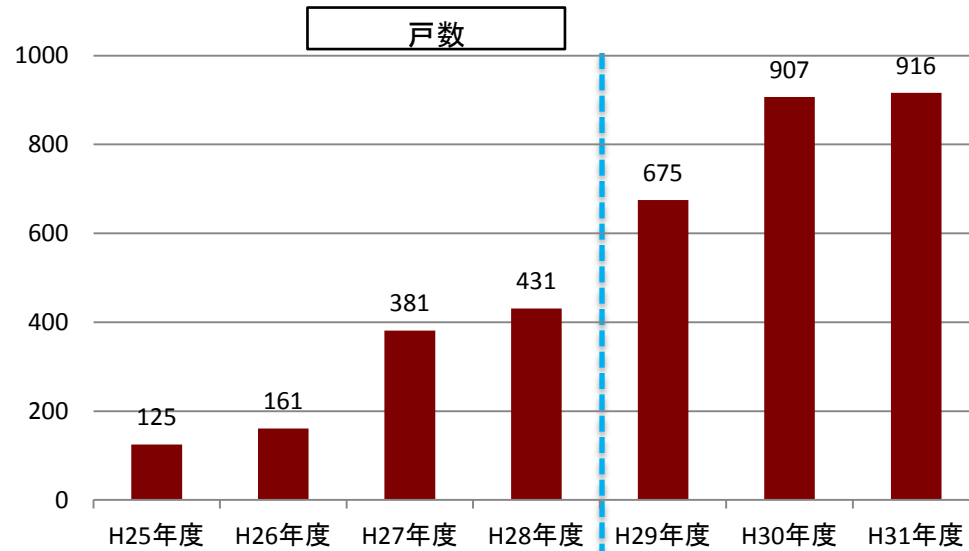

実績

計画

| | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 単年度 | 125 | 36 | 220 | 50 | 244 | 232 | 9 |
| 累計 | 125 | 161 | 381 | 431 | 675 | 907 | 916 |

末広町災害公営住宅 H28.03完成




柁内第2災害公営住宅 H28.03完成



(5) 復興事業の進捗状況 ～職員数～


○職員数の推移

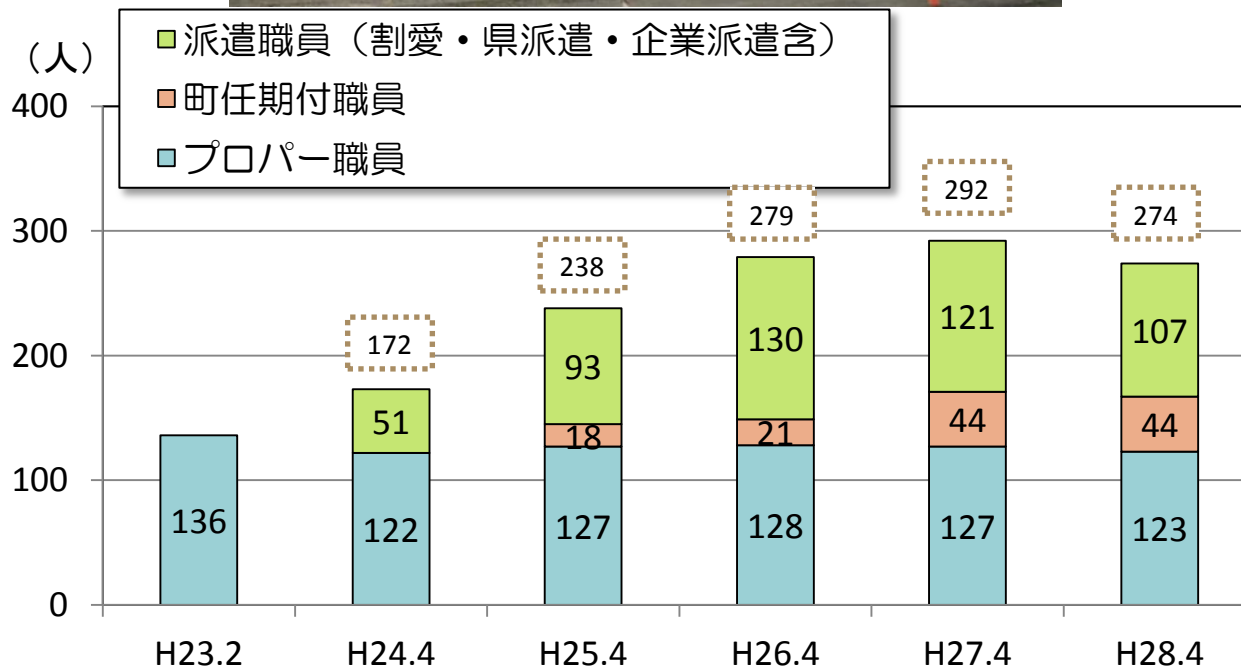


※H28.4.1現在

3. 産業の状況 (1) 生業の状況

○生業




○新規求職者数・求人数

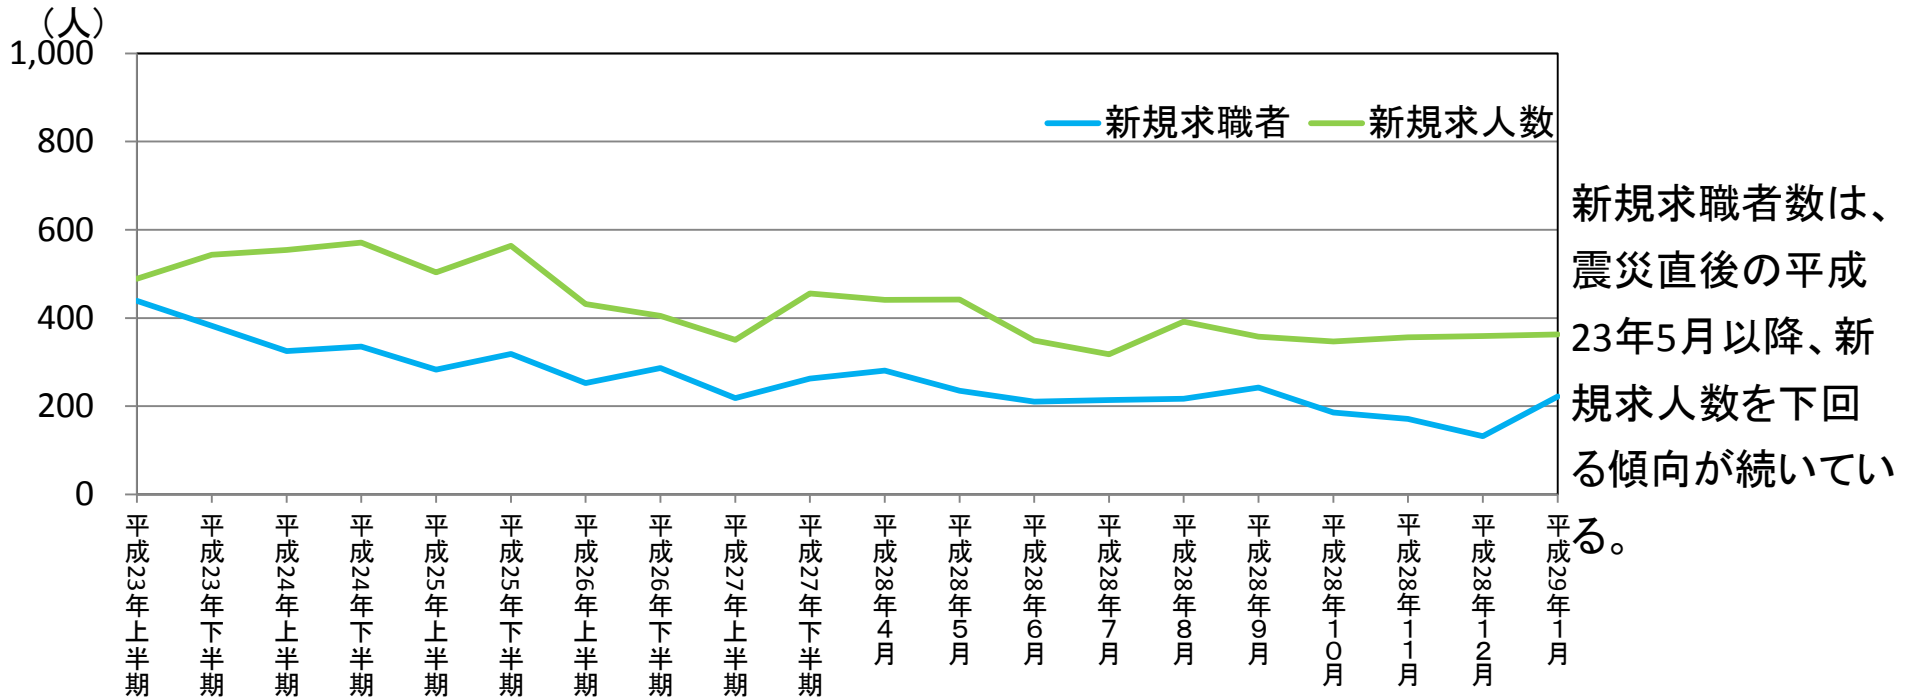

(2) 水産業の状況


○施設等整備

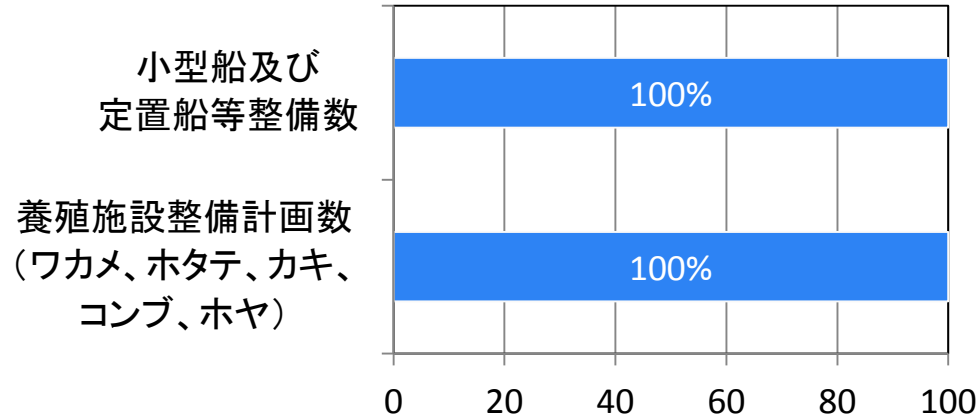

| | |
|----------------|------|
| 小型船及び定置船等整備計画数 | 237隻 |
| 小型船及び定置船等整備数 | 237隻 |

| | |
|-------------------------------|------|
| 養殖施設整備計画数 (ワカメ、ホタテ、カキ、コンブ、ホヤ) | 580台 |
| 養殖施設整備数 (ワカメ、ホタテ、カキ、コンブ、ホヤ) | 580台 |


○水産加工業者数

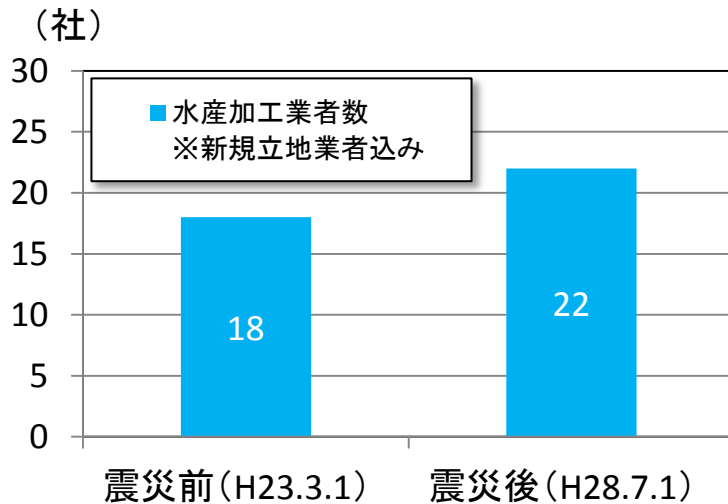

※ナカシヨク、伊藤商店、浦田商店、ゼネラルオイスター、平庄、小豆嶋漁業、T R S、及順商店、たかのり海産、大鶴商店、六串商店、あさひ堂、石山水産、小野食品、壮関、中里商店、越田鮮魚店、芳賀鮮魚店、デジタルブックプリント、小国商店、魚よし、どまん中・おおつち

(2) 水産業の状況

○主要水産物水揚げ高

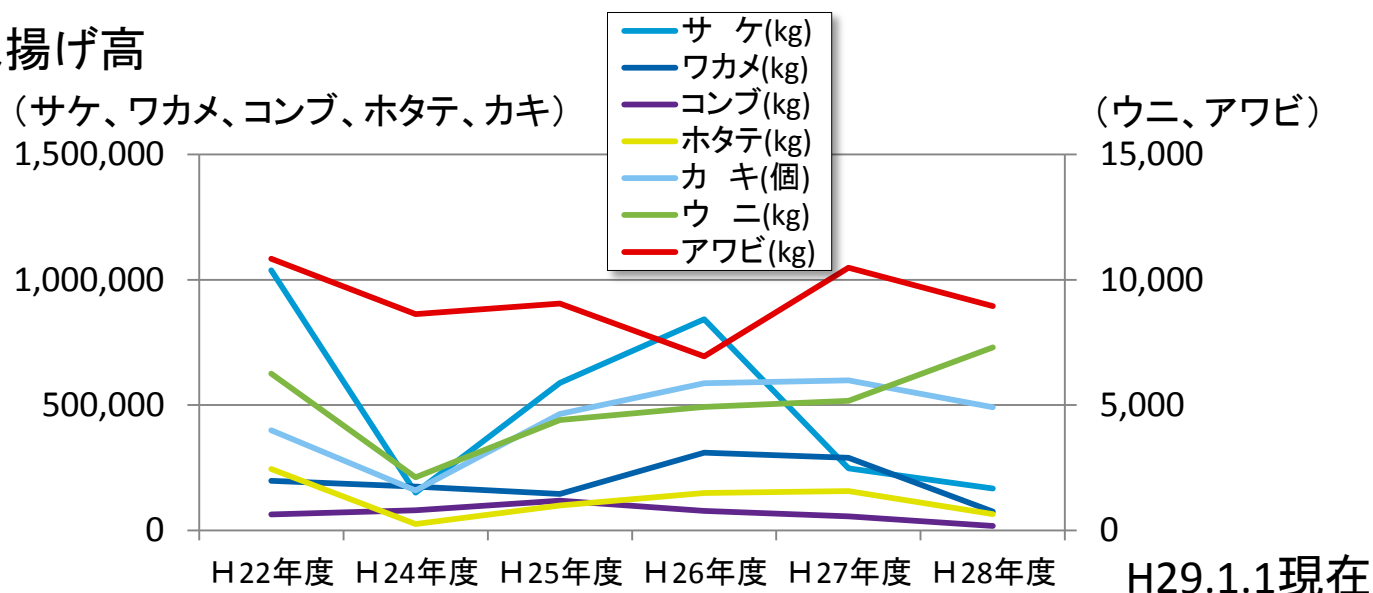

主要水産物水揚げ高

| 区分 | H22年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| サケ(kg) | 1,037,194 | 150,386 | 588,321 | 842,084 | 246,845 | 166,284 |
| ウニ(kg) | 6,249 | 2,111 | 4,396 | 4,924 | 5,171 | 7,296 |
| アワビ(kg) | 10,837 | 8,625 | 9,045 | 6,941 | 10,477 | 8,948 |
| ワカメ(kg) | 197,023 | 175,025 | 145,233 | 309,739 | 289,151 | 75,216 |
| コンブ(kg) | 63,690 | 79,789 | 117,764 | 77,730 | 55,770 | 16,935 |
| ホタテ(kg) | 244,404 | 25,059 | 99,253 | 149,420 | 156,600 | 64,169 |
| カキ(個) | 399,290 | 159,253 | 464,798 | 586,359 | 598,390 | 490,676 |

4. 公共施設の再建状況 (1)消防署 (2)県立大槌病院

(1) 消防署



- 平成28年年3月19日落成式・運用開始
- 建設場所: 大槌町大槌14地割142番地1 大槌中学校跡(源水地区)
- 再建施設はH26年に建築工事着手

(2) 県立大槌病院



- 平成28年5月9日開院
- 建設場所: 上閉伊郡大槌町小槌22-31-2
- 病院の機能
 - (1) 圏域の地域病院として、広域基幹病院である県立釜石病院等と連携しながら高齢者を中心とした入院機能を担う。
 - (2) 診療時間内の一次診療を基本とし、診療時間外の救急は県立釜石病院で対応する。
 - (3) 入院患者を中心とした維持期のリハビリテーション機能を提供する。
- 診療科及び病床規模
 - (1) 診療科 内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科
 - (2) 病床数 1病棟 一般病床50床

(3) 小中一貫校（平成28年9月開校）



大槌学園外観

- 住所：大槌町大槌第15地割71番9号
- 大槌小、大槌北小、赤浜小、大槌中学校が被災。
- 安渡小を含め4小学校・1中学校を合わせて寺野地区に仮設校舎設置。
- 大槌学園小中一貫教育校として再建することとし、移転先を決定（H26.3都市計画決定）。校舎はH27年2月より建築工事着手、H28年9月26日開校。
- 吉里吉里小・吉里吉里中は、吉里吉里学園として、小中校舎を小学部・中学部校舎として使用。
- H27年4月から小中一貫教育「ふるさと科」が本格実施。



体育館

授業風景



(4) 納骨堂



- ・供用開始:平成29年2月19日
- ・建設場所:大槌町小槌第32地割字金崎126番34
(中央公民館駐車場内部)
- ・建設趣旨:東日本大震災津波による身元不明の御遺骨(計70柱。平成29年2月末現在)を収蔵するもの
- ・敷地面積:687.13m²
- ・建築面積:10.37m²

(5) 御社地エリア復興拠点施設

完成イメージ図



東日本大震災により被災した御社地ふれあいセンター、大槌町立図書館等を(仮称)御社地エリア復興拠点施設として整備。

- 建設場所: 大槌町末広町2番、大町7番
- 施設の用途: 図書館、ホール、生涯学習施設会議・交流・町民活動施設
- 階数: 地上3階建て
- 延床面積: 2,200m²程度

スケジュール (予定含む)

| | |
|----------|--------|
| 平成28年 3月 | 基本設計完了 |
| 平成28年11月 | 実施設計完了 |
| 平成28年12月 | 着工 |
| 平成30年 3月 | 完成 |
| 4月 | 開館 |
| 平成30年 6月 | 図書館開館 |

(6) 公民館



H28.12
安渡地区公民館・避難ホール外観



安渡地区公民館・避難ホール外観



避難ホール内装

- 安渡、赤浜、吉里吉里地区とも被災し、解体済
- 安渡地区公民館・避難ホールはH28年11月30日完成
- 赤浜地区公民館・復興まちづくり支援施設は整備用地調整中
- 吉里吉里地区は公民館単独で再建、建築設計中

5. 生活再建と支援

(1) 地域復興協議会とコミュニティ協議会

地域復興協議会

災害復興対策を総合的かつ計画的に推進するための過程において、地域住民との合意形成を図るため、地域復興協議会を設置しています。

主に次の項目を協議します。

- 大槌町震災復興構想素案に関する事
- 地域復興計画策定に関する事
- 身近な暮らしや地域の課題に関する事

年2回程度開催



コミュニティ協議会

町内の自治会組織、NPO及び企業などの代表が集まり、被災者支援やコミュニティ形成、観光、地域活性化など共有の課題解決について議論するとともに、各団体間の交流を図る場として、コミュニティ協議会を設置しています。

年2回程度開催



(2) 自治会の設立状況と活動例

既設の自治会

- 吉里吉里1～4丁目、花道育成会
- 安渡町内会、沢山町内会
- 源水町内会、大ケ口団地町内会
- 桜木町町内会、花輪田町内会

震災後新設した自治会

- 赤浜自治会
- 吉里吉里町営住宅自治会
- 柁内町内会
- 大ケ口一丁目町営住宅町内会
- 大ケ口町内会
- 臼澤自治会
- 迫又町内会

28～29年度に 新設予定の自治会


- 末広町町内会
- 小枕町内会

休止中または 自治会のない地区

- 上町、本町、大町、新町、松の下、金沢、小鎚、浪板



(3) ボランティア数の推移

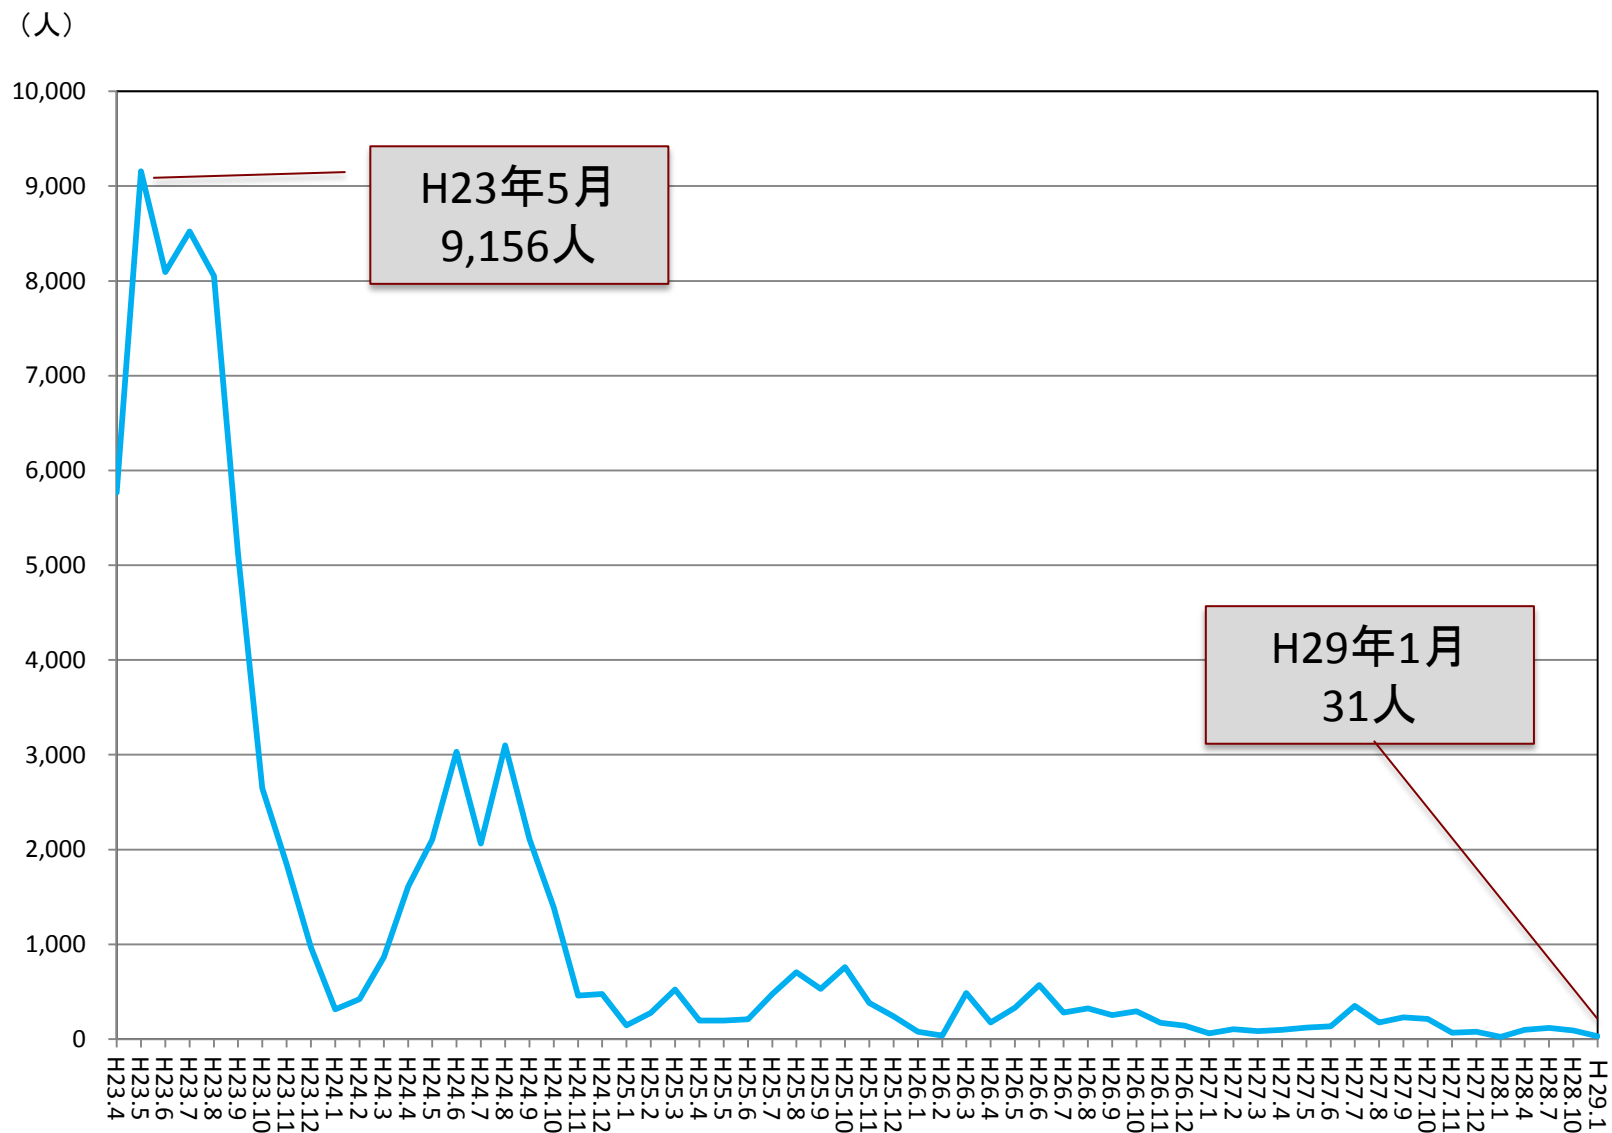

6. スケジュール (1) 面整備

| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要 | 年度別整備スケジュール | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------------|--|--|--|
| | | | | | 第1期 (基礎復旧期間) | | | 第2期 (本修復期間) | | | | 第3期 (更なる展開への連結期間) | | | |
| | | | | | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | | |
| 海岸保全施設 | 一般海岸 | 県 | 1 大植川 | (災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=1基 | 用地、設計等 | ★工事 H31完成予定 | | | | | | | | | |
| | | | 2 小植川 | (災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=1基 | 用地、設計等 | ★工事 H31完成予定 | | | | | | | | | |
| | 林野海岸 | | 3 浪板地区 | (治山施設災害) 防潮堤L=0.4km | ■H24.10完成 | | | | | | | | | | |
| | 漁港海岸 | | 4 吉里吉里漁港海岸 | (災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=4基 他 | 用地、設計等 | ★工事 | | | | | | | | | |
| | | | 5 大植漁港海岸 | (災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=3基 他 | 用地、設計等 | ★工事 | | | | | | | | | |
| 復興道路等 | 復興道路 | 国 | A 三陸沿岸道路 | 釜石山田道路 | ★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石岡石IC、大植IC～山田南IC H30開通予定 | | | | | | | | | | |
| | 復興関連道路 | 県 | B (主) 大植小国線 | 土坂の3 | ★工事 | | | | | | | | | | |
| 漁港 | 漁港 | 県 | ① 吉里吉里漁港 | (漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=753m 他 | ■H28.3完成 | | | | | | | | | | |
| | | | ② 大植漁港 | (漁港災害) 防波堤L=1,486m、岸壁L=2,582m 他 | ■H28.3完成 | | | | | | | | | | |
| 医療 | 病院 | 県 | 県立大植病院 | 病院(RC造) 医師公舎(RC造) 職員公舎(RC造) | ■H28.3完成 | | | | | | | | | | |
| 教育 | 小学校 | 町 | 大植小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大植北小学校 | (災害復旧) 移転 | ■H28.9完成 | | | | | | | | | | |
| | 中学校 | | 大植中学校 | (災害復旧) 移転 | ■H28.9完成 | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり | まちづくり連携道路 | 県 | 1 (一)吉里吉里釜石線 | 赤浜 | ◆H28.5着工 | ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 | | | | | | | | | |

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成28年9月30日(平成28年10月27日公表))」より

(1) 面整備

| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要 | 年度別整備スケジュール | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------------|--------------------------|---|----------------|-----|-----|----------------|-----|--------------|---------------|---------------------|----------|--------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | 第1期 (復興復興期) | | | 第2期 (生活復興期) | | | | 第3期 (新たな展開への連結期) | | | | | |
| | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | | |
| 復興まちづくり | 土地区画整理 | 町 | a 町方地区 | 区域面積: 30.0ha 対象戸数: 813戸 (民510戸・公303戸) | 用地、設計等 | | | | | 民95戸 公53戸 | 民325戸 公12戸 | 民90戸 公37戸 | | | | | |
| | | | b 安渡地区 | 区域面積: 5.9ha 対象戸数: 176戸 (民110戸・公66戸) | 用地、設計等 | | | | | | 民28戸 | 民73戸 公35戸 | | | 民6戸 公33戸 | | |
| | | | c 赤浜地区 | 区域面積: 7.7ha 対象戸数: 147戸 (民147戸) | 用地、設計等 | | | | | | 民66戸 | | 民81戸 | | | | |
| | | | d 吉里吉里地区 | 区域面積: 9.1ha 対象戸数: 216戸 (民194戸・公22戸) | 用地、設計等 | | | | | | 民23戸 | 民5戸 | 民112戸 | 民54戸 公20戸 | | 公2戸 | |
| | | | e 町方地区 | 区域面積 町方地区(3.8ha) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | | |
| | | | f 安渡地区 | 区域面積 安渡地区(19.6ha) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | | |
| | | | g 赤浜地区 (赤浜①団地) | 対象戸数: 20戸 (民11戸・公9戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | 民11戸 (H31)公9戸 | |
| | | | h 赤浜地区 (赤浜②団地) | 対象戸数: 33戸 (民23戸・公10戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | ■H29.9完成 | 民23戸 | 公10戸 | | |
| | | | i 赤浜地区 (赤浜③団地) | 対象戸数: 31戸 (民11戸・公20戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | 民11戸 公20戸 | | |
| | | | j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地) | 対象戸数: 18戸 (民18戸) | 用地、設計等 | | | | | | | ■H27.7完成 | 民16戸 | | | | |
| | | | k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地) | 対象戸数: 35戸 (民35戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | 民35戸 | | |
| | | | l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地) | 対象戸数: 13戸 (民13戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | ■H28.3完成 | 民13戸 | | | |
| | m 浪板地区 (浪板①団地) | 対象戸数: 11戸 (民11戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | 民11戸 | | | | |
| | n 安渡地区 | 対象戸数: 4戸 (民4戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | 民4戸 | | | |
| | o 安渡地区 (安渡①団地) | 対象戸数: 27戸 (民27戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | 民27戸 | | | |
| | p 安渡地区 (安渡②団地) | 対象戸数: 13戸 (民13戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | 民13戸 | | | |
| | q 安渡地区 (安渡③団地) | 対象戸数: 10戸 (民10戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | 民10戸 | | | |
| | r 安渡地区 (安渡④団地) | 対象戸数: 11戸 (民11戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | 民11戸 | | | |
| | s 町方・小枕・ 伸松地区 (寺野白澤団地) | 対象戸数: 140戸 (民100戸・公40戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | 民42戸 | 民24戸 公16戸 | 公11戸 | 民34戸 公13戸 | | | |
| | t 町方・小枕・ 伸松地区 (大ヶ口、沢山、夏木、 柱内、屋敷前団地) | 対象戸数: 65戸 (民65戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | 民4戸 | 民37戸 | | 民24戸 | | | |
| | u 町方・小枕・ 伸松地区 (町方団地) | 対象戸数: 35戸 (民35戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | 民7戸 | | | 民14戸 | | | |
| | v 町方・小枕・ 伸松地区 (小枕団地) | 対象戸数: 22戸 (民22戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | 民22戸 | | | |
| | w 町方・小枕・ 伸松地区 (花輪田地区) | 対象戸数: 10戸 (民10戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | ■H27.1完成 | 民10戸 | | | | | |
| | 漁業集落防災 機能強化 | z 吉里吉里地区 | 漁業集落排水施設他 | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | | | |
| | | aa 浪板地区 | 対象戸数: 21戸 (民10戸・公11戸) | 用地、設計等 | | | | | | | | | | 民10戸 | 公11戸 | | |
| | | ab 安渡地区 | 集落運他 | 用地、設計等 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ac 赤浜地区 | 対象戸数: 2戸 (民2戸) | 用地、設計等、工事 | | | | | | | | | | | 民2戸 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成28年9月30日(平成28年10月27日公表))」より

(2) 災害公営住宅

| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要 | 年度別整備スケジュール | | | | | | |
|--------|-------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|-----------|--|
| | | | | | 第1期 (平成28年度) | | 第2期 (平成29年度) | | 第3期 (平成30年度) | | |
| | | | | | H23 | H24 H25 | H26 | H27 | H28 | H29 H30 | |
| 災害公営住宅 | 県 | 直接建設 | ア 吉里吉里 (単独) | RC造5階 戸数: 34戸 | ■H23.8完成 | | | | | | |
| | | | イ 大稲(区内) | 木造 戸数: 24戸 | | ■H26.3完成 | | | | | |
| | | | ウ 大稲(屋敷前) | RC造5階 戸数: 151戸 | | ■H27.10完成 | | | | | |
| | | | エ 安渡(C) (区:安渡地区) | RC造5階 戸数: 23戸 | | | | | | | |
| | | | オ 三枚堂 (単独) | 木造 戸数: 104戸 | | | | | | | |
| | | 買取 | カ 町方1(戸建) (区:町方地区) | 木造 戸数: 32戸 | | | | | | | |
| | | | キ 町方2(戸建) (区:町方地区) | 木造 戸数: 56戸 | | | | | | | |
| | | | ク 大ケロ (単独) | 木造 戸数: 70戸 | ■H25.8完成 | | | | | | |
| | | | ケ 屋敷前 (単独) | 木造 戸数: 21戸 | ■H25.11完成 | | | | | | |
| | | | コ 大ケロ2丁目 (単独) | 木造2階 戸数: 23戸 | ■H26.9完成 | | | | | | |
| | 町 | 直接建設 | カ 町方1(共同) (区:町方地区) | RC造 戸数: 25戸 | | | | | | | |
| | | | キ 町方2(共同) (区:町方地区) | RC造 戸数: 23戸 | | | | | | | |
| | | | ク 大ケロ (単独) | 木造 戸数: 70戸 | ■H25.8完成 | | | | | | |
| | | | ケ 屋敷前 (単独) | 木造 戸数: 21戸 | ■H25.11完成 | | | | | | |
| | | | コ 大ケロ2丁目 (単独) | 木造2階 戸数: 23戸 | ■H26.9完成 | | | | | | |
| | | 買取 | カ 町方1(戸建) (区:町方地区) | 木造 戸数: 32戸 | | | | | | | |
| | | | キ 町方2(戸建) (区:町方地区) | 木造 戸数: 56戸 | | | | | | | |
| | | | ク 大ケロ (単独) | 木造 戸数: 70戸 | ■H25.8完成 | | | | | | |
| | | | ケ 屋敷前 (単独) | 木造 戸数: 21戸 | ■H25.11完成 | | | | | | |
| | | | コ 大ケロ2丁目 (単独) | 木造2階 戸数: 23戸 | ■H26.9完成 | | | | | | |

| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要 | 年度別整備スケジュール | | | | | |
|--------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|-----------|
| | | | | | 第1期 (平成28年度) | | 第2期 (平成29年度) | | 第3期 (平成30年度) | |
| | | | | | H23 | H24 H25 | H26 | H27 | H28 | H29 H30 |
| 災害公営住宅 | 買取 | 町 | チ 町方F-1 (区:町方地区) | 木造 戸数: 18戸 | | | | | | |
| | | | ツ 町方E-2 (区:町方地区) | 木造 戸数: 8戸 | | | | | | |
| | | | チ 町方E-3 (区:町方地区) | 木造 戸数: 13戸 | | | | | | |
| | | | テ 町方F-3 (区:町方地区) | 木造 戸数: 20戸 | | | | | | |
| | | | ト 吉里吉里(A) (区:吉里吉里地区) | 木造 戸数: 5戸 | | | | | | |
| | | | ナ 吉里吉里(B1) (区:吉里吉里地区) | 木造 戸数: 12戸 | | | | | | |
| | | | ニ 吉里吉里(C1) (区:吉里吉里地区) | 木造 戸数: 3戸 | | | | | | |
| | | | ヌ 吉里吉里(C2) (区:吉里吉里地区) | 木造 戸数: 2戸 | | | | | | |
| | | | ネ 赤浜①団地 (防:赤浜地区) | 木造 戸数: 9戸 | | | | | | |
| | | | ノ 赤浜②団地 (防:赤浜地区) | 木造 戸数: 10戸 | | | | | | |
| | 買取 | ハ 赤浜③団地 (防:赤浜地区) | 木造 戸数: 20戸 | | | | | | | |
| | | ヒ 浪板 (浪:浪板地区) | 木造 戸数: 11戸 | | | | | | | |
| | | ヒ 浪板(1) (単独) | 木造 戸数: 3戸 | | | | | | | |
| | | ヘ 安渡(A1) (区:安渡地区) | 木造 戸数: 10戸 | | | | | | | |
| | | ホ 安渡(A2) (区:安渡地区) | 木造 戸数: 10戸 | | | | | | | |
| | | ホ 安渡(A3) (区:安渡地区) | 木造 戸数: 2戸 | | | | | | | |
| | | マ 安渡(B1) (区:安渡地区) | 木造 戸数: 13戸 | | | | | | | |
| | | ミ 安渡(B2) (区:安渡地区) | 木造 戸数: 8戸 | | | | | | | |
| | | ム 寺野1 (防:寺野地区) | 木造 戸数: 16戸 | ■H27.9完成 | | | | | | |
| | | メ 寺野2 (防:寺野地区) | 木造 戸数: 11戸 | | | | | | | |

※「社会資本の復旧・復興ロードマップ(基準日:平成28年9月30日(平成28年10月27日公表))」より


IV 各地区の土地利用の状況

1. 町方地域、小枕・伸松地域 (1) 土地区画整理事業

平成29年1月1日現在


県道北側及び南側沿道の一部完成

- ・県道南側沿道宅地の一部完成
- ・残る県道南側について整備工事を実施

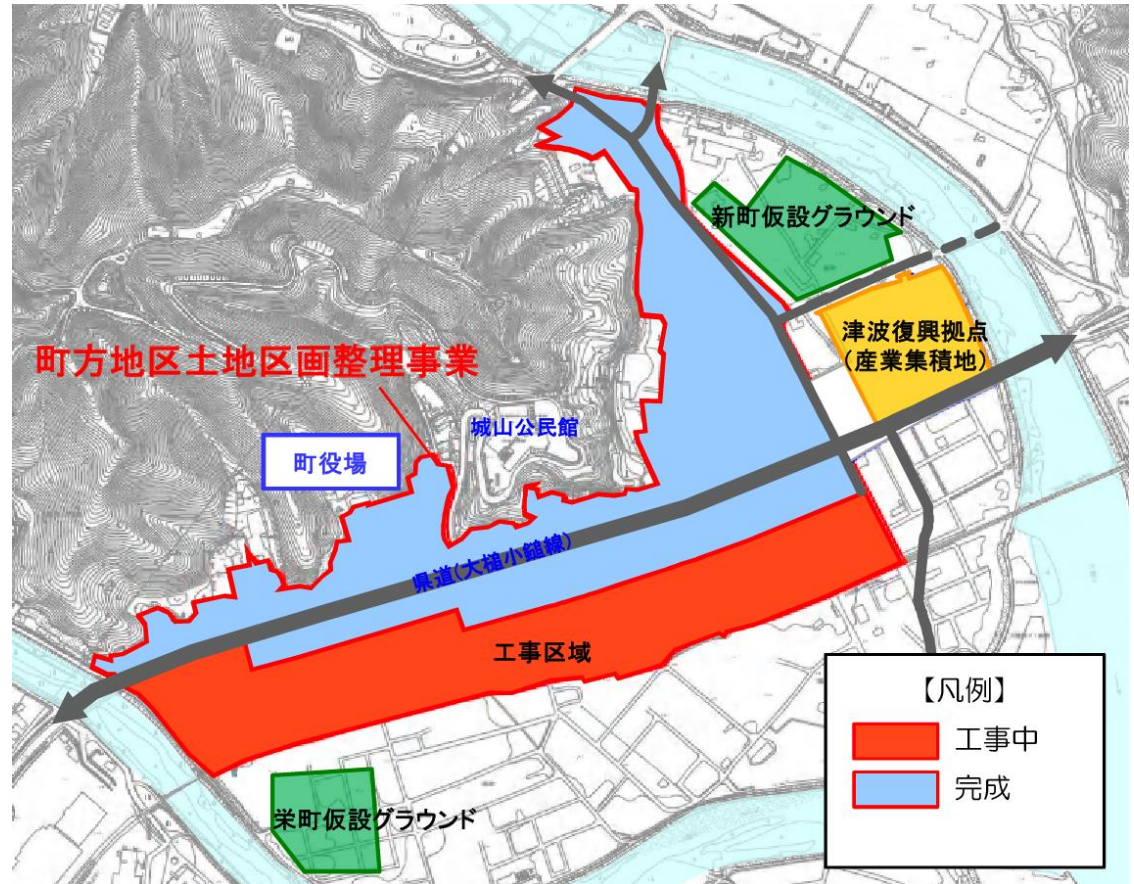


- 県道(大槌小鍬線)が完成し(平成28年7月2日開通)、県道から北側及び南側の県道沿いの一部の宅地が完成。
- 県道から南側は北から南へと宅地整備(盛土造成、上下水道工事など)を展開しており、H29年度で造成完了予定。

(2) 防災集団移転促進事業

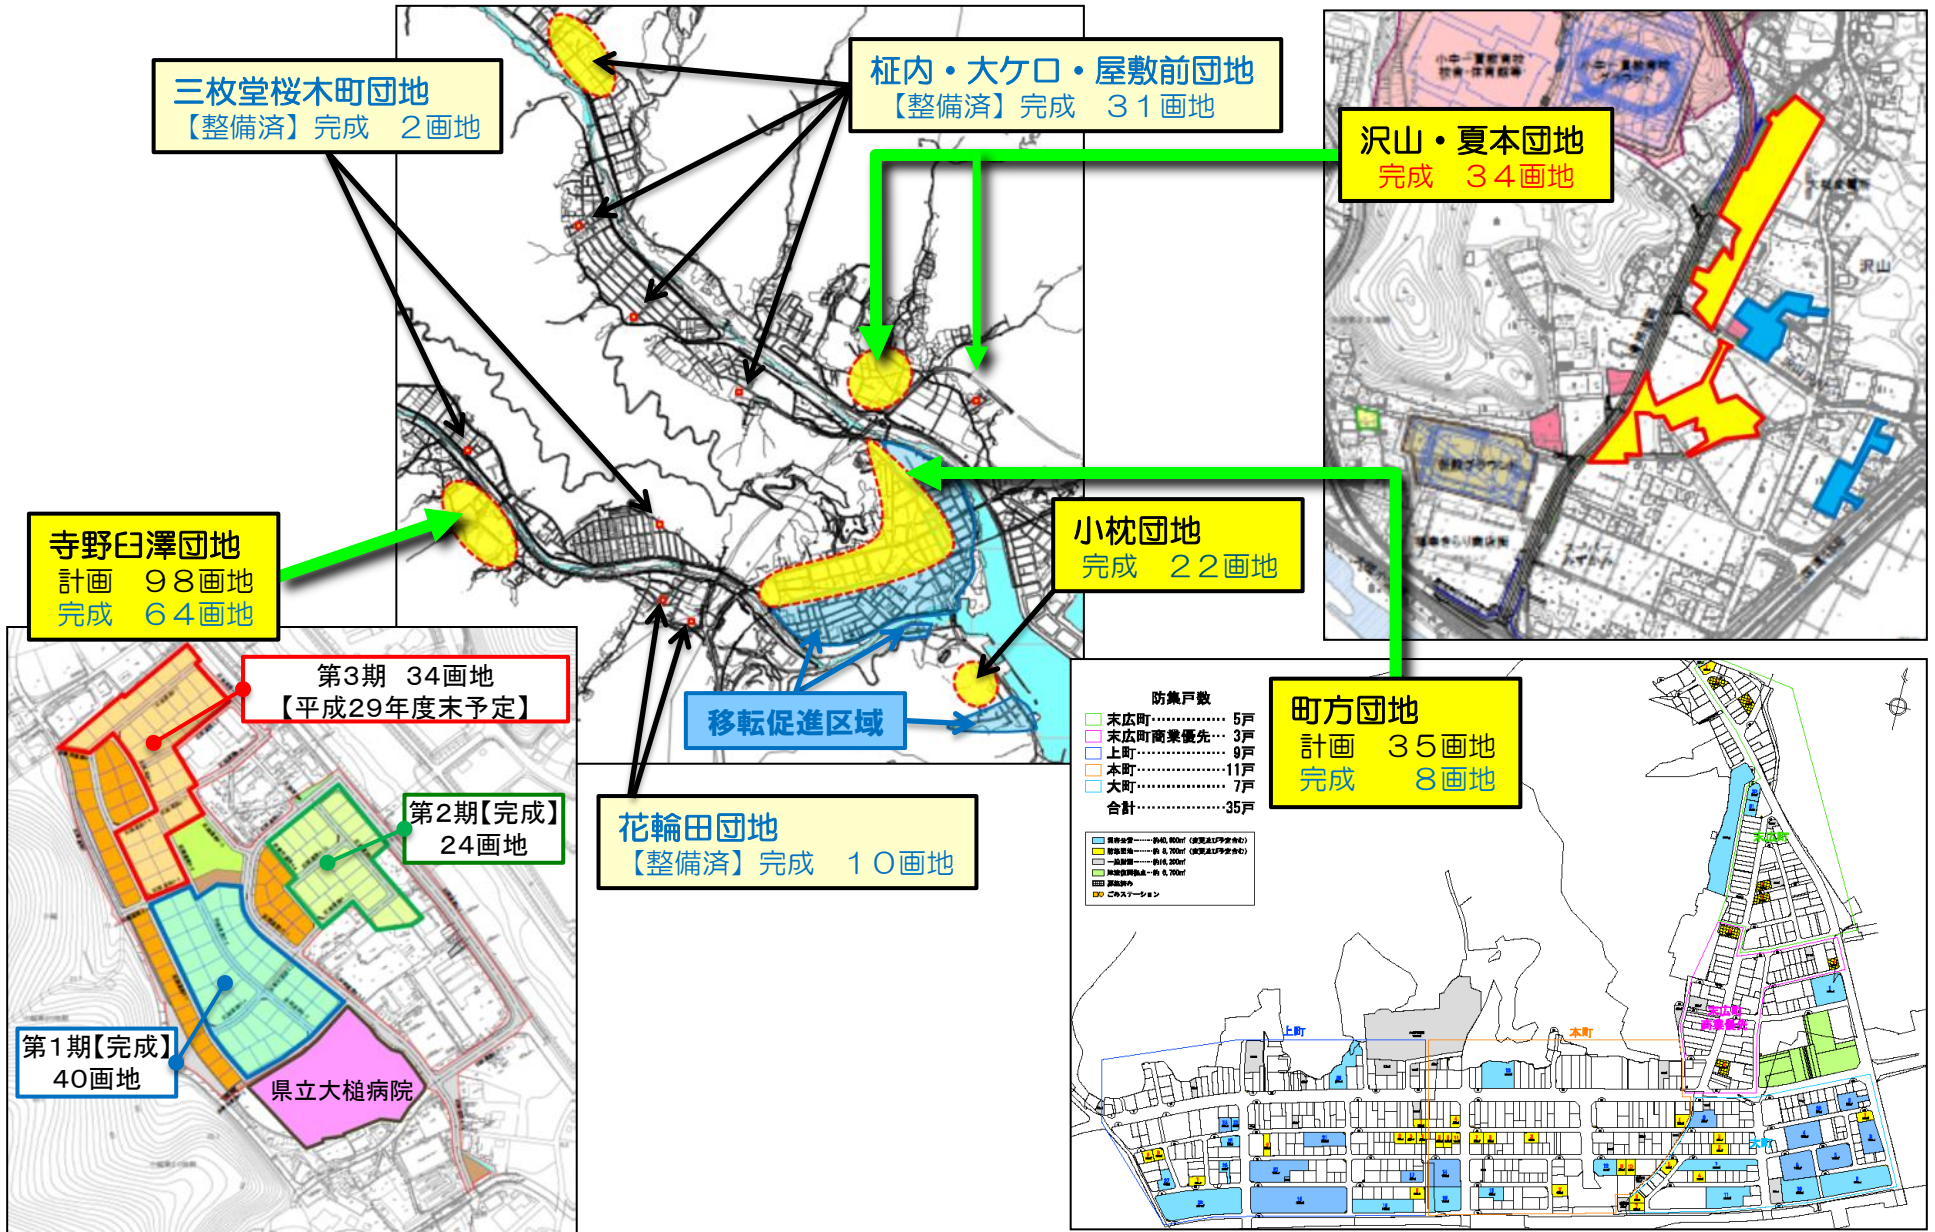


(2) 防災集団移転促進事業

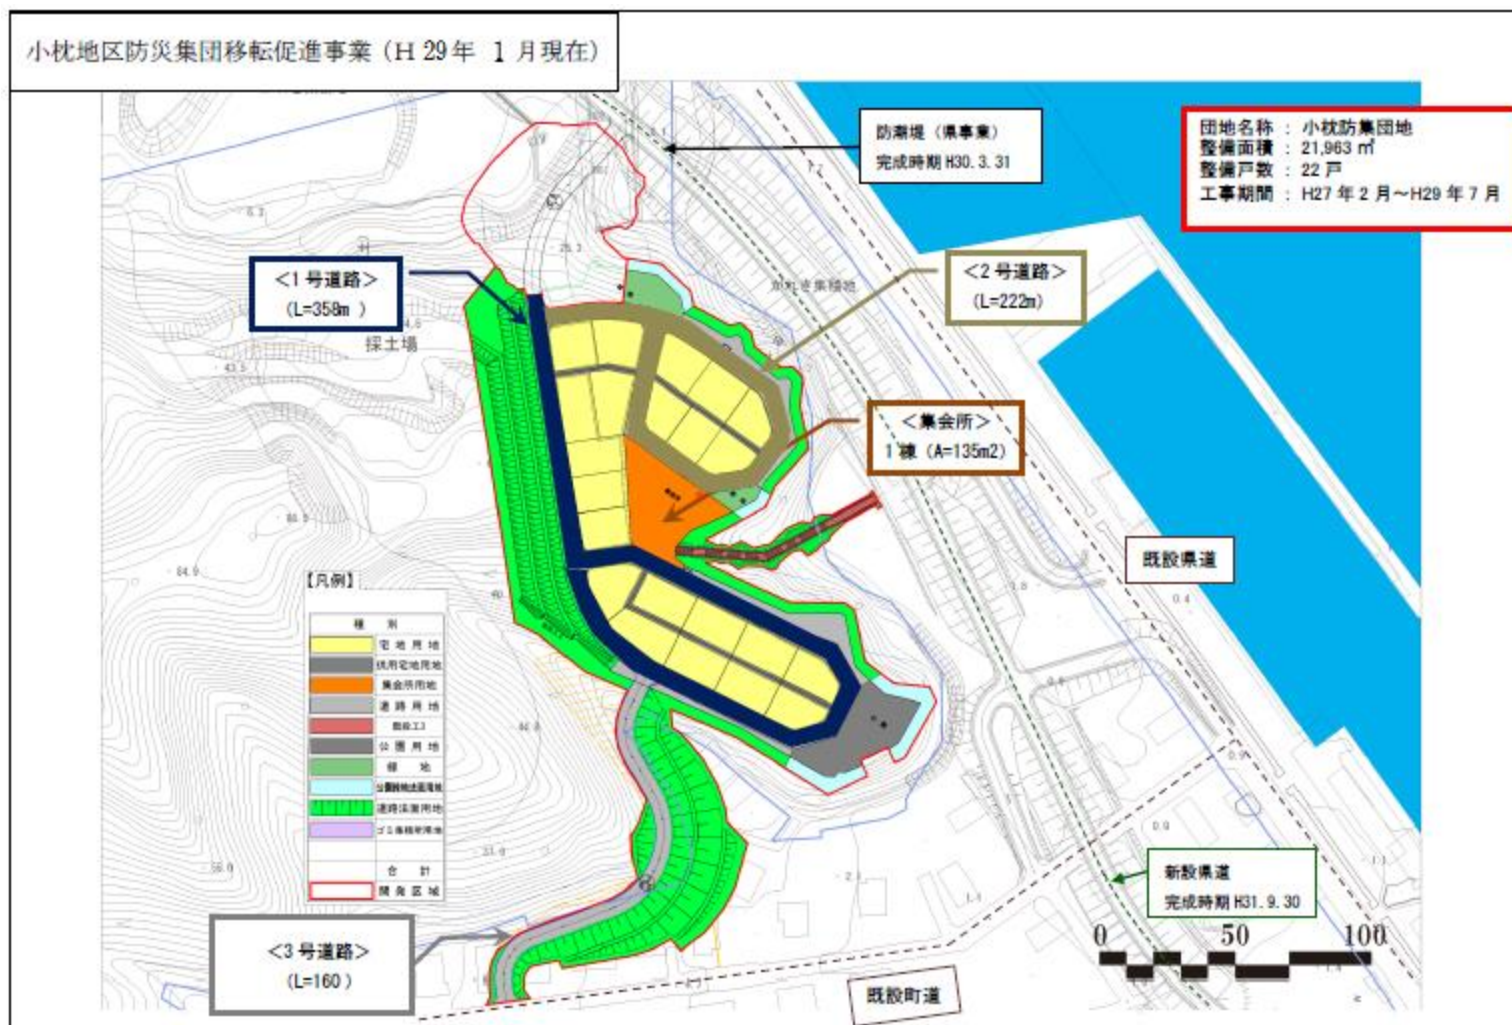

➤小枕団地の引渡時期：平成28年12月22日

(3) 災害公営住宅

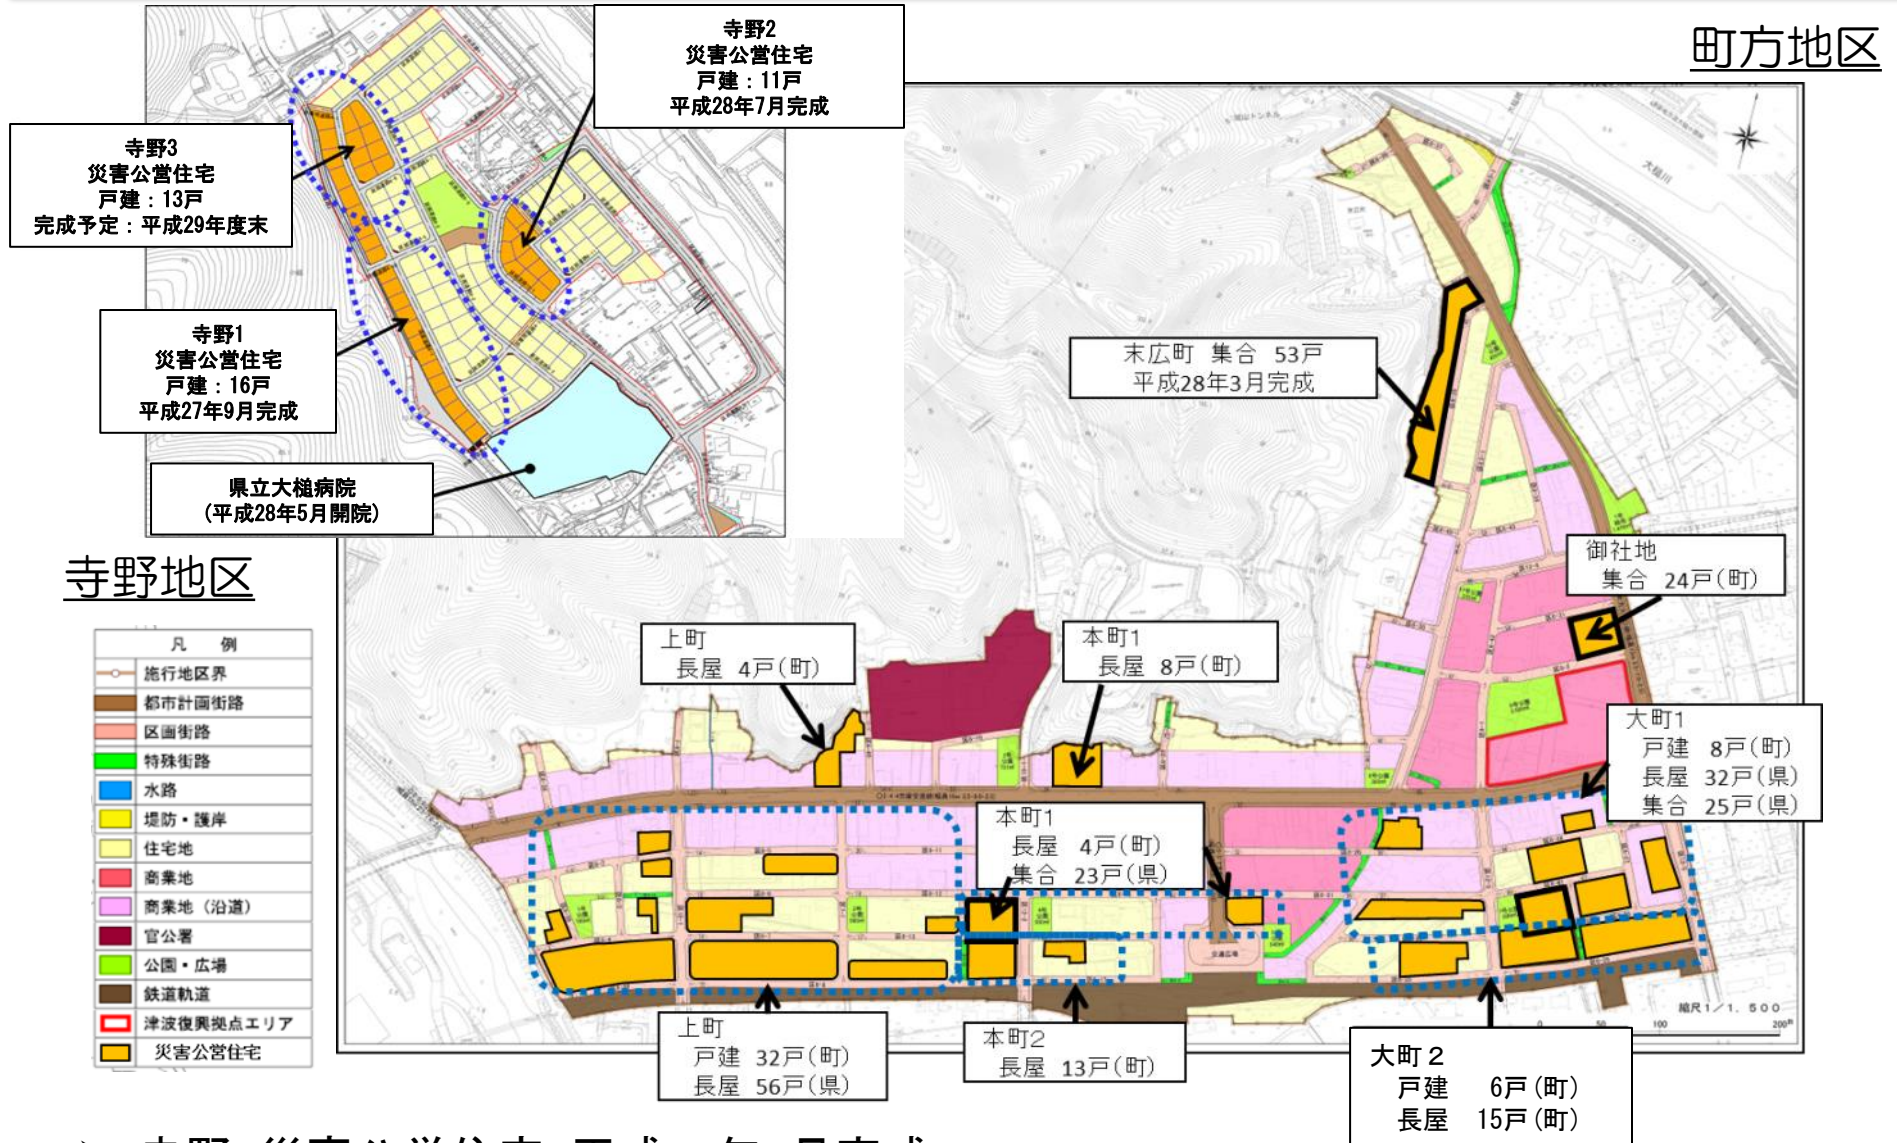

➤ 寺野2災害公営住宅:平成28年7月完成。

(4) 津波復興拠点整備事業




町方地区津波復興拠点整備事業(4.4ha)

- 先行街区においては、平成25年11月に造成工事が完成し、県道大槌小槌線沿いで営業していた店舗などが仮設店舗にて営業中。
- A-E区画においては、平成26年12月に造成工事が概ね完成し、23事業者の入居が決定。平成29年1月現在、11事業者が営業を開始している。

2. 安渡地域 (1) 土地区画整理事業


施工時期

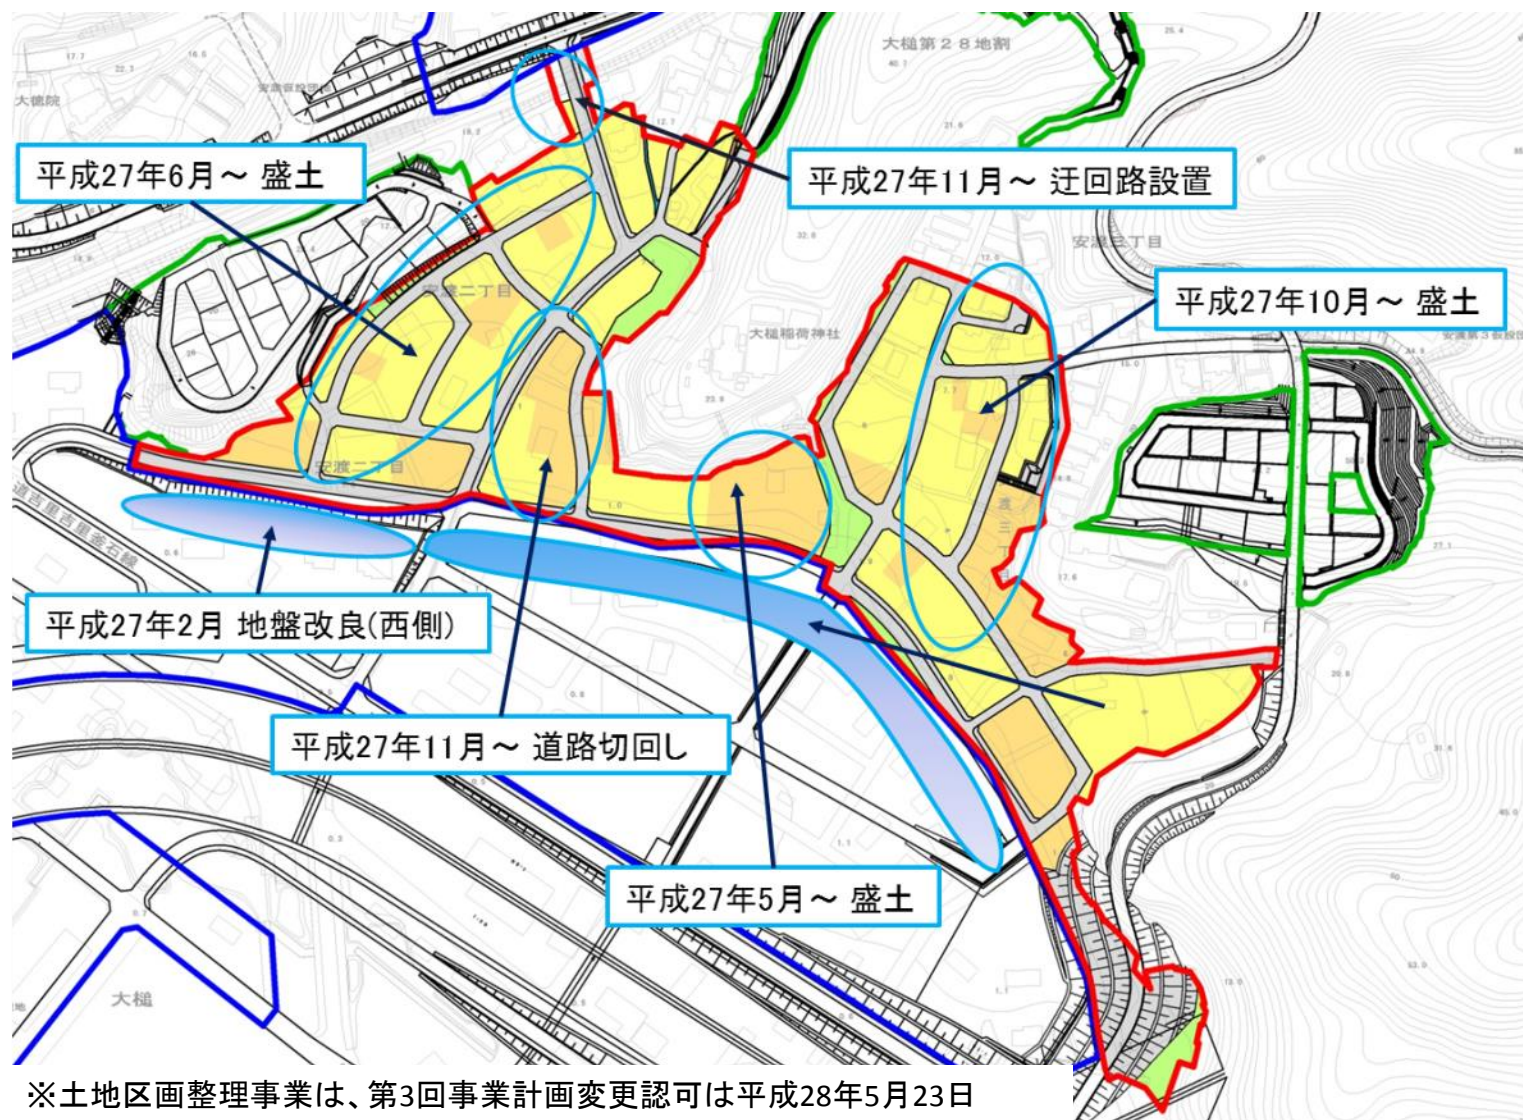

➤ 平成27年11月に迂回路造成工事着手


(2) 防災集団移転促進事業

施工時期

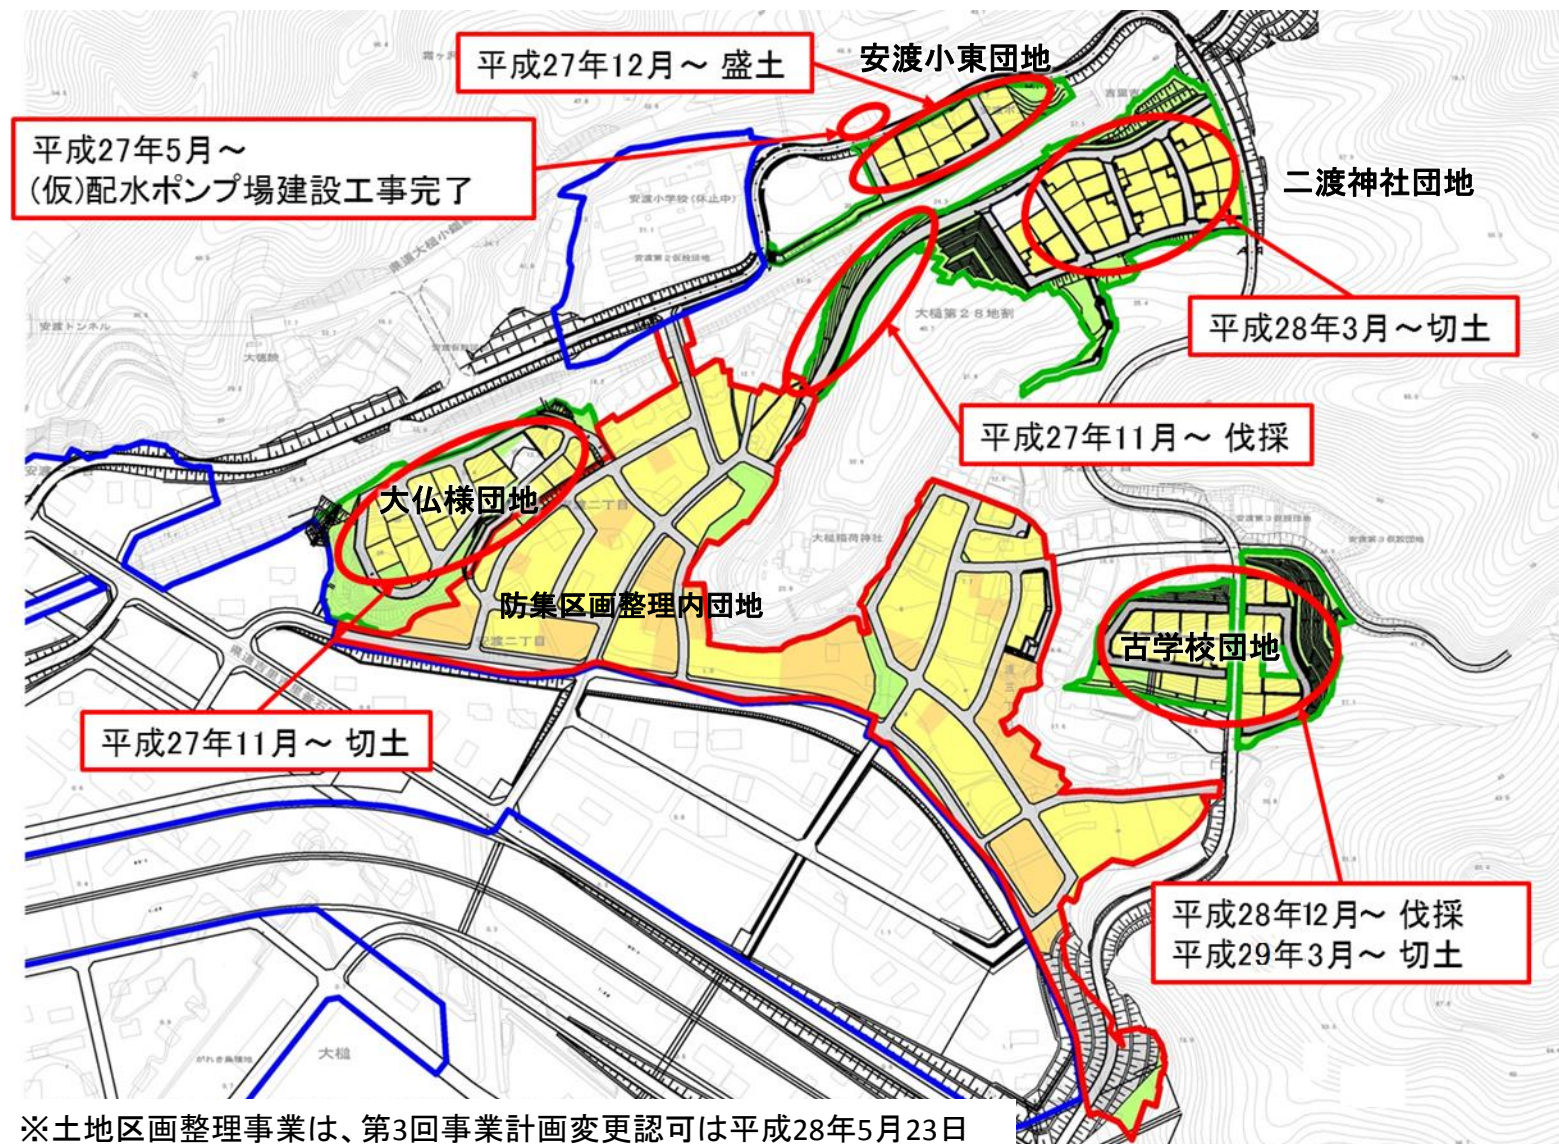


※土地区画整理事業は、第3回事業計画変更認可は平成28年5月23日

(3) 災害公営住宅

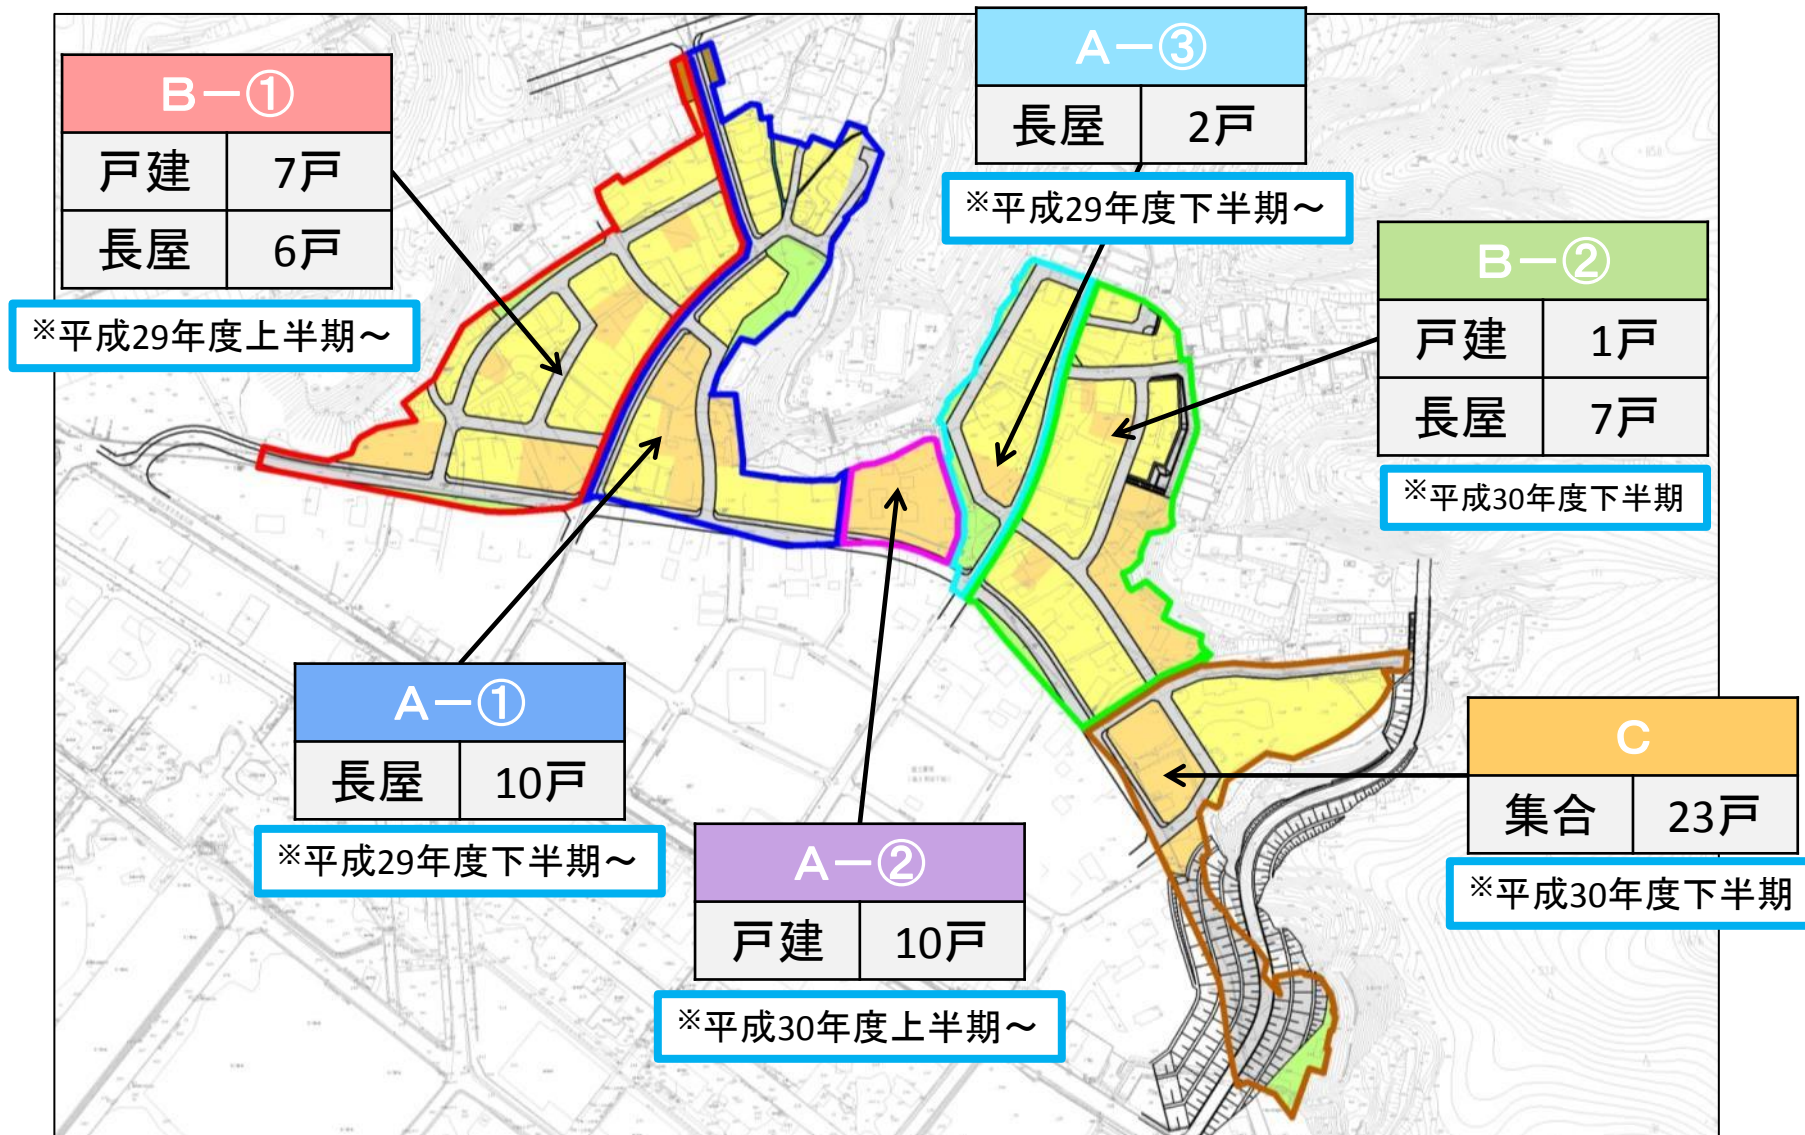

※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

(4) 津波復興拠点整備事業

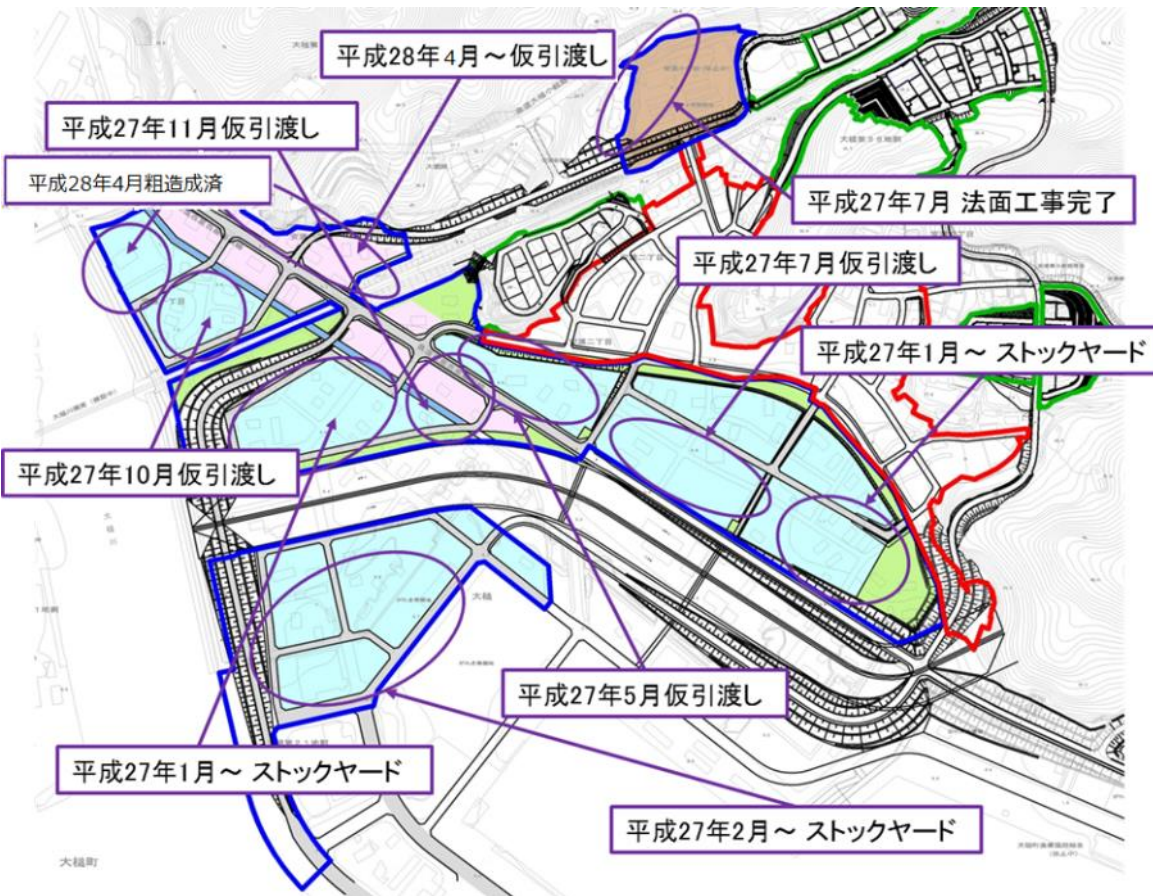


H29.3 安渡産業集積地 工事状況


安渡地区津波復興拠点事業(19.6ha)

3. 赤浜地域 (1) 土地区画整理事業

(2) 防災集団移転促進事業 (3) 漁業集落防災機能強化事業

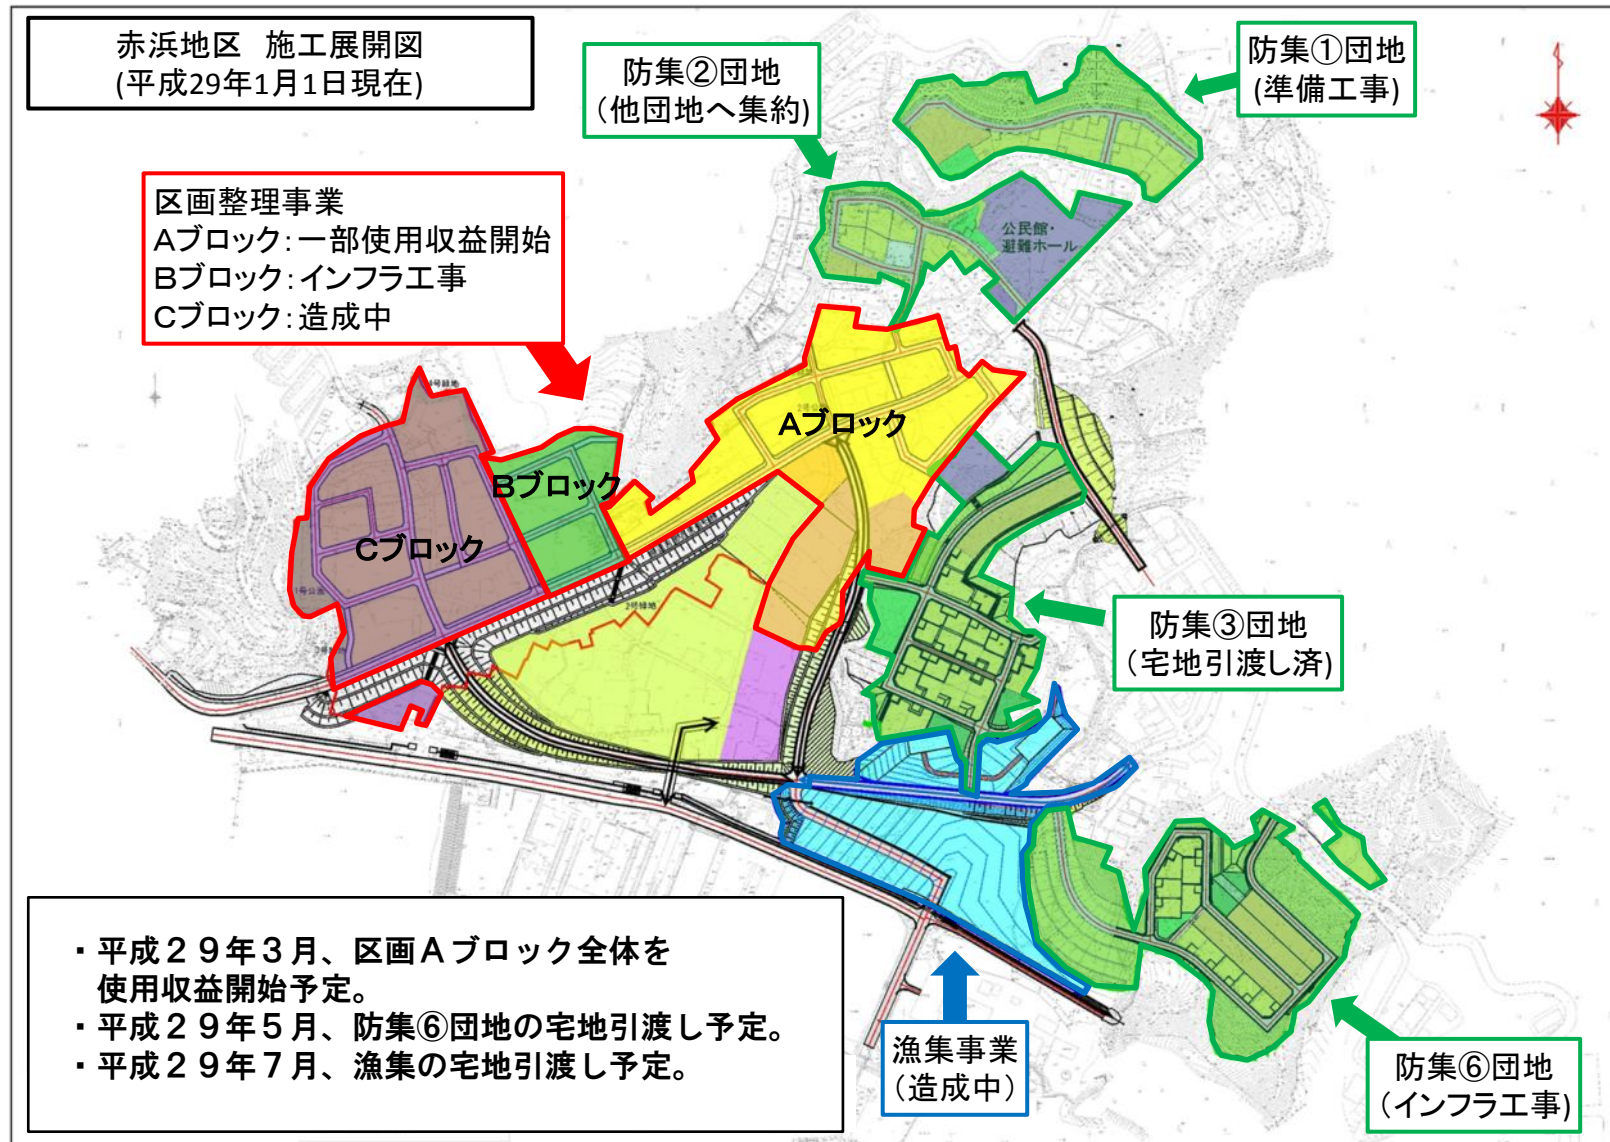


(4) 災害公営住宅

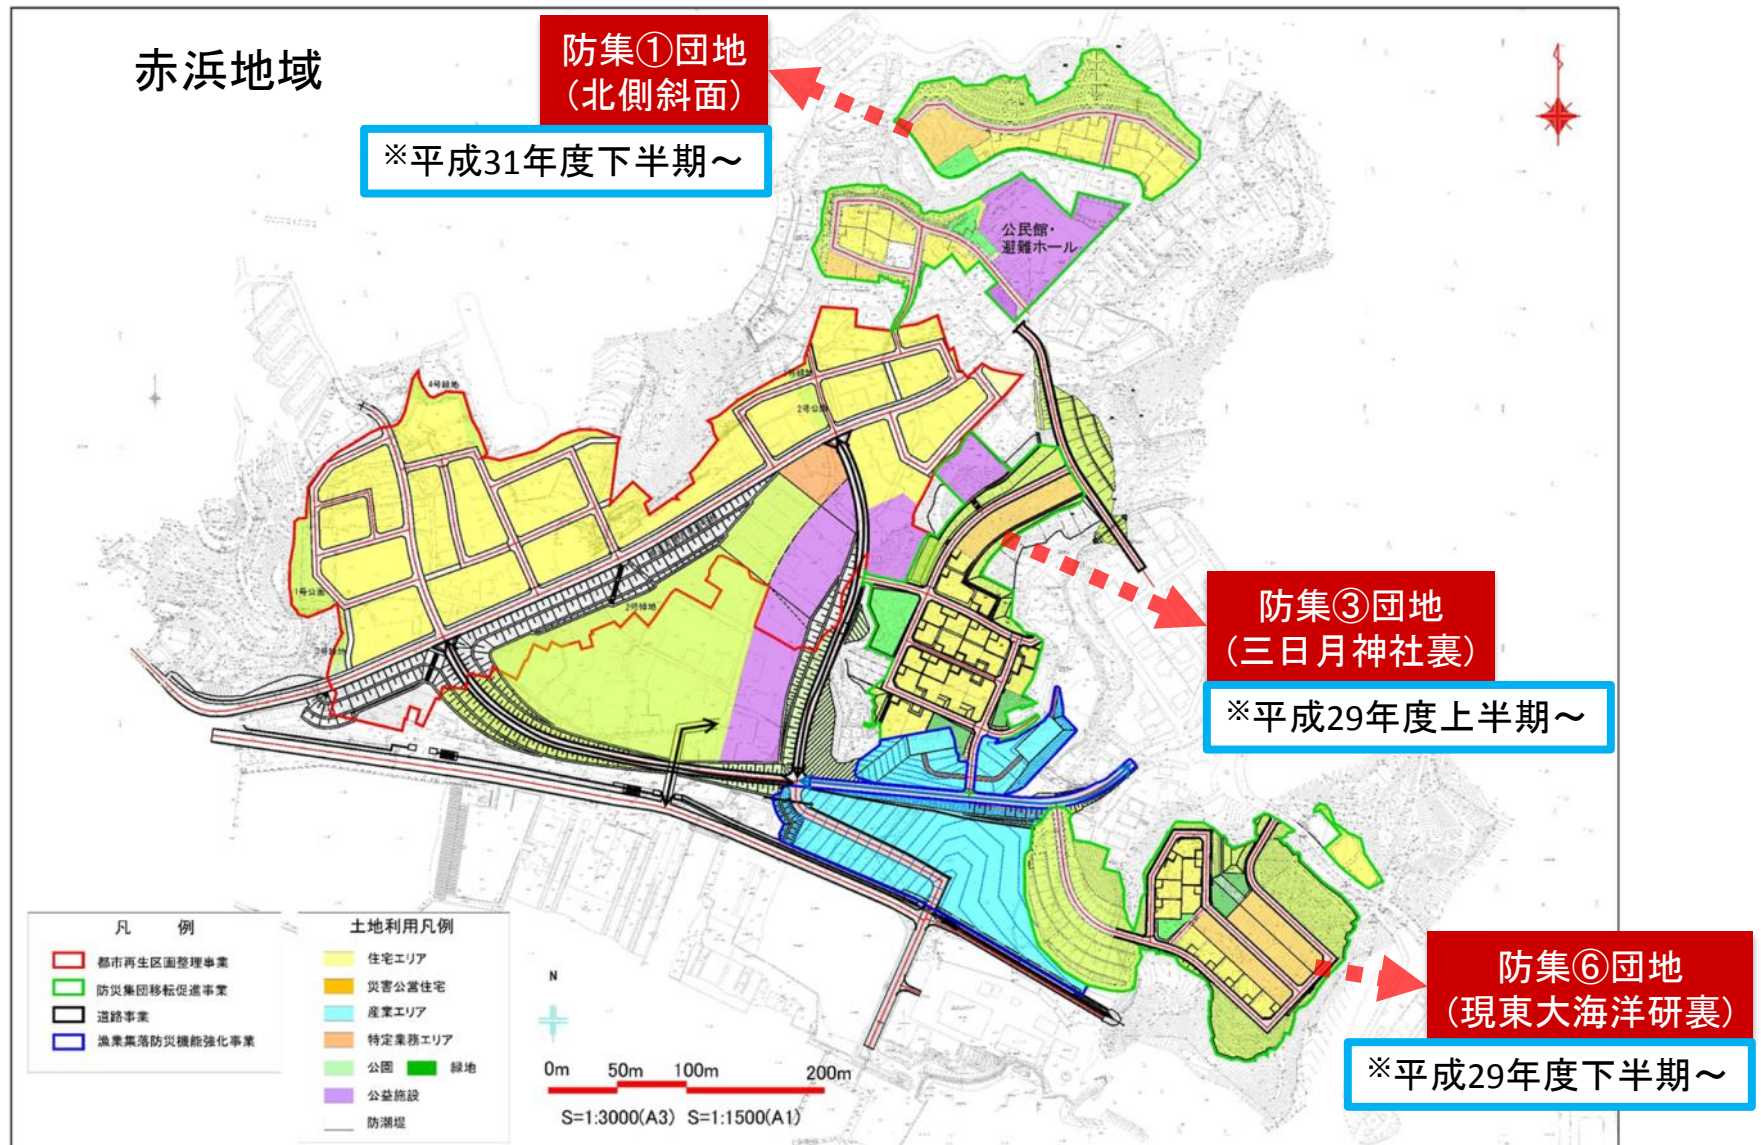


※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

4. 吉里吉里地域 (1) 土地区画整理事業

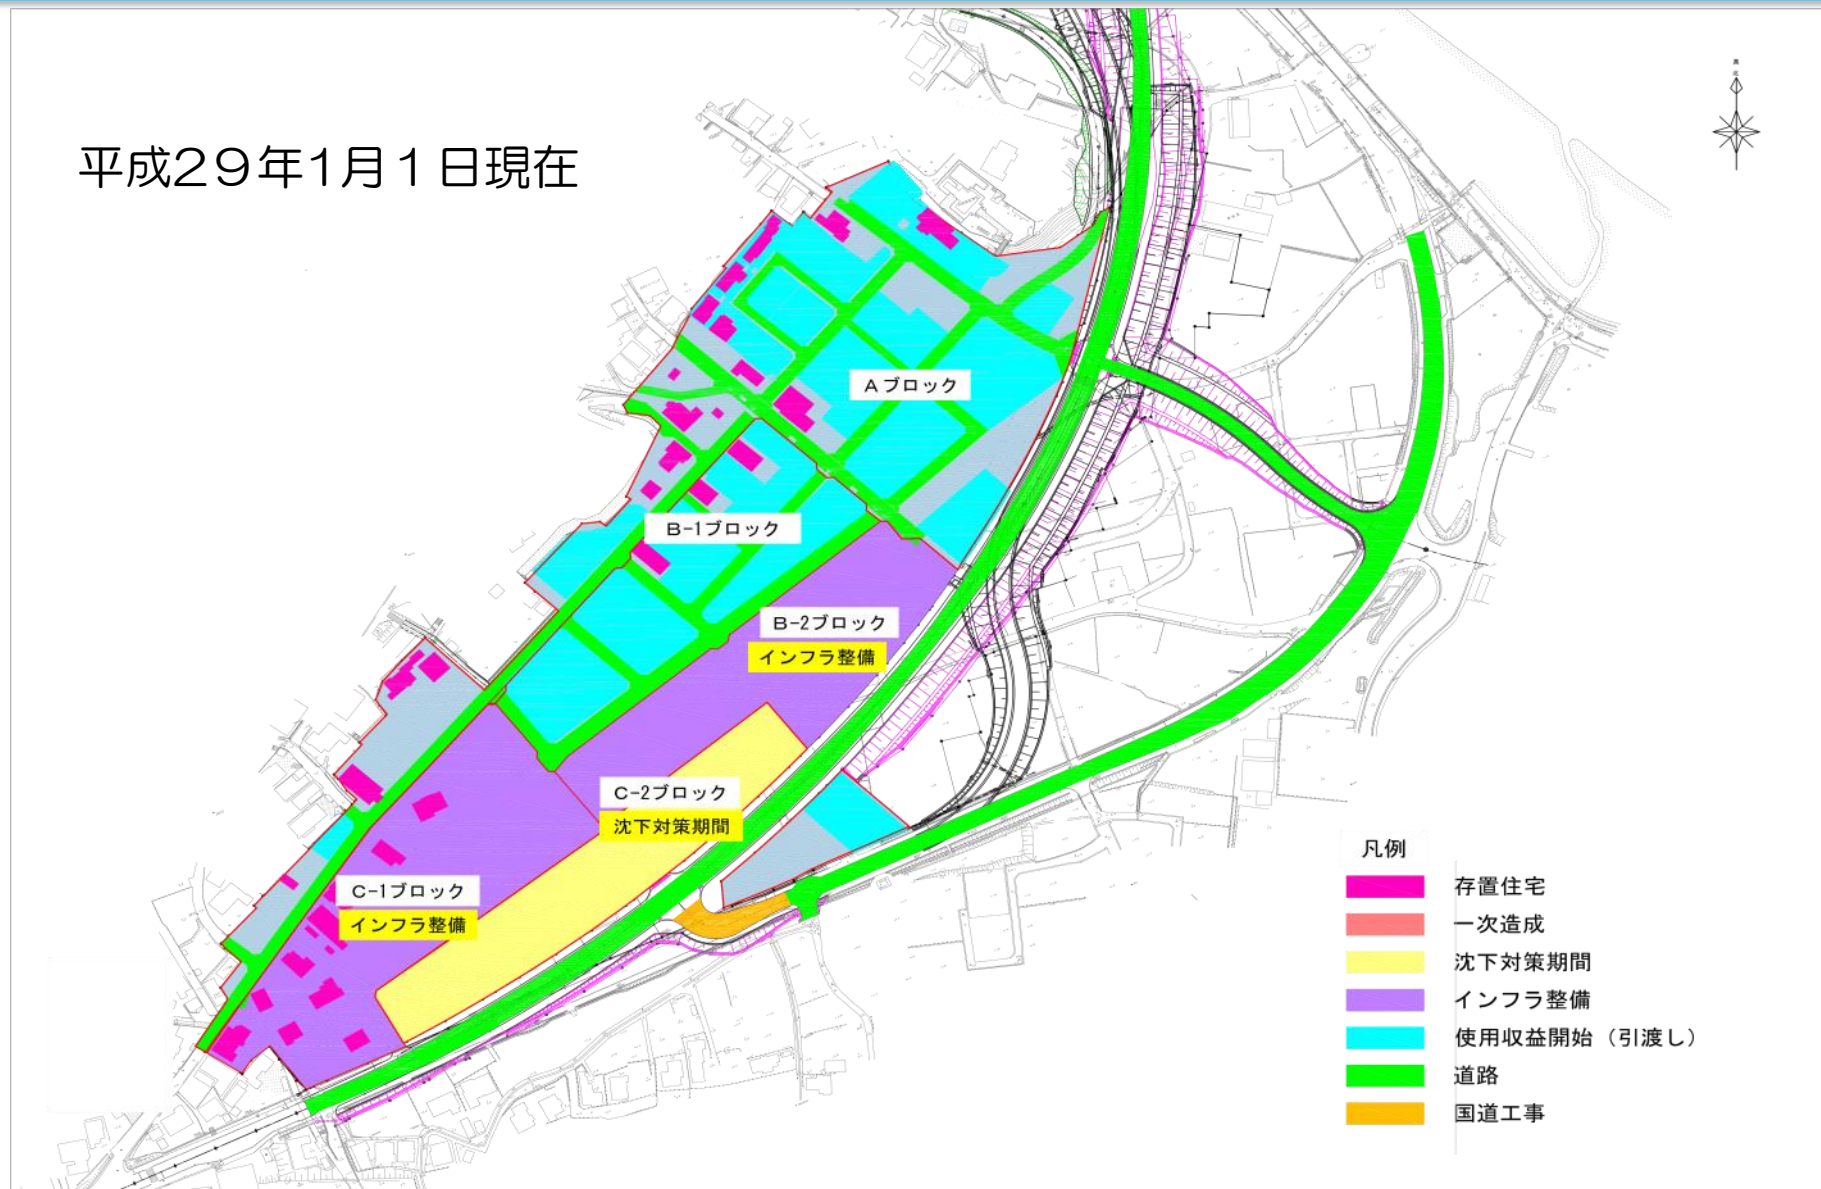


➤ 引き続き整備完了したブロック(仮換地)より使用収益開始(引渡し)予定

(2) 防災集団移転促進事業

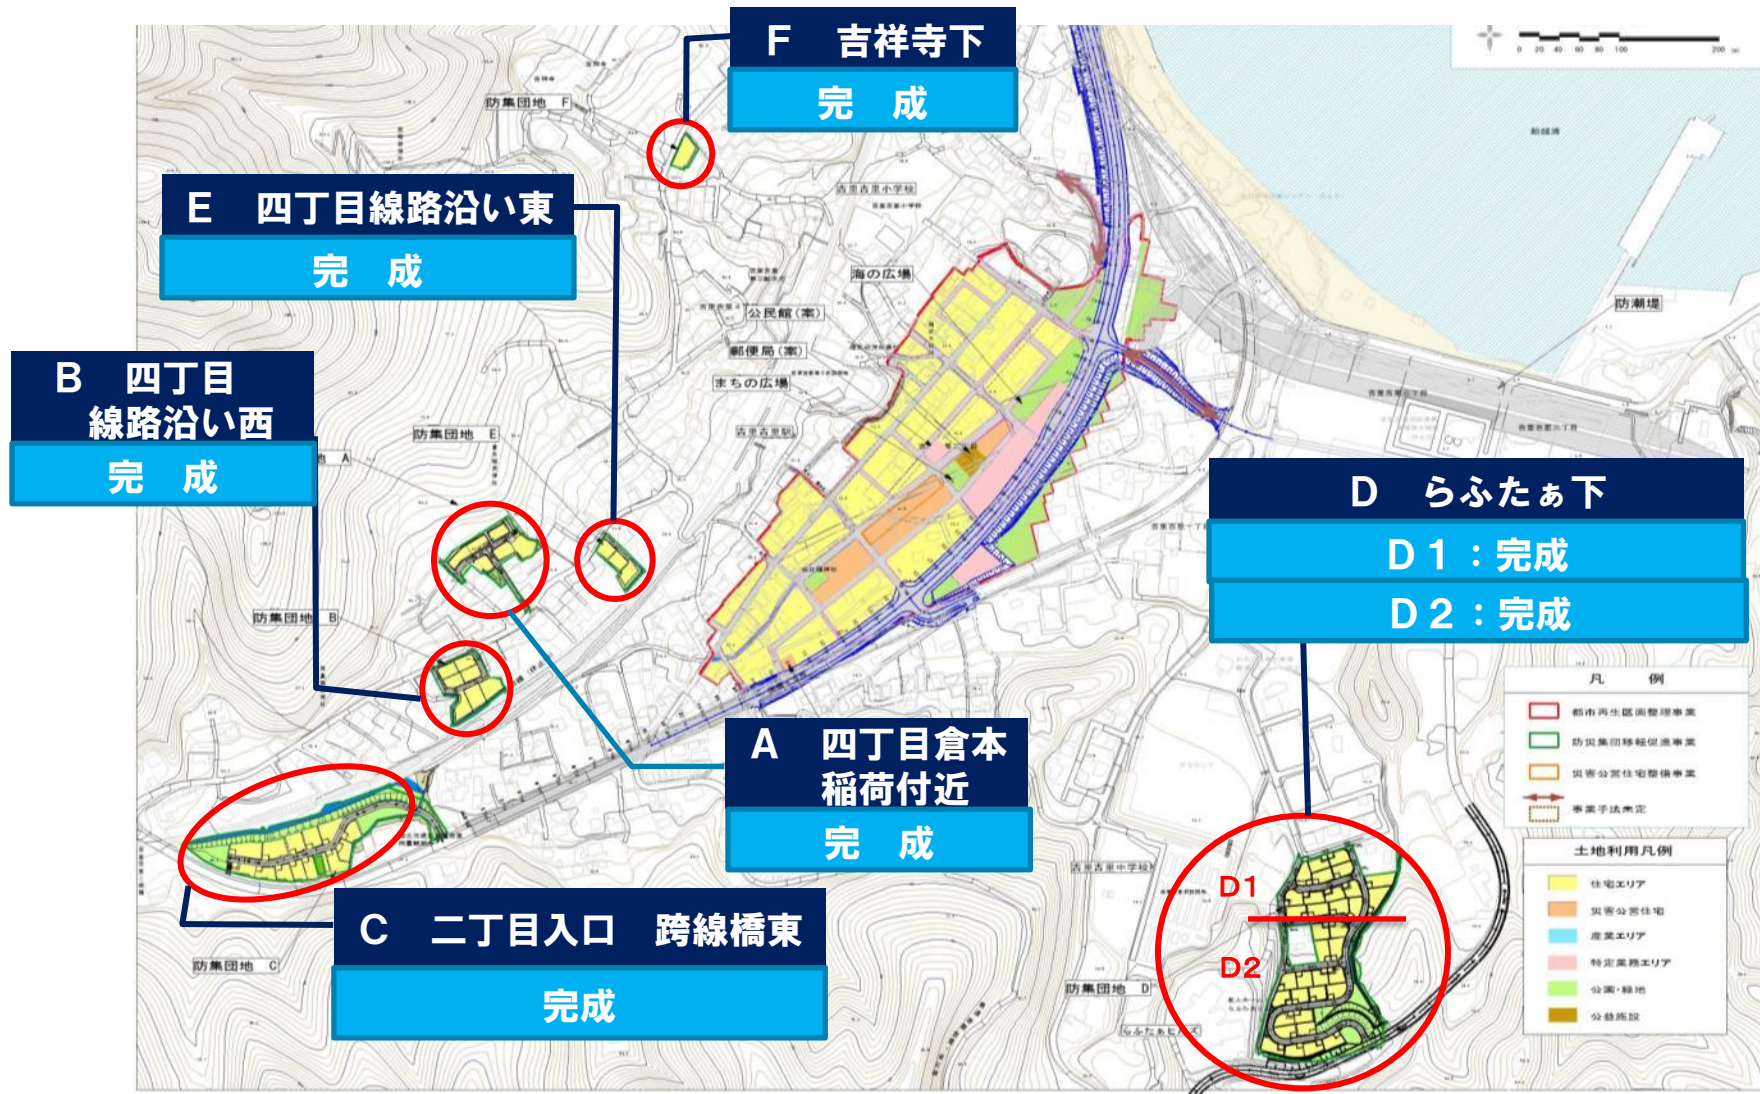


(3) 災害公営住宅

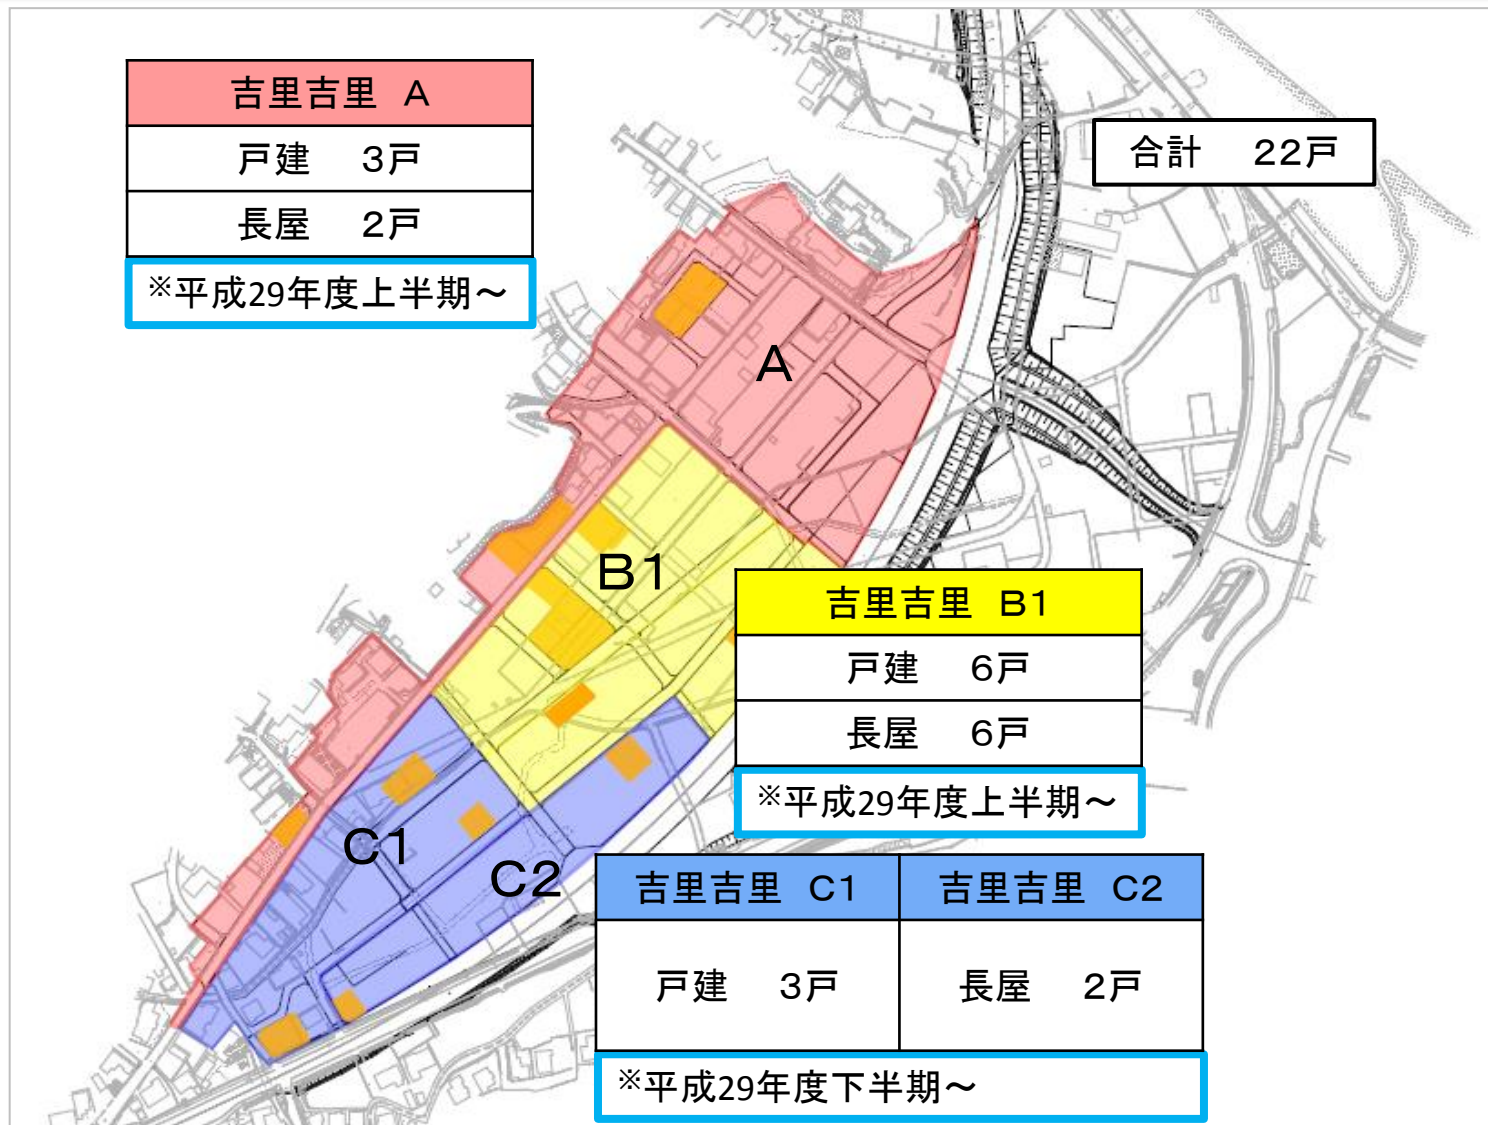


※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

5. 沢山地域 (1) 整備状況

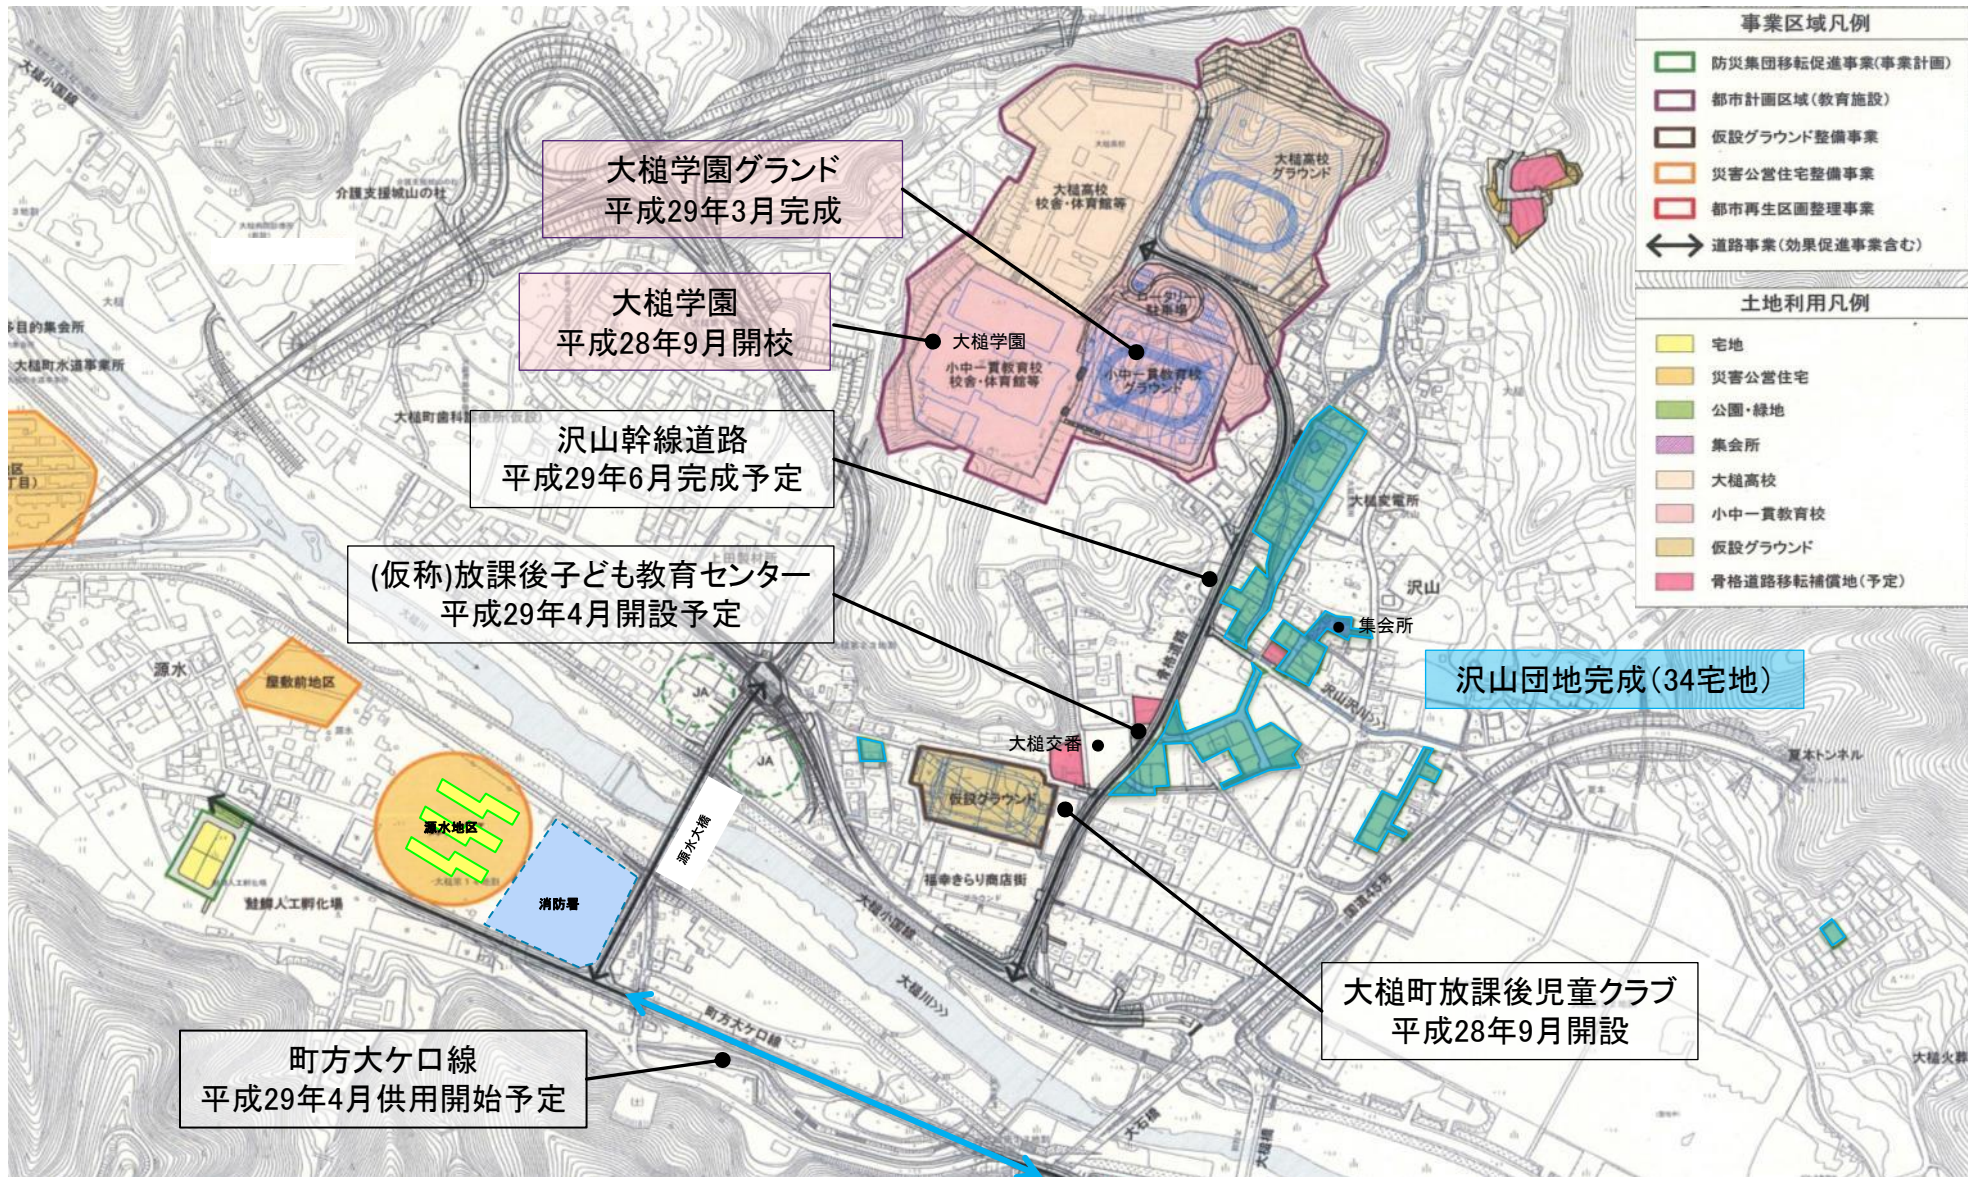

6. 浪板地域 (1)防災集団移転促進事業 (2)漁業集落防災機能強化事業 (3)災害公営住宅

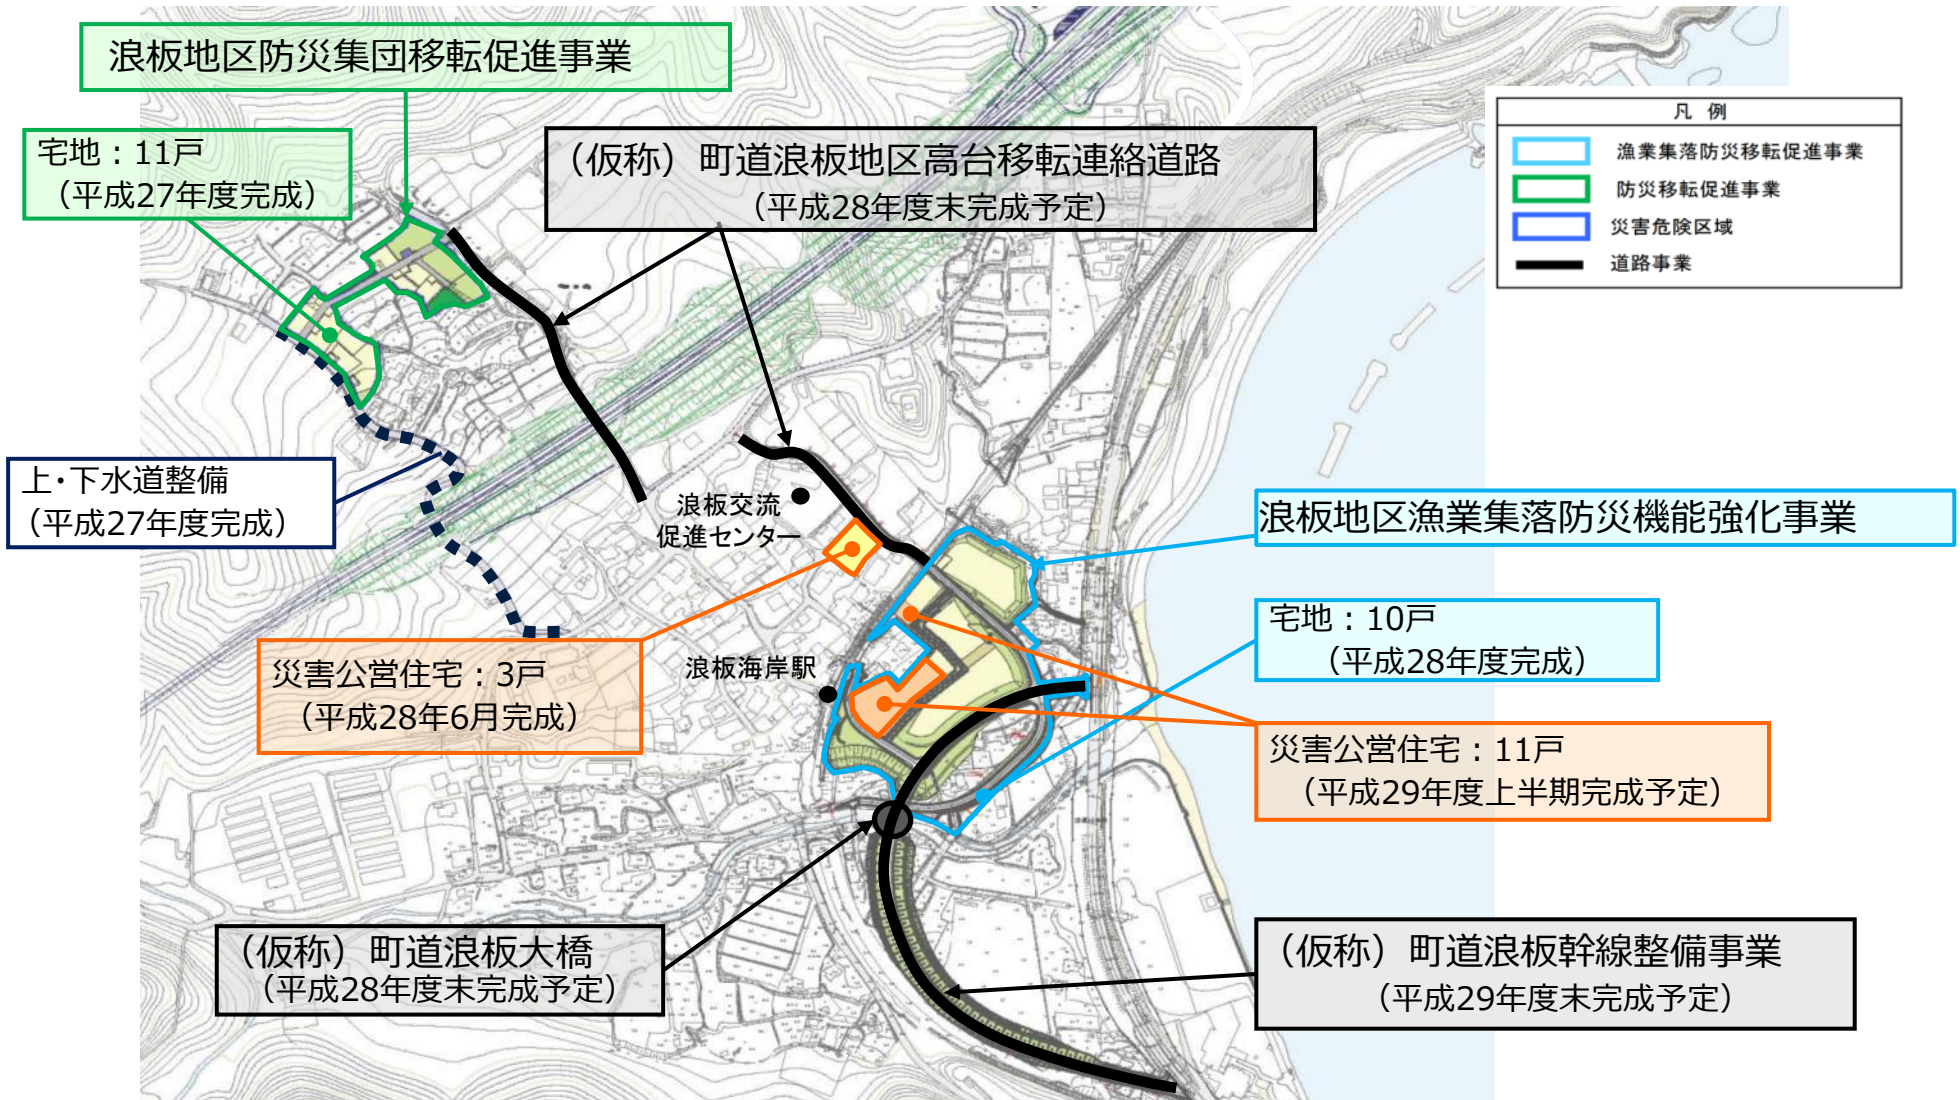

※(仮称)浪板幹線整備事業(H29末完成予定)のうち、漁業集落防災機能強化事業の区域内(生活用道路として機能する部分)については、宅地の引き渡しに併せて供用開始を予定する。

V 各事業の問い合わせ先

| 項目 | | | 部署 | 連絡先 |
|------------------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|
| 大 | 中 | 小 | | |
| I 東日本大震災津波の概要 | | | | |
| 1 | 地震及び津波の概要 | | 総務部危機管理室 | Tel 0193-42-8781 |
| 2 | 被害の状況等 | | 総務部危機管理室 | Tel 0193-42-8781 |
| II 大槌町東日本大震災津波復興計画の概要 | | | | |
| 1 | 復興計画の概要 | | 総合政策部総合政策課 | Tel 0193-42-8724 |
| III 復旧・復興の進捗状況 | | | | |
| 1 町民生活の状況 | | | | |
| | (1) | 人口及び世帯数の推移 | 民生部町民課 | Tel 0193-42-8713 |
| | (2) | 応急仮設住宅の状況 | 民生部コミュニティ総合支援室 | Tel 0193-42-8718 |
| (3) | 町外避難者数等 | | 民生部コミュニティ総合支援室 | Tel 0193-42-8718 |
| | 児童生徒数 | | 教育委員会事務局学務課 | Tel 0193-42-6100 |
| | 生活保護受給者数 | | 民生部保健福祉課 | Tel 0193-42-8715 |
| 2 町の復旧・復興の状況 | | | | |
| (1) | 予算の状況 | | 総務部財政課 | Tel 0193-42-8712 |
| | 復興交付金の推移 | | 復興局復興推進課 | Tel 0193-42-8714 |
| | 復旧事業の進捗状況 | | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | 復興事業の進捗状況 | | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | 復興事業の進捗状況～災害公営住宅～ | | 復興局住宅課 | Tel 0193-42-8719 |
| (5) | 復興事業の進捗状況～職員数の推移～ | | 総務部総務課 | Tel 0193-42-8710 |
| 3 産業の状況 | | | | |
| (1) | 生業の状況 | | 産業振興部商工観光課 | Tel 0193-42-8725 |
| (2) | 水産業の状況 | | 産業振興部農林水産課 | Tel 0193-42-8717 |
| 4 公共施設の再建状況 | | | | |
| (1) | 消防署 | | 総務部消防課（大槌消防署） | Tel 0193-42-3121 |
| (2) | 県立大槌病院 | | 民生部保健福祉課 | Tel 0193-42-8715 |
| (3) | 小中一貫校 | | 教育委員会事務局学務課 | Tel 0193-42-6100 |
| (4) | 納骨堂 | | 総合政策部総合政策課 | Tel 0193-42-8724 |
| (5) | 御社地エリア復興拠点施設 | | 総合政策部公民連携室 | Tel 0193-27-8168 |
| (6) | 公民館 | | 教育委員会事務局生涯学習課 | Tel 0193-42-2300 |

| 項目 | | | 部署 | 連絡先 |
|-----------------------|-----|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | |
| 5 生活再建と支援 | | | | |
| | (1) | 地域復興協議会とコミュニティ協議会 | 総合政策部総合政策課 民生部コミュニティ総合支援室 | Tel 0193-42-8724 Tel 0193-42-8718 |
| | (2) | 自治会の設立状況と活動例 | 民生部コミュニティ総合支援室 | Tel 0193-42-8718 |
| | (3) | ボランティア活動状況 | 民生部保健福祉課 | Tel 0193-42-8715 |
| 6 スケジュール | | | | |
| | (1) | 面整備 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (2) | 災害公営住宅 | 復興局住宅課 | Tel 0193-42-8719 |
| IV 各地区の土地利用の状況 | | | | |
| 1 町方地域、小枕・仲松地域 | | | | |
| | (1) | 土地区画整理事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (2) | 防災集団移転促進事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (3) | 災害公営住宅 | 復興局住宅課 | Tel 0193-42-8719 |
| | (4) | 津波復興拠点整備事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| 2 安渡地域 | | | | |
| | (1) | 土地区画整理事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (2) | 防災集団移転促進事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (3) | 災害公営住宅 | 復興局住宅課 | Tel 0193-42-8719 |
| | (4) | 津波復興拠点整備事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| 3 赤浜地域 | | | | |
| | (1) | 土地区画整理事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (2) | 防災集団移転促進事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (3) | 漁業集落防災機能強化事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (4) | 災害公営住宅 | 復興局住宅課 | Tel 0193-42-8719 |
| 4 吉里吉里地域 | | | | |
| | (1) | 土地区画整理事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (2) | 防災集団移転促進事業 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| | (3) | 災害公営住宅 | 復興局住宅課 | Tel 0193-42-8719 |
| 5 沢山地域 | | | | |
| | (1) | 整備状況 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| 6 浪板地域 | | | | |
| | (1) | 整備状況 | 復興局都市整備課 | Tel 0193-42-8723 |
| V 各事業の問い合わせ先 | | | | |
| | | | 総合政策部総合政策課 | Tel 0193-42-8724 |
